ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-21.12.88

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 50 человек (в крупно-панельных бескаркасных конструкциях)

Альбом I

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

23360-01
ЦЕНА 1-33

gost.e-ecolog.ru

ОТРАСЛЕВОЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-6-21.12.88

Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д.станций с бытовыми помещениями на 50 человек (в крупно-панельных бескаркасных конструкциях)

Альбом I

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Разработан
проектным институтом
"Гипропромтрансстрой"

Главный инженер
института — С.А.Воронков

Главный инженер
проекта — Л.Н.Назарова

Утвержден
и
Введен в действие МПС СССР
Указание
от 07.07.88г. № А-2356у

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

I. Общая часть	3
2. Строительные решения	3...19
3. Водоснабжение и водоотведение	19...21
4. Отопление и вентиляция	21...22
5. Электротехническая часть	23...25
6. Автоматизация сантехсистем	25
7. Слаботочные устройства	26...28
8. Светомаскировка	29
9. Указания по привязке типовых проектов защитных сооружений ГО	30
IO. Таблица базовых показателей и достигнутых в проекте	31
II. Технико-экономические показатели	32...33

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект административно-бытового здания для грузовых районов железнодорожных станций с бытовыми помещениями на 50 человек в крупнопанельных бескаркасных конструкциях разработан по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1987...1988г. (т.3.II.7) на стадии "рабочий проект" в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным МПС 2 марта 1987г.

Здание предназначено для организации обслуживания работников грузовых дворов в соответствии с требованиями СНиП II-92-76.

Проект разработан для строительства в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 30°С, скоростным напором ветра и весом снегового покрова - для III географического района.

Административно-бытовое здание оборудуется: - центральным отоплением, горячим водоснабжением, вентиляцией, водопроводом, канализацией, электроснабжением, телефоном, радио и пожарной сигнализацией.

Класс здания II, степень огнестойкости II.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и правил проектирования вспомогательных зданий СНиП II-92-76, противопожарных норм проектирования зданий и сооружений СНиП 2.01.02-85.

При разработке проекта приняты следующие условия строительства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С;
- скоростной напор ветра 45 кГс/м^2;
- вес снегового покрова 100 кГс/м^2;
- рельеф территории спокойный, вне горных выработок, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные с нормативными характеристиками согласно п.2.3 СН 227-82.

Проект благоустройства и озеленения территории участка, устройство дорог и проездов, пешеходных тротуаров выполняется при привязке проекта с учетом конкретных условий строительства в соответствии с требованиями главы СНиП П-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".

2.I. Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения административно-бытового здания разработаны, исходя из создания необходимых условий при обслуживании работников грузовых дворов численностью 50 человек.

Здание принято двухэтажным с высотой этажа 3,3 м и размерами в плане I5х24м (в осях).

Компановочные решения помещений выполнены, исходя из характера выполняемой работы

АБК-50

№ п/п	Наименование	Гр. произ. процесса	Количество работающих (чел.)				
			В наиболее многочисленную смену		Списочное		Всего
			муж.	жен.	муж.	жен.	
I	Рабочие	Пд	2I	3	33	I0	43
2	МОП	Iв	I	I	I	I	2
3		ША	I	-	I	-	I
4	ИТР	-	4	6	4	I0	I4
	ВСЕГО по зданию		27	I0	39	2I	60

На первом этаже расположены: кабинет начальника грузового района, медицинская комната, буфет, электрощитовая, венткамера, сушильная, комната обеспыливания, мужская гардеробная спецодежды с душевой, мужской и женский туалет, кладовые хозинвентаря и сезонной спецодежды.

На втором этаже: операционный зал товарной конторы с помещением для клиентуры, комната АСУ железной дорогой, комната информбюро и помещение коммерческих агентов, кабинет по технике безопасности, комната бюро по розыску грузов, кабинет заведующего сортировочной платформой, комната общественных организаций, красный уголок, вентиляторная, комната персонала производственного участка, бухгалтерия и касса, женские гардеробные с душевыми, туалетные комнаты.

В здании предусмотрены два основных входа с вестибюлями: один - со стороны главного фасада, выходящего за пределы территории грузового двора для административных работников, персонала товарной конторы, экспедиторов и шоферов, прибывающих с автотранспортом за получением груза и второй - со стороны грузового двора для рабочих, занятых на погрузочно-выгрузочных работах, а также служебный вход в подсобное помещение буфета.

Состав помещений административно-бытового здания должен уточняться при привязке проекта в зависимости от характера грузовых операций и наличия специализированных погрузочно-разгрузочных площадок или складов.

При наличии на территории грузового района мест хранения и обработки массовых навалочных пылящих, химических и других опасных грузов должны предусматриваться санитарно-защитные зоны со стороны жилой застройки, а также санитарные разрывы до ближайших производственных или административно-бытовых зданий согласно требованиям СН 245-71. При этом, в административно-бытовом здании следует предусматривать помещение респираторной для хранения, приема, выдачи, проверки и перезарядки респираторов, площадью не менее 9 м2.

Административно-бытовое здание должно располагаться у въезда на территорию грузового двора, имеющего ограждение.

При привязке проекта к конкретным условиям грузового района следует руководствоваться типовыми схемами грузовых дворов с взаимным расположением погрузочно-выгрузочных сооружений и устройств, путевого развития, вспомогательных зданий и помещений (административно-бытовых, служебно-технических, зарядных, ремонтных мастерских и пр.), приведенных в "Инструкции по проектированию станций и узлов на железных дорогах СССР" (ВСН-56-78).

2.2. Конструктивные решения

В проекте приняты конструкции, обеспечивающие II степень огнестойкости здания.

Административно-бытовое здание решено в крупнопанельных бескаркасных конструкциях с высотой этажа 3,3 м по серии I.090.I-I "Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,0 и 3,3 м".

Здание решено с поперечными несущими стенами. Пространственная устойчивость здания обеспечивается продольными ненесущими стенами, объединенными дисками перекрытий.

Проект разработан для производства работ при плюсовых температурах наружного воздуха. При производстве с отрицательными температурами наружного воздуха следует руководствоваться действующими нормами и правилами на производство работ в зимнее время.

2.3. Описание конструкций

При разработке фундаментов грунтовые условия приняты в соответствии с указаниями в инструкции СН 227-82 п.2.3.

Фундаменты - из сборных блоков стен подвалов по ГОСТ I3579-78 и плит ленточных фундаментов по ГОСТ I3580-85.

Горизонтальная гидроизоляция стен выполняется в уровне верхнего обреза фундаментов из цементно-песчаного раствора состава I:2.

Глубину заложения и ширину подошвы фундаментов подлежит откорректировать при привязке проекта к конкретным условиям строительства, руководствуясь требованиями СНиП Ш-I6-80.

Наружные стены здания приняты из сборных керамзитобетонных однослойных панелей толщиной 350мм по серии I.090.I-I вып.2-6.

Панели наружных стен представляют собой плоскую однослойную конструкцию из легких бетонов на пористых заполнителях (керамзитобетон плотностью I000 кг/м3) марки по прочности на сжатие М75 с наружным и внутренним слоем из цементного раствора.

Толщины стен и утеплителя на кровле выбраны с учетом СНиП 3-79 и дополнения к нему от I9.I2.85 № 24I.

Торцевые стены приняты несущими, а продольные - самонесущими.

Вертикальные стыки панелей наружных стен осуществляются путем соединения арматурных выпусков панелей и омоноличивания стыка по всей ее высоте. Соединение наружных стеновых панелей с плитами перекрытий предусматривается сваркой их закладных изделий.

Внутренние стены - приняты из сборных железобетонных несущих панелей толщиной I60 мм, высотой 3040мм по серии I.090.I-I вып.4-4.

Вертикальные стыки панелей внутренних стен осуществляются с помощью сварки закладных изделий и замоноличиванием шва по всей его высоте.

Для связи наружных и внутренних стен, так же предусмотрены соединения их выпусков и закладных изделий и омоноличиванием шва по всей высоте.

Для образования надежной связи внутренних стен с плитами перекрытия предусматриваются сварные соединения их закладных изделий.

Устанавливаются панели на цементном растворе М100 толщиной 25 мм.

Лицевые поверхности внутренних стеновых панелей подготовлены под окраску.

Плиты перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по серии I.090.I-I вып.5-I многопустотные и ребристые - для пропуска инженерных коммуникаций.

Плиты перекрытия (покрытия) образуют горизонтальные диски соединением плит перекрытия (покрытия) с внутренними и наружными стенами и между собой с помощью сварки закладных изделий, а также путем тщательного замоноличивания шпонок и швов имежду всеми элементами перекрытия (покрытия).

Плиты укладываются на цементном растворе М100 толщиной I5 мм.

Лестницы - приняты из сборных железобетонных лестничных маршей, объединенные с полуплощадками по серии I.050.I-2.

Совместная работа элементов лестниц и стен обеспечивается опиранием лестничных маршей на стены по слою цементного раствора и соединением их закладных изделий с помощью сварки.

Крыша - совмещенная невентилируемая с уклоном I:I00, который создается из керамзитового гравия по покрытию, с внутренним водостоком.

Кровля - из 4-х слоев рубероида на мастике с защитным слоем из мелкозернистого гравия, втопленного в мастику.

Утеплитель - плитный пенобетон плотностью 400кг/м3.

Перегородки - в душевых запроектированы кирпичные толщиной I20мм; сушильной, туалетных, венткамерах - из бетонных камней толщиной 90 мм, все остальные перегородки - гипсобетонные толщиной 80 мм.

Полы - приняты в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; конструкции полов приняты в соответствии со СНиП II-В.8-71, в зависимости от их назначения. Типы полов приведены в таблице на рабочих чертежах.

Столярные изделия - двери деревянные входные по серии I.I36.5-I9, внутренние - по серии I.I36-I0 и I.236-5 вып.I.

Оконные блоки приняты по серии I.236-6 вып.I с двойным, а в гардеробных с тройным остеклением в деревянных спаренных переплетах.

2.4. Внутренняя отделка

Цветовое решение отделки внутри помещений производится при привязке проекта с учетом климатических условий района строительства, ориентации здания и назначения помещений.

При выборе материалов для отделки стен и пола следует руководствоваться "Перечнем полимерных материалов и конструкций разрешенных к применению в строительстве" (приказ Минздрава СССР № 3859-85 от I7.04.85г.) облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций коридоров, вестибюлей, холлов не допускается.

2.5. Наружная отделка

Панели наружных стен дополнительной отделки не требуют в связи с наличием отделочного слоя из цементно-песчаного раствора, выполняемого в заводских условиях. Все швы между панелями тщательно расшиваются полимерцементным составом.

После монтажа здания наружные поверхности панельных стен окрашиваются силикатными красками светлых тонов.

2.6. Требования технической эстетики

В проекте учтены требования технической эстетики в объемно-пространственном и цветовом решении помещений, освещении, рациональном размещении и выборе технологического и санитарно-технического оборудования, трубопроводов и вентиляционных устройств.

Цветовая отделка поверхностей помещений (потолков, стен, перегородок) выполняется в соответствии с требованиями "Руководства по проектированию цветовой отделки интерьеров жилых,

лечебных и производственных зданий" ЦНИИСФ Госстроя СССР (Стройиздат, 1978г.), "Указаний по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий" (СН 181-70) с учетом рекомендаций "Руководства по рациональному цветовому оформлению" Главсанупра МПС.

При привязке проекта следует руководствоваться методикой разработки проекта цветовой отделки интерьеров производственных зданий и примером оформления проектной документации, приведенной в "Руководстве" НИИСФ Госстроя СССР (разд.8 табл.25-30).

Выбор образцов цвета с учетом имеющегося ассортимента лакокрасочных материалов, а также особенностей светового режима района строительства, ориентации помещений по сторонам горизонта, общего характера свето-цветовой среды в интерьере в соответствии с назначением помещений осуществляется по таблице 4 СН 181-70 и контролируется визуальным сопоставлением с аттестованными образцами цвета по "Альбому колеров".

2.7. Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполняются в полном соответствии со СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП 2.04.01-85; СНиП П-92-76; ПУЭ-76 и "Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте".

Средства пожаротушения предусматриваются в соответствии с нормами оснащения противопожарным оборудованием и инвентарем. Наружное пожаротушение решается при привязке проекта к местным условиям.

По пожарной опасности в соответствии со СНиП 2.01.02-85 здание относится ко П степени огнестойкости, что соответствует П классу по классификации СНиП.

Объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают в случае возникновения пожара безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей из всех помещений.

Количество эвакуационных выходов и расстояния их от наиболее удаленных мест соответствует действующим нормативным требованиям.

В помещениях электрощитовой, сушильной камере, венткамерах двери предусмотрены несгораемыми по серии I.236-5 в.I.

Двери лестничных клеток предусмотрены самозакрывающимися с плотным притвором.

При привязке проекта стройгенплан разрабатывается и согласовывается с военизированной пожарной охраной дороги.

2.8. Краткие рекомендации по организации строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы по возведению здания должны выполняться с максимальной механизацией трудоемких процессов с соблюдением требований главы СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве",

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться "Методическим руководством по организации режимов труда и отдыха для строителей", работающих в климатических зонах страны, изд.1972г. Госстроя СССР, а также требованиями СН 276-74.

В виду того, что объект располагается в непосредственной близости от железнодорожных путей, основным транспортным средством по доставке строительных материалов и изделий предусматривается железнодорожный транспорт.

Разработка котлованов выполняется экскаватором, вывозка излишнего грунта - самосвалами; грунт складируется на свободной площадке. Обратная засыпка грунта производится бульдозером или автосамосвалами непосредственно из кузова с тщательным уплотнением пневмотрамбовками.

Котлован отрывается с естественными откосами в зависимости от вида разрабатываемых грунтов и принимается в соответствии со СНиП Ш-8-76.

Все работы по монтажу сборных конструкций должны выполняться в соответствии со СНиП Ш-16-80.

Для монтажа сборных бетонных и железобетонных элементов рекомендуются краны грузоподъемностью не менее тонн.

Получение бетона и раствора предусматривается в зависимости от местных условий: централизовано и от бетоносмесительного узла, расположенного непосредственно у объекта строительства.

Работы по настилке полов, остекление и отделочные работы выполняются с учетом средств малой механизации.

Гидроизоляционные и кровельные работы выполняются в соответствии с требованиями главы СНиП Ш-20-74.

2.9. Мероприятия по борьбе с коррозией

При эксплуатации здания нет технологических процессов агрессивно воздействующих на конструкции из бетона, железобетона, стали и дерева.

Мероприятия по антикоррозийной защите в обычных условиях сводятся к выполнению требований, приведенных в типовых строительных деталях по защите от коррозии сварных швов, накладных и закладных деталей и отделочным работам, указанным в разделе АР.

Отделочные работы при строительстве здания должны выполняться с соблюдением требований главы СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

При производстве работ по устройству отделочных покрытий необходимо руководствоваться указаниями по технике безопасности в строительстве, правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем СССР.

2.I0.Мероприятия по охране труда

Проектом предусмотрены помещения и оборудование удовлетворяющие требованиям санитарных норм проектирования (СН 245-7I), инструкция по проектированию вспомогательных зданий и помещений предприятий железнодорожного транспорта.

2.II. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

Ввиду отсутствия вредных выделения, мероприятия по защите атмосферного воздуха не требуются.

2.I2. Основные положения по организации строительства

2.I2.I. Основные положения по организации строительства к типовому проекту разработаны в соответствии со СНиП3.0I.0I-85 "Организация строительного производства".

2.I2.2. До начала производства основных работ на строительной площадке должны быть выполнены работы подготовительного порядка, а именно:

- временная кольцевая автодорога из сборных железобетонных плит шириной 3,5 м с радиусом закругления I2 м;
- закрытые и открытые склады;
- помещения административно-бытового назначения;
- временные сети тепло-энерго и водоснабжения, диспетчерская связь;
- ограждение территории.

2.I2.3. Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими материалами надлежит размещать с подветренной стороны по отношению к другим зданиям и сооружениям и не ближе, чем 20 м от них. Все склады должны отстоять от края дороги не менее, чем на 0,5м. В открытых складах необходимо предусмотреть продольные и поперечные проходы 0,7 м.

2.I2.4. Бытовые и административные здания размещаются так, чтобы они обеспечивали удобное обслуживание рабочих и в то же время не мешали производству работ.

Потребность в административных и культурно-бытовых зданиях определяется по расчетным нормативам для составления ПОС7.

2.I2.5. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде устанавливается в зависимости от территориального расположения строительства, величины годового объема СМР и отрасли согласно расчетным нормативам для составления проектов организации строительства.

2.I2.6. Снабжение стройплощадки электроэнергией, паром, сжатым воздухом и водой должно базироваться в первую очередь на использовании существующих источников.

2.I2.7. Освещение временных зданий площадки, а также подача электроэнергии на прожекторные мачты осуществляется с помощью временных воздушных линий, проложенных по столбам.

Стройгенплан, календарный график, перечень основных строительных машин и механизмов см.стр.

44,0
55,0
площадка складирования строительных материалов и конструкций
временная автодорога
путь движения крана
А
1
4,0м
РДК-25
площадка складирования строительных материалов и конструкций
участок временных зданий и сооружений
выезд
выезд

РАЗРЕЗ

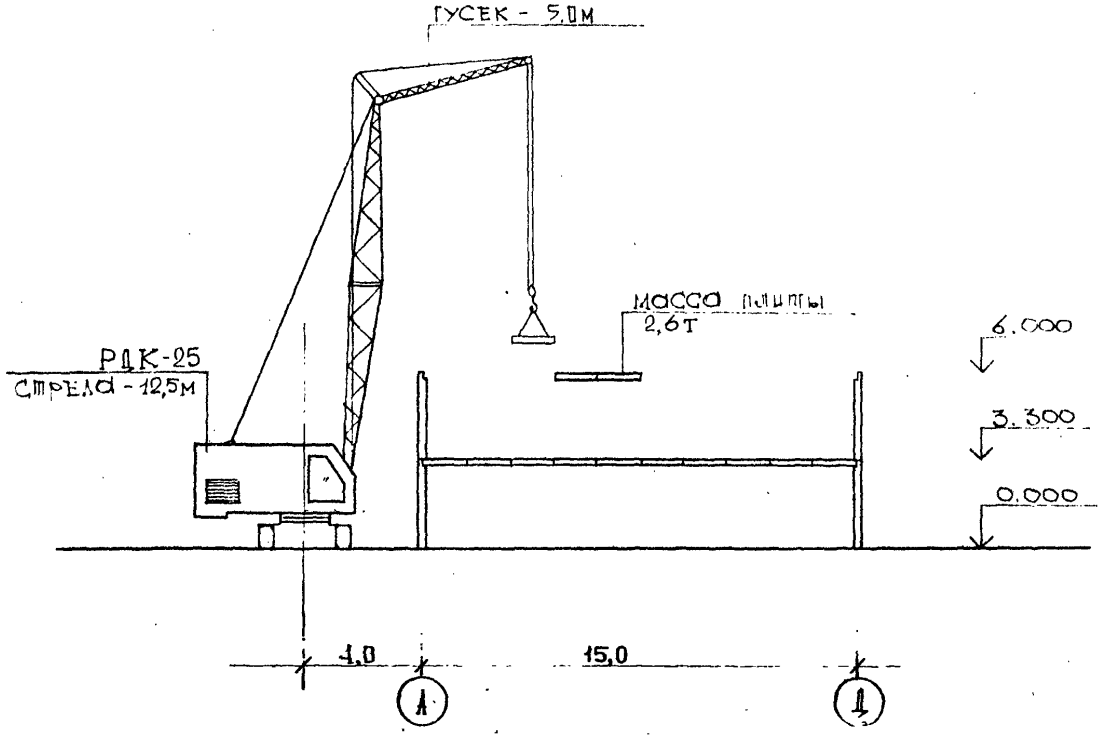
ГУСЕК - 5.0М
МАССА ПЛИТЫ
2,6Т
РДК-25
СТРЕЛА - 12,5М
6.000
3.300
0.000
1,0
15,0
1
1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

№№ пп	Наименование работ	ед. изм.	объем работ	трудоемкость в чел.дн.	продолжит. дн.	кол-во смен	число рабочих в смену	месяцы I	2	3	4	5
I.	Подготовительный период			50	I0	I	5	5				
2.	Подземная часть:											
	земляные работы	м3	2I7	27	5	I	5	5				
	фундаменты	м3	86,2									
3.	Надземная часть	$м^3_{зд.}$	2537.9	603	75	I	8		8			
4.	Санитарно-технические работы	-"-	-"-	2I7	54	I	4			4		
5.	Электромонтажные работы	-"-	-"-	35	I2	I	3				3	
6.	Силовое электрооборудование	-"-	-"-	29	I0	I	3					3
7.	Автоматизация сантехсистем	-"-	-"-	7	2	I	3				3	
8.	Монтаж технологического оборудования	-"-	-"-	20	5	I	4				4	
9.	Слаботочные устройства	-"-	-"-	89	30	I,5	2					2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Наименование	Марка	Кол-во	Примечан.
Экскаватор	ЭО-4112	1	
Бульдозер	Д3-42	1	
Автомобильный кран	РДК-25	1	
Вибратор глубинный	ИВ-47Б	2	
Вибратор площадочный	ИВ-31Я	2	
Сварочный агрегат	АСБ-300-7	2	
Компрессор	КС-9	1	
Пневматическая трамбовка	И-157	2	
Автомашина бортовая	ЗИЛ-130	по расчету	Груз 5.0т
Автосамосвал	ЗИЛ-ММЗ-555	по расчету	Груз. 4,5т
Седельный тягач	ЗИЛ-130 В1-80	1	Груз. 14,4т
Полуприцеп универсальный	ПС-090Б	1	Груз 9.0т

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МОНТАЖНОЙ ОСНАСТКИ И ИНВЕНТАРЯ

Наименование	Марка	Кол.	Примечан.
Панельные полмости Карачаровского завода	ПП6	2	
Четырехветвевой канатный строп	–	1	Груз. 10,0т
Кольцевой универсальный строп	УСК-2	2	Груз.0,4...10т
Бункер переносной поворотный с вибратором для бетона	БПВ-1,0	2	Емкость $1,0м^3$
			Емкость $0,2м^3$
Ящик для раствора переносной	–	4	Емкость $2,0м^3$
Ларь для сыпучих материалов	–	2	Емкость $1,0м^3$
Термос для горячих битумных мастик	–	1	

Методы выполнения основных видов работ

I. Земляные работы

I.I. Под здание разрабатывается котлован с откосами I:I м двумя односторонними въездами.

I.2. Разработка грунта в котловане предусматривается экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м3. Весь грунт отвозится автотранспортом.

I.3. Зачистка дна котлована - бульдозером и вручную.

I.4. Грунт, необходимый для обратной засыпки, привозится из резерва автотранспортом и засыпается непосредственно из кузова с тщательным уплотнением пневмотрамбовками.

II. Бетонирование монолитных железобетонных конструкций

II.I. Подача и укладка бетона осуществляется с помощью автокранов.

II.2. Арматурные сетки заготовляются в механизированных мастерских и подаются к месту установки теми же механизмами.

II.3. Сварочные работы, заделка стыков и швов выполняются согласно требованиям СНиП 3.02.0I-82.

II.4. Получение бетона и раствора предусматривается в зависимости от местных условий, централизовано или от бетоносмесительного узла, расположенного непосредственно у объекта строительства.

III. Монтаж сборных железобетонных конструкций

III.I. Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется башенными кранами.

III.2. Монтаж выполняется в следующей последовательности:

устройство фундаментов под стены,

монтаж стеновых панелей,

панелей перекрытия и вентблоков.

IУ.Техника безопасности

IУ.I. Основные положения по организации строительства предусматривают ведение строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ, а также транспорт материалов и конструкций с соблюдением всех мероприятий и правил по технике безопасности.

IУ.2. Необходимо строго соблюдать указания по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии при ведении строительно-монтажных, электротехнических, сантехнических и др.видов строительных работ (СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве").

3.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел водоснабжения и водоотведения разработан в соответствии со СНиП 2.04.0I-85 и предусматривает оборудование административно-бытового здания с бытовыми помещениями сетями хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и производственной канализации и внутренних водостоков.

Внутренние сети водопровода, канализации и горячего водоснабжения здания запроектированы из условия подключения их к внутриплощадочным сетям.

Глубина заложения ввода водопровода и выпусков канализации определяется при привязке проекта к местным условиям.

3.I.Хозяйственно-питьевой водопровод

Согласно СНиП 2.04.0I.85 в здании проектируется хозяйственно-питьевой водопровод.

Сеть водопровода монтируется из полиэтиленовых труб ПНД тип "СЛ" ГОСТ I8599-83 и прокладывается открыто по стенам и конструкциям здания. Необходимый напор на вводе составляет 0,I4 МПа.

Расчетный расход воды приведен на листе ВК-I "Общие данные".

Наружное пожаротушение здания в количестве I0 л/с учесть при привязке проекта.

Внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с пунктом 6.5[а] и пунктом 4 таблицы I СНиП 2.04.01-85.

3.2.Горячее водоснабжение

В здании предусматривается централизованная система горячего водоснабжения.

Сеть горячего водоснабжения и циркуляционный трубопровод монтируются из легких стальных водогазопроводных труб I5÷40мм ГОСТ 3262-75 и прокладывается открыто по стенам и конструкциям здания.

Вводы горячего и циркуляционного трубопроводов к зданию прокладываются совместно с трубами отопления в канале теплосети.

Расчетный расход тепла для горячего водоснабжения приведен на листах марки ОВ.

3.3.Канализация хозяйственно-бытовая

Отвод сточных вод от санитарно-бытовых приборов запроектирован системой трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации через выпуски во внутриплощадочную наружную сеть.

Внутренняя сеть канализации монтируется из пластмассовых канализационных труб (ПВХ) и фасонных частей к ним ⌀50÷I00 мм ГОСТ 22689.0-77 ÷ ГОСТ 22689.20-77. Соединение пластмассовых труб производится с помощью резиновых уплотнительных колец.

Длина и уклон выпусков, а также отметки лотков труб на выпусках определяются при привязке типового проекта к местным условиям.

Расчетные расходы сточных вод приведены в общих данных на листе ВК-I.

3.4. Канализация производственная

Отвод сточных вод производственного назначения от технологического оборудования буфета проектируется системой трубопроводов внутренней производственной канализации через самостоятельный выпуск во внутриплощадочную наружную сеть канализации.

Внутренняя сеть канализации монтируется из пластмассовых труб (ПВХ) и фасонных частей к ним ∅ 50 + 100мм. Соединение пластмассовых труб производится с помощью резиновых уплотнительных колец.

Длина и уклон выпуска, а также отметка лотка трубы на выпуске определяются при привязке типового проекта к местным условиям.

Расчетные расходы сточных вод производственного назначения приведены в общих данных на листе ВК-I.

3.5.Внутренние водостоки

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания обеспечивается системой внутренних водостоков с выпусками на отмостку, а в зимнее время в бытовую канализацию.

Внутренняя сеть водостоков монтируется из пластмассовых труб (ПВХ) и фасонных частей к ним ∅ 100 ГОСТ 22689.0-77+ ГОСТ22689.20-77 и стальных электросварных труб ∅ 108х2,8 мм ГОСТ 10704-76.

На кровле здания устанавливаются две водосточные воронки ∅ 100 мм типа Вр-9.

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.I. Общие исходные данные

Проект отопления и вентиляции разработан на основании технологического задания, архитектурно-строительных чертежей с учетом действующих строительных норм и правил: СНиП 2.04.05-86, СНиП II-92-76, СНиП I.02.01-85, СНиП II-Л.8-71, СНиП II-12-77, СНиП 2.04.07-86.

Расчетная температура наружного воздуха принята:

для проектирования отопления -30°С;

для проектирования вентиляции -30°С;

то же, в теплый период года +22°С.

Расчетные температуры воздуха внутри помещений приняты по соответствующим СНиПам.

Режим работы производства 3 смены.

Источником теплоснабжения, в соответствии с заданием на проектирование, приняты внешние тепловые сети.

В качестве теплоносителей принята вода в системах отопления с расчетными параметрами 105-70°С, для вентиляции 150 - 70°С. Для системы теплоснабжения сушилки - вода 55-45°С от системы горячего водоснабжения.

4.2. Основные решения по отоплению и вентиляции

Система отопления принята однотрубная, горизонтальная, поэтажная регулируемая и в качестве нагревательных приборов конвекторы "Универсал".

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция механическая и естественная раздельная для буфета, бытовых помещений и других помещений, по вытяжке раздельная для помещений сушилки, уборных, душевых, комнаты для обеспыливания.

Для уменьшения шума, создаваемого вентоборудованием предусмотрены следующие мероприятия: вентоборудование размещается в изолированном помещении, устанавливаются на виброоснованиях и обслуживающие "тихие" помещения оборудуются шумоглушителями, с воздуховодами соединяются гибкими вставками.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из стали тонколистовой по ГОСТ 19904-74 и в качестве вертикальных воздуховодов в отдельных случаях устанавливаются вентиляционные блоки в чертежах "АС".

Системы отопления и теплоснабжения калориферов проектируются из стальных водогазопроводных труб легких по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-76.

Трубопроводы и нагревательные приборы покрываются краской БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-020.

Трубопроводы узла управления, системы теплоснабжения теплоизолируются шнурами минераловатными в чулке из металлической проволоки, в качестве покровного слоя тепловой изоляции принят стеклопластик РСТ.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В состав проекта входят чертежи по силовому электрооборудованию и электроосвещению административно-бытового здания.

5.I.Электроснабжение

По надежности электроснабжения электроприемники здания относятся, согласно ОСТ 32.I4-80, табл.I, ко 2 категории.

Показатели электроустановки здания приведены в таблице

Наименование показателя	Единица измерения	Количество
Установленная мощность	кВт	56,4
В том числе:		
силовое электрооборудование	кВт	4I,6
электроосвещение	кВт	I4,8
Расчетная мощность	кВт	36,6
В том числе:		
силовое электрооборудование	кВт	24,4
электроосвещение	кВт	I2,2

Электроснабжение принято двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями от независимых источников электроэнергии.

Напряжение питающей сети 380/220В.

Вводы выполняются к вводно-распределительному устройству, от которого предусмотрены питающие линии к силовым пунктам и групповым щиткам.

Питающие линии запроектированы проводом АПВ в полиэтиленовых трубах, прокладываемых в подготовке пола. При выходе труб у стен предусмотрена их защита от механических повреждений.

Учет электроэнергии предусмотрен на вводах, а также на питающей линии к силовому пункту блока приготовления пищи.

5.2. Силовое электрооборудование

Силовыми электроприемниками являются электроприводы сантехсистем, технологическое оборудование блока приготовления пищи и рукосушители.

Напряжение электроприемников 380В и 220В.

Питание электроприемников запроектировано от распределительных пунктов типа ПРП.

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели типа ПМЛ. Для приточных вентсистем запроектированы ящики управления.

Управление электроприводами ручное, местное.

Предусмотрено централизованное ручное и автоматическое (при срабатывании системы пожарной сигнализации) отключение вентсистем.

Распределительная сеть запроектирована проводом АПВ в полиэтиленовых трубах; выход проводов к электроприемникам выполняется в отрезках стальных тонкостенных труб.

Токоподвод к электродвигателям вентиляторов, установленных на виброосновании, принят, в соответствии с ПУЭ 5.3.29, проводами с медными жилами.

5.3. Электроосвещение

Электроосвещение основных помещений принято светильниками с люминисцентными лампами, вспомогательных помещений - светильниками с лампами накаливания.

Освещенность принята согласно СНиП II-4-79 и ОСТ 32-9-81.

Предусмотрено два вида освещения: рабочее и эвакуационное.

Эвакуационное освещение выделено из числа светильников рабочего освещения и питается независимо от него.

Величины освещенности, типы светильников и мощности ламп приняты в соответствии с назначением помещений и характером окружающей среды.

Напряжение сети освещения: рабочего и эвакуационного - 220В, переносного - 36В.

Групповая сеть запроектирована:

к светильникам - проводом АПВ, прокладываемым в полиэтиленовых трубах в подготовке пола вышележащего этажа;

к штепсельным розеткам - проводом АПВ, в полиэтиленовых трубах, прокладываемых в подготовке пола данного этажа;

спуски к выключателям предусмотрены проводом АПВ;

в душевых, венткамерах, электрощитовой - кабелем АВВГ, прокладываемым открыто.

Обслуживание светильников предусматривается с лестницы - стремянки.

5.4. Зануление. Молниезащита

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования зануляются путем присоединения к защитному нулевому проводу или рабочему нулевому проводу сети освещения.

Для связи с нулевой точкой источников электроэнергии используются нулевые жилы питающих кабелей.

Здание выполнено из огнестойких материалов и имеет малую поражаемость молнией, поэтому, согласно СН 305-77, мероприятия по молниезащите проектом не предусматриваются.

6. АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХСИСТЕМ

Проект выполнен на основании задания сантехнического раздела проекта.

Автоматизируются приточные вентсистемы П1 - П3.

Проектом предусматривается:

защита воздухонагревателей от замерзания;

контроль параметров теплоносителя и воздуха;

управление электродвигателями вентсистем;

аварийная сигнализация при замерзании воздухонагревателей.

В качестве датчиков температуры приняты терморегуляторы электрические типа ТУДЭ.

Регулирующие клапаны на теплоносителе заказываются в сантехническом разделе проекта.

Аппаратура управления вентсистемами размещена в навесных ящиках, запроектированных в соответствии с ОСТ 160.800.485-84 Ящики учтены в электротехнической части проекта.

Электрические проводки системы автоматизации запроектированы кабелем АВВГ и проводом АПВ в полиэтиленовых трубах.

7. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

В проектируемом здании предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:

- оперативная телефонная связь;
- местная телефонная связь;
- радиофикация;
- электрочасофикация;
- пожарная сигнализация.

7.1. Оперативная телефонная связь

Оперативная телефонная связь предназначается для прямой связи начальника грузового района с работниками грузового района и информатора о подходе грузов с диспетчерами данной станции (ДСП, ДСЦ, ДСЦС, ДСЦГ).

У начальника грузового района предусматривается установка оперативной телефонной связи типа "Псков-25", в которую помимо линий прямых абонентов включаются соединительные линии с коммутаторами станционной связи перечисленных выше командиров, а также соединительные линии с местной железнодорожной АТС.

Электропитание установки "Псков-25" осуществляется от сети переменного тока.

У информатора о подходе грузов устанавливается концентратор "Риф", куда заводятся абонентские линии оперативной связи начальника грузового района и диспетчеров станции, а также абонентская линия местной железнодорожной АТС.

Телефонные линии с коммутаторами станционной связи прокладываются в кабеле комплексной телефонной сети.

7.2. Местная телефонная связь

Телефонизация здания предусматривается от железнодорожной АТС. Абонентские линии прокладываются в общем кабеле с соединительными линиями оперативной связи.

Для этой цели предусматривается ввод в проектируемое здание кабеля комплексной телефонной сети марки ТПШБ 50х2х0,4, который учитывается при привязке проекта.

У абонентов устанавливаются телефонные аппараты типа ТА-72М-2АТС.

7.3. Радиофикация

Радиофикация здания предусматривается от существующей сети Министерства связи.

Ввод линии радиофикации в здание выполняется кабелем марки РМПЭЭПБ 2хI,2, длина которого учитывается при привязке проекта.

Абонентский трансформатор типа ТАМУ-I0 устанавливается на стене. От абонентского трансформатора прокладывается провод ПТВЖ 2хI,2 до ответвительной коробки. Абонентская проводка выполняется проводом ПТВЖ 2х0,6. У абонентов устанавливаются громкоговорители "Эфир".

7.4. Электрочасофикация

Электрочасофикация помещений предусмотрена от первичной электрочасовой установки узла связи железнодорожной станции.

В помещениях устанавливаются вторичные электрочасы типа ВЧСI-М2ПВ-24р-300-323к, на фасаде здания - уличные электрочасы ВЧСI-МПВ24р-800-3I2к.

Ввод линии от первичных электрочасов в проектируемое здание предусматривается в кабеле комплексной телефонной сети.

7.5. Пожарная сигнализация

Раздел пожарной сигнализации разработан в соответствии со СНиП 2.04.09-84.

Для обеспечения пожарной безопасности помещения проектируемого здания оборудуются тепловыми извещателями автоматической пожарной сигнализации типа ИП-I05-2/I.

Для возможности включения шлейфа пожарной сигнализации в пульт централизованного наблюдения "Топаз" извещатели ИП-I05-2/I шунтируются резисторами МЛТ-0,25-6,8 кОм.

В качестве пульта централизованного наблюдения должен быть использован пульт централизованной охраны грузового двора или железнодорожной станции. Шлейф пожарной сигнализации вводится в проектируемое здание в кабеле комплексной телефонной сети.

Для отключения вентиляции в случае возникновения пожара в проектируемом здании предусматривается установка реле МКУ-48С, включаемого в запараллеленные контакты АСПТ соответствующих

лучей концентратора "Топаз" пульта централизованного наблюдения железнодорожной станции. Питание реле предусматривается от выпрямителя СВ-48-I.

7.6. Устройство скрытой проводки

Слаботочные сети по зданию прокладываются скрытым способом в подпольных каналах. Вертикальная разводка сетей осуществляется в стояках из полиэтиленовых труб.

На каждом этаже трубы стояков заводятся в шкаф слаботочных сетей (чертеж 46I00069 СБ Гипросвязь,Москва). Под каждым шкафом слаботочных сетей устраивается подпольная коробка 200х200 (лючок для слаботочных сетей типа Л2П). Такие же коробки устанавливаются в коридоре.

Горизонтальная проводка сетей телефонизации, радиофикации, электрочасофикации предусматривается в полиэтиленовых трубах ⌀20÷40 мм, прокладываемых в подготовке пола между подпольными коробками и от коробок в служебные помещения.

Для установки абонентских точек в помещениях у абонентов устраиваются узлы скрытых проводок.

СВЕТОМАСКИРОВКА

Световая маскировка здания выполняется в соответствии с требованиями СНиП П-10-74 раздел 7 и СНиП 2.01.53-84.

В режиме частичного затемнения согласно п.3.1 СНиП 2.01.53-84 часть светильников рабочего освещения в служебных помещениях, гардеробах, обеденном зале должна быть отключена.

Во всех вспомогательных помещениях со световыми проемами (венткамеры, чистки одежды, обогрева), а также на лестницах светильники рабочего освещения отключаются.

В режиме полного затемнения в соответствии с п.3.2 СНиП 2.01.53-84 предусмотрен электрический способ маскировки - отключение всех светильников (рабочего и эвакуационного освещения) т.к. пребывание людей в здании при сигнале ВТ не предусматривается.

Указания по привязке типовых проектов защитных сооружений ГО

Планировочные решения административно-бытового здания разработаны с учетом возможности привязки под зданием типовых проектов склада материалов и оборудования.

Выбор типового проекта защитного сооружения осуществляется при привязке проекта с учетом климатических и гидрогеологических условий строительной площадки, других специальных требований (*по классу защиты, режимам вентиляции и др.*) и возможностей производственной базы строительных подразделений.

При привязке проекта необходимо:

- уточнить длину и направление аварийного выхода, необходимость устройства тротуарного грузового лифта. При этом возможно изменение положения лифта в зависимости от конкретных технологических требований.
- Откорректировать рабочие чертежи, объемы работ и сметы административно-бытового здания с учетом конкретных условий привязки и дополнительных трудозатрат на строительство и оборудование встроенных помещений.
- В случае необходимости конструктивно возможно устройство обычного подвала под остальной частью здания. При этом следует изменить конструкцию стены защищенного подвала, отделяющую его от обычного подвала. Эту стену рекомендуется выполнить из монолитного железобетона, рассчитав ее на особое сочетание нагрузок в соответствии со СНиП II-II-77*.

Схема привязки объекта ГО

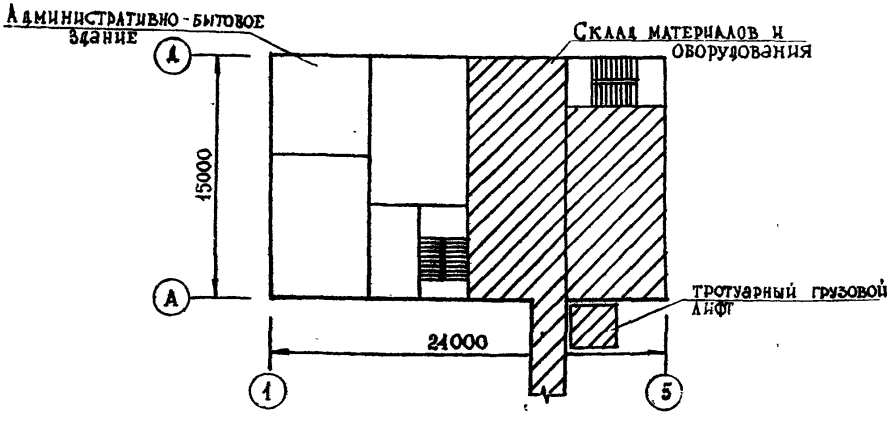

23360-01

Таблица базовых показателей и достигнутых в проекте

№ п/п	Наименование показателей		Данные и показатели на I м2 общей площади	
			базовые показатели	рассматриваемого проекта
I.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	руб.	I50,0	I08,45
2.	Трудоемкость	чел.час	I7,2	II,6I
3.	Расход строительных материалов:			
	-цемент, приведенный к марке "400"	т	0,22	0,I88
	-сталь, приведенная к классу А-I и С38/23	т	0,035	0,0286
	- бетон и железобетон,	м3	0,95	0,697

23360-01

Технико-экономические показатели проекта "Административно-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с бытовыми помещениями на 50 человек в крупнопанельных бескаркасных конструкциях

№№ пп	Наименование показателя	Базовые или проекта-аналога	Достигнутые в проекте
I	2	3	4
I	Численность работающих, чел.		60
2	Площадь общая, м2		707,6
3	То же, на одного работающего, м2		II,79
4	Строительный объем здания, м3		2537,9
5	Сметная стоимость строительства, общая, тыс.руб.		88,06
	То же, на одного работающего, руб.		I468
	Стоимость строительно-монтажных работ, тыс.руб.		76,72
	То же, Iкв.м. общей площади, руб.	I50,0	I08,45
	Сметная стоимость строительства с учетом условной привязки; тыс.руб.		96,9
5	Эксплуатационные затраты на одного работающего, руб.		403,5
6	Удельный вес прогрессивных видов СМР, %		42,7
7	Трудоемкость строительства, всего, чел.-ч.		82I4
	То же, на Iкв.м. общей площади, чел.-ч.	I7,2	II,6I
	То же, на расчетную единицу, чел.-ч.		I36,9

I	2	3	4
8	Материалоемкость строительства:		
	- цемент, приведенный к М-400, всего, т		I32,7I
	То же, на расчетную единицу, т		2,2I
	То же, на I кв.м общей площади, т	0,22	0,I9
	То же, на I млн.руб. СМР, т		I729,35
	- сталь, приведенная к А-I Сталь 3, всего, т		23,0
	То же, на расчетную единицу, т		0,34
	То же, на I кв.м. общей площади, т	0,035	0,029
	То же, на I млн.руб. СМР, т		263,62
	- Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу, всего м3		55,99
	То же, на расчетную единицу, м3		0,93
	То же, на I млн.руб. СМР, м3		729,6I
9	Расход тепла на расчетную единицу, ГДж		78,4
I0	Расход электроэнергии на расчетную единицу, МВт.ч		3,02

gost.e-ecolog.ru
