ГОССТРОЙ
РСФСР

КБ
ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ 125

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В О II и III КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-04

БЛОК-СЕКЦИЯ 9и ЭТАЖНОГО ДОМА

ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ НА 36 КВАРТИР - 1Б 2Б 2Б 3Б

ЧАСТЬ 1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫШЕ ОТМЕТКИ ±0,000

11734-03
ЦЕНА 1-56

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типового проектирования просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ .....
(номер проекта)

Наименование проекта .....

.....

Проектная организация—автор проекта .....

Замечание о недостатках в проекте (нерациональные объемно—планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т.п.) и предложения по их устранению .....

Подпись должностного лица, наименование организации и ее адрес

.....

.....

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
107066, Москва, Б—66, Спартаковская ул., 2а, корпус В

Сдано в печать 1972 года
Заказ № 445 Тираж 150 экз.

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ 125

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВО II И III КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-04

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНОГО ДОМА ТОРЦОВАЯ ЛЕВАЯ НА 36 КВАРТИР $1^{Б}2^{Б}2^{Б}3^{Б}$

СОСТАВ ПРОЕКТА

часть 0.1 Архитектурно-строительные чертежи ниже отм± 0.00
раздел 01-1 Здание с ленточными фундаментами

часть02 Отопление и вентиляция ниже отметки ± 0.00
раздел 02-1 Здание с ленточными фундаментами/Вариант с параметрами теплоносителя-105°-70°С/

часть 03. Водоснабжение, канализация и водостоки ниже отм.± 0.00
раздел 03-1 Здание с ленточными фундаментами.

часть 1. Архитектурно-строительные чертежи выше отм. ± 0.00
часть2 Отопление и вентиляция выше отметки ± 0.00
раздел 2-1 Вариант с параметрами теплоносителя 105°-70°С

часть 3. Водоснабжение, канализация и водостоки выше отм± 0.00
часть 4. Газоснабжение
часть 5 Электрооборудование
часть 6 Слаботочные устройства
часть 8 Смета

часть 9 Узлы и детали
раздел 9.1 Типовые секции. Архитектурные решения. Детали.
раздел 9.2 Монтажные узлы и детали.
раздел 9.6 Архитектурные детали /дополнение/
часть 10 Изделия заводского изготовления.
раздел 10.1-1 Наружные стеновые панели из легкого и ячеистого бетона толщ. 250-300 мм
раздел 10.1-2 Наружные стеновые панели из легкого бетона толщ. 350-400 мм
раздел 10.2-1 Внутренние стеновые панели
раздел 10.3-1 Многопустотные панели перекрытия шириной 2390 мм
раздел 10.4-1 Прочие сборные изделия из тяжелого бетона.
раздел 10.4-4 Прочие сборные изделия /железобетонные, металлические и деревянные/
раздел 10.5-1 Перегородки и изделия ванн
раздел 10.6-1 Деревянные изделия
раздел 10.7-1 Металлические изделия.
серия 1.75 раздел 10.8-1 Санитарно-технические кабины /строительная часть/
серия 1.75 раздел 10.8-2 Санитарно-технические кабины /санитарно-техническая часть/
раздел 10.9-1 Изделия нулевого цикла
Типовой проект НМ-41, ум61 чертежи мусоропровода

ЧАСТЬ 1

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ВЫШЕ ±0.00

Разработан:
конструкторским бюро
по железобетону
Госстроя РСФСР

Утвержден:
Госкомитет по гражданскому
строительству и архитектуре
при Госстрое СССР
приказ № 278 от 30/XII-1969г.
введен в действие
КБ по железобетону
приказ № 19 от 6/III-1972г.

NN п/п	Наименование	№ листов	№ стр.
1	Содержание	С-1	2
2	Пояснительная записка	ПЗ-1, ПЗ-5	3-7
3	План типового этажа	АР 1	8
4	План первого этажа	АР-2	9
5	Фасады в осях „1-6" и „6-1"	АР-3	10
6	Пример компановки блок-секции Главный фасад и схема плана типового этажа	АР-4	11
7	Пример компановки блок-секций. Фасад со стороны входов.	АР-5	12
8	Фасад в осях „Г-А" и разрез I-I	АР-6	13
9	Монтажные планы типового и первого этажей Планы межэтажного перекрытия над 9-ым этажом.	АР-7	14
10	План раскладки панелей крыши План крыши. Разрезы по крыше.	АР-8	15
11	Монтажный план панелей пола и маркировка объемных санкабин.	АР-9	16
12	Спецификация сборных железобетонных элементов	АР-10	17
13	Спецификация наружных стеновых панелей из ячеистого бетона толщиной 250 и 300 мм	АР-11	18
14	Спецификация наружных стеновых панелей из легкого бетона толщиной 300 и 350 мм.	АР-12	19
15	Спецификация наружных стеновых панелей из легкого бетона толщиной 400 мм Спецификация металлических изделий	АР-13	20
16	Спецификация перегородок, панелей пола и объемных санкабин.	АР-14	21
17	Спецификация столярных изделий на один этаж.	АР-15	22
18	Сводная спецификация столярных изделий	АР-16	23
19	Сводная спецификация столярных изделий.	АР-17	24

КБ по железобетону Госстрое РСФСР	1971	9эт т.блок секция 1Б-2Б-2Б-3Б левая на 36 квартир	Содержание	Типовой проект 125-84	Часть 1	Лист К-1

АКО-1

Гл. инженер КБ — Г. Волкинский
Гл. конструктор КБ — Э. Фельдман
Гл. архитектор КБ — В. Сергеев
Нач. отдела — Ю. Красновидов
Гл. констр. пр — Э. Афанасьев
Гл. архитектор пр — Г. Архитектор
Нач. сект. конструк — Вед. конструктор
Гл. сект. архитектор — Ст. архитектор
Исполнитель — Проверил
С. Васильева — А. Смирнова
Р. Гурьева — И. Ичх
О. Особлева
В. Мишина
Арх №

11734-03 3

I Общая часть.

Типовой проект торцевой /левой/ блок-секции $1^{б}.2^{б}.2^{б}.3^{б}$ на 36 квартир, 9ти этажного жилого дома, входит в состав комплексной серии крупнопанельных жилых домов и общественных зданий и предназначена для строительства в 1971-75 г.г. во II и III климатических районах с обычными геологическими условиями, с расчетной температурой наружного воздуха от -20 до -40°С

Проект разработан Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР в соответствии с планом типового проектирования на 1971 год и задания на проектирование Госгражданстроя и архитектуры Госстроя СССР от 19 декабря 1969 г и приказа №278 от 30 XII 1969 г.

Проект 125-04 торцевой /левой/ блок-секции 9ти этажного дома разработан на основе планировочного решения блок-секции серии „75" и на базе номенклатуры изделий серии „125" с учетом максимального использования оборудования на существующих заводах и является конструктивным вариантом серии „75" для строительства в 1971-75 г.г.

II Архитектурно-планировочное решение

Планировка торцевой/левой/секции предусматривает зонирование общей комнаты и кухни, спальных комнат и санитарных узлов. Повышается уровень санитарно-технического оборудования квартир- установкой ванн длиной 1,7м, увеличивается площадь ванных комнат Кухни всех квартир оборудуются хозяйственным и антресольными шкафами, в кухнях проектируются навесные шкафы, стол и шкаф под мойку.

Согласно принятым типам квартир фасады торцевой/левой/ блок-секции решены с западающими лоджиями и балконами, а также предусматривается разнообразие фактурной и цветовой обработки панелей: декоративный фактурный слой бетона с рельефным рисунком поверхности; со вскрытой структурой заполнителя; с мраморным, гранитным или керамическим щебнем; облицовочный слой из керамической глазурованной или стекломозаичной и мозаичной плиткой с применением цветных цементов и др. кирпичные и железобетонные стены входа обрабатываются стекломозаичной плиткой разных цветов.

Образцы фактуры панелей, а также цветовые решения входов должны быть в каждом отдельном случае согласованы с авторами привязки проекта.

Окна-запроектированы в соответствии с ГОСТ 11214-64.

Внутренние двери-приняты в соответствии с ГОСТ 6629-44.

Наружные двери приняты по серии 1.135-1. альбом I, распространяемый ЦИТП.

Стены-жилых помещений окрашиваются клеевыми красками со шпаклевкой поверхностей или оклеиваются обоями с предварительной шпаклевкой всех швов стеновых панелей и перегородок: стены прихожей оклеиваются обоями: стены санузлов облицовываются- глазурованной плиткой на высоту 1,4 м; ванные комнаты облицовываются глазурованной плиткой на высоту 1,8 м; выше-клеевая покраска; стены кухонь окрашиваются масляной краской на высоту 1,8 м. В месте расположения кухонного оборудования стены облицовываются глазурованной плиткой, с высоты 0,75 и до 1,35 м. выше клеевая покраска.

Стены-лестничных клеток окрашиваются масляными красками на всю высоту; галошница- на высоту-15см-черного цвета, по всем маршам и лестничным площадкам.

Потолки-во всех помещениях шпаклюются с расшивкой швов и побелкой. Колера всех помещений подбираются при привязке. Основной вариант пола в жилых помещениях, в передних, кухнях принят из линолеума, полы в санузлах и ванных-керамическая плитка. Дан вариант пола из паркетной доски и деревянных щитов.

В блок-секции запроектировано центральное отопление; горячее водоснабжение, газоснабжение, электроосвещение, радиотрансляция, телевизионная и телефонная сети. В каждой лестничной клетке запроектирован мусоропровод. Стены мусоросборных камер облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту стены, полы из керамической плитки.

Проектом предусматривается возможность применения но-технических кабин полной заводской готовности.

III Конструктивн

1. Фундаменты

Вариант с ленточными фундаментами

Чертежи сборных ленточных фундаментов разработаны для расчетного сопротивления основания на глубине 1,5-2,0 м в 2,0 кг/см².

На фундаментные подушки устанавливаются панели внутренних стен технического подполья Цокольные панели опираются на блоки „СП", устанавливаемые на фундаментные блоки.

Детальное описание к конструкции нулевого цикла при варианте ленточных фундаментов дано в части 01.

Для облегчения привязки фундаментов в проекте приведены схемы нормативных нагрузок на отметке низа перекрытия технического подполья для варианта ленточных фундаментов

2. Наружные стены.

Наружные стеновые панели продольные и торцовые-самонесущие.

Разрезка стен полосовая. Толщина наружных стен при полосовой разрезке 250, 300, 350 и 400мм.

Панели наружных стен должны выпускаться полной заводской готовности с декоративным наружным фактурным слоем.

Толщина панелей назначается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в соответствии с таблицей №1.

3. Внутренние стены

Панели внутренних стен железобетонные, толщиной 160мм Марка бетона панелей принята М-250 В целях повышения индустриализации электромонтажных работ в панелях внутренних стен предусмотрены каналы для скрытой сменяемой электропроводки, образуемой при формовке панелей.

4. Вентиляционные блоки

Вентиляционные блоки приняты самонесущими толщ 300мм 2х канальные и со спутником шириной 880мм Марка бетона вентблоков принята М-200 Вентблоки рассчитаны только на централизованное горячее водоснабжение.

5. Перекрытия

Перекрытия запроектированы пустотными шириной 2390мм, высотой 220мм. Пустоты панелей в опорной части заделываются бетоном на заводе- изготовителе.

1971	9эт. р. блок-секция $1^{б}.2^{б}.2^{б}.3^{б}$/левая/ на 36 квартир	Пояснительная записка.	Типовой проект 125-04	Часть-1	Лист ПЗ-1

11.34-03

КБ по железобетону Госстроя РСФСР
АКО-1
Гл. инженер КБ | Гл. конструк. КБ | Гл. архитект | Нач. отдела | Гл. конст. пр-та
В. Болтинский | Я. Фельман | В. Сергеев | Ю. Красновидов | П. Афанасьев
Гл. архит. пр-та | Нач. сект. конст | Нач. сект. архит | Вед. конструк | Ст. архитек.
Г. Пачевцева | А. Смирнова | Р. Гурьева | И. Пух | О. Скобелева
Исполнитель | Проверил
В. Мишина

Основные конструктивные и теплофизические характеристики однослойных панелей жилых домов серии

Таблица №1

Толщина панелей мм	Материал утеплителя, теплопровод. панелей ккал/м час °С	Объемный вес материала панели кг/м³	Толщины слоев панели в мм: внутреннего фактурного слоя мм	материала панели мм	наружного фактурного слоя мм	Приведенное сопротивление теплопередаче R пр м² час град/ккал: зона сухая	зона норм.	зона влаж.	Характеристика тепловой инерции: зоны 10	11	12	Предельные расчетные температуры наружного воздуха: зимняя t н. года: зона сухая	зона норм.	зона влаж.	период сух.	период норм.	период влаж.	летняя t н. град	пожелтение	время сек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
250	Ячеист.б. 0.215	700	15	220	15	1.30	1.19	1.10	3.34	3.18	3.04	-34	-30	-26	одно	слаб	ука	не отр.	10.0	12.2
250	Ячеист.б 0.25	800	15	220	15	1.26	1.00	0.98	3.36	3.16	3.04	-32	-24	-21		"		"	10.0	1.20
250	Керамз. 0,25	800	15	220	15	1.27	1.00	0.98	3.36	3.16	3,04	-33	-24	-21		"		"	10.0	12.0
250	Керамз 0,275	900	15	220	15	1.15	0.98	0.90	3.86	2.94	2.84	-28	-21	-18		"		"	10.0	12.0
250	Керамз. 0.30	1000	15	220	15	1.00	0.90	0.85	3.8	3,45	3,32	-24	-18	-16		"		"	10.0	11.2
250	Керамз. 0.350	1100	15	220	15	0.92	0.83	0.78		3.45	3.30	-21	-15	-13		"		"	10.0	11.0
300	Ячеист.б. 0.215	700	15	270	15	1.58	1.40	1.30	4.10	3.82	3.66	-45	-40	-35				"	11.0	13.9
300	Ячеист.б 0.25	800	15	270	15	1.39	1.25	1.15	4.00	3.83	3.63	-38	-32	-28			"	"	10.1	11.7
300	Керамз. 0.25	800	15	270	15	1.50	1.25	1.00	4.10	3.83	3.63	-40	-32	-28	"	"	"	"	10.1	11.7
300	Керамз. 0.275	900	15	270	15	1.24	1.15	1.00	4.65	3.88	3.63	-36	-28	-25	"	"	"	"	11.1	13.2
300	Керамз. 0.30	1000	15	270	15	1.20	1.05	0.98	4.63	4.18	3.98	-32	-25	-22	"		"	"	10.6	12.6
300	Керамз. 0.350	1100	15	270	15	1.12	0.98	0.92	4.62	4.19	3.98	-29	-22	-19	"	"		"	10.1	12.0
350	Керамз. 0.25	800	15	320	15	1.74	1.40	1.32	4.90	4.48	4.28	-50	-40	-35	"	"	"	"	11.4	13.0
350	Керамз. 0.275	900	15	320	15	1.56	1.32	1.20	5.43	4.42	3.98	-45	-35	-30	"	"	"	"	11.0	12.9
350	Керамз. 0.30	1000	15	320	15	1.40	1.20	1.14	5.43	4.68	4.68	-40	-30	-25	"	"	"	"	10.5	12.5
350	Керамз. 0.350	1100	15	320	15	1.31	1.12	1.06	5.43	4.90	4.70	-38	-20	-23	"	"	"	"	10.0	12.0

Примечания:

1. Настоящая таблица составлена на основании исследований температурных полей стыков однослойных стеновых панелей жилых домов серии 1-467А, проведенных лабораторией теплофизических испытаний ЦНИИЭП жилища $R_{пр} = 0.95 R$.
0,95 - коэффициент, учитывающий теплопотери в стыках и на оконных откосах.
2. Температура трехдневки является средней между температурами однодневки и пятидневки.

Марка бетона пустотных перекрытий 9-ти эт. домов „200". Панели длиной 6380 мм армируются предварительно-напряженной стержневой арматурой класса А-IV электротермическим способом натяжения. Возможно применение в качестве предварительно напряженной арматуры высокопрочной проволоки.

6. Лестницы

Лестничные марши железобетонные из бетона марки „300" с гладкой лицевой поверхностью без накладных проступей, ширина марша - 1200 мм.

Лестничные площадки приняты ребристые железобетонные с гладкой поверхностью при кассетном производстве, или облицованные на заводе мозаичным бетоном, либо ковровой керамической плиткой при горизонтальном изготовлении.

7. Перегородки

Перегородки запроектированы крупнопанельные двух типов

1. Межкомнатные - гипсобетонные, или керамзитобетонные толщиной 80 мм
2. В санузлах - железобетонные толщиной 50 мм. Высота панелей перегородок принята 2540 мм.

8. Полы.

Полы в жилых комнатах, передних и кухнях - линолеум, наклеиваемый на гипсобетонные или керамзитобетонные панели пола, которые укладываются по упругим звукоизолирующим прокладкам. Даны варианты пола из паркетной доски.

В санитарных узлах применены железобетонные поддоны, облицованные керамической плиткой. Полы в лоджиях - керамическая плитка по цементной стяжке.

9. Крыша

Крыша дома - индустриальная с „мансардой", с внутренним отводом воды и представляет собой раздельную конструкцию, состоящую из панелей перекрытий над верхним этажом, утеплителя и сборных ребристых железобетонных плит, которые служат основаниями под рулонный ковер.

Ребристые плиты укладываются по балкам переменного сечения, располагаемым по поперечным осям.

Уклон крыши принят 2.5%. В конструкции крыши применен сборный железобетонный лоток с уклонами, выполняемыми на стройке из растворной или асфальтовой стяжки.

Кровельный ковер запроектирован из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику.

Телевантенны крепятся хомутами к специальным кронштейнам, приваренным к вентшахтам.

Подводка кабелей к ним осуществляется в стальных трубах $d = 3/4"$.

Толщина утеплителя назначается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в соответствии с таблицей №2

Таблица №2

№№ п.п	Утеплитель	Расч. темпер. наружного воздуха -20°	-30°	-40°
1	Керамзит γ=500 кг/м³	15см	20см	25см
2	Минераловатные плиты γ=150 кг/м³	4см	4см	4см
	Керамзит γ=500 кг/м³	5см	8см	12см

Гл. инженер КБ по железобетону — В. Бонтковский
Гл. конструктор КБ Госстроя РСФСР — А. Фельдман
Гл. архитектор — В. Сергеев
Нач. отдела — Ю. Красковская
Гл. конструктор пр. — П. Афанасьев
АКО-1

Нач. сект. арх. — Р. Гурьева
Нач. сект. конст. — Н. Пух
Ст. архитектор — О. Скобелева
Ст. инженер — Г. Панченкова
Ст. техник — А. Смирнова
Ст. техник — В. Мишина

1971 | Уст. т. блок-секция 1Б.2Б-2Б.3Б/левая/ на 36 квартир | Пояснительная записка | Типовой проект 125-84 | Часть-1 | Лист П.З.-2

11.34-03 5

IV Инженерное оборудование

В проекте предусмотрена взаимная увязка строительных конструкций с прокладкой инженерных коммуникаций, что исключает после монтажа пробивку отверстий и борозд.

Прокладка стояков канализации холодного и горячего водоснабжения осуществляется открытым способом. Проектом предусмотрена прокладка трубопроводов для газа и системы отопления из узкрупненных узлов.

В целях максимальной индустриализации электромонтажных работ в проекте принята система скрытой, сменяемой электропроводки.

При этом используются отверстия панелей перекрытий, а в панелях внутренних стен и перегородок при их изготовлении предусматриваются специальные каналы.

Приборы квартирного учета электроэнергии вынесены на лестничную площадку. Поэтажные щиты электроосвещения и шкафы электрослаботочных устройств изготовляются и комплектуются на заводе или в мастерских и поставляются в готовом виде на монтаж крупнопанельных домов.

Детальное описание инженерного оборудования дома представлено в соответствующих частях проекта.

V Указания по монтажу дома, герметизации, заделке стыков и примыканий.

Монтаж конструкций дома необходимо производить в соответствии с указаниями на листах настоящей части и части 9 „монтажные узлы и детали", а также указаниями СН и П III-В-3-62. Особое внимание необходимо обратить на тщательную разбивку осей здания, на качество выполнения замоноличиваемых узлов наружных и внутренних стен, сварных соединений и их антикоррозийную защиту, а также на качество заделки и герметизации стыков.

Монтаж стеновых панелей каждого вышележащего этажа здания может производиться только после выполнения всех сварных соединений и антикоррозийной их защиты, заполнения всех горизонтальных и вертикальных швов раствором и другими прокладками, замоноличивания всех стыков бетоном, снятия кондукторов и других временных связей и приемку этих работ.

NN п/п	Наименование отклонений	Величина допускаемых отклонений в мм
1	Смещение осей фундаментных блоков относительно разбивочных осей	±10
2	Смещение осей панелей стен и перегородок в нижнем сечении относительно разбивочных осей	±4
3	Отклонение плоскостей панелей стен и перегородок от вертикали (в среднем сечении)	±5
4	Разница в отметках опорных поверхностей панелей стен и перегородок в пределах выверенного участка (блока)	10
5	Разница в отметках верхней поверхности элементов перекрытий в пределах выверенного участка.	20
6	Разница в отметках нижней поверхности двух смежных элементов перекрытий.	4
7	Разница в отметках верхней поверхности двух смежных элементов перекрытий.	8

Замоноличивание узлов должно выполняться в соответствии с действующими указаниями: а) „временными указаниями по замоноличиванию, герметизации и утеплению стыков в крупнопанельных зданиях", б) временными указаниями по антикоррозийной защите стальных закладных деталей и сварных соединений в крупнопанельных зданиях СН-206-62 (второе издание), в) МРТУ „Стыки наружных стен крупнопанельных зданий. Технические требования к воздухо-водо и теплозащитным качествам". Конструкция замоноличиваемых стыков решена на петлевых выпусках из наружных и внутренних стеновых панелей с последующим соединением скобами и заделкой бетоном „М-200", изготовленном на заполнителе фракций не более 10-15 мм. Скобы, применяемые в замоноличенном стыке, подвергаются металлизации в соответствии с СН 206-62. Такая конструкция стыка обеспечивает надежную защиту связей от коррозии. Технический контроль за качеством работ по заделке стыков ведется непрерывно в процессе монтажа здания. Выполненные работы фиксируются актами на скрытые работы. Порядок производства работ по устройству герметизации стыков наружных стен, а также рекомендуемые типы герметиков даются в части 9 лист 1 и 2.

Связь между внутренними конструкциями дома (панели перекрытий, внутренние стены) осуществляются при помощи монтажных стальных связей, приваривающихся к закладным деталям панелей. Монтажная сварка должна производиться качественными электродами, причем для сварки арматурной стали класса А I и прокатной стали применяются электроды типа Э-42, арматурной стали класса А II и прокатной стали применяются электроды типа Э-42 и стали А III - электроды Э-50А.

Сварку должен производить дипломированный сварщик. Сварные соединения должны приниматься поэтажно специальным контролером с составлением соответствующего акта.

Сечение соединительных связей, а также и толщина сварных швов должна строго соответствовать проекту.

Защиту от коррозии стальных элементов и закладных деталей производить в соответствии с СН 206-62 (второе издание). Скобы применяемые в замоноличенных стыках, должны иметь антикоррозийное покрытие, выполненное способом металлизации цинком.

Стальные элементы и связи, не примыкающие к наружным стенам, имеют антикоррозийную защиту только из цементного раствора состава 1:1,5 при толщине слоя не менее 20 мм.

Герметизация примыканий оконных блоков, балконных дверей и межоконных вставок к панелям наружных стен выполняются герметиками в соответствии с листами АСД части 9.

VI Мусоропровод

Проект мусоропровода разработан в соответствии с инструкцией по проектированию мусоропроводов в жилых и общественных зданиях и на основе типового проекта мусоропровода НМ-41, выпущенного Моспроектом 1. Мусоропровод запроектирован в лифтовом холле с размещением загрузочных клапанов на каждом этаже.

Мусоросборная камера принята на первом этаже. Мусоропровод состоит из следующих основных элементов:

1. Мусоросборной камеры, стены которой облицовываются глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, выше - масляная покраска, полы - керамическая плитка. Пол имеет уклон к трапу. В мусоросборной камере предусмотрено устройство водопровода со шлангом для промывки бункера и переносных мусоросборников, а также для мытья пола камеры и тушения пожара в случае загорания мусора. В камере имеется электрическое освещение. Температура в камере должна быть не ниже + 5°С.

2. Опорной металлической рамы под ствол мусоропровода устанавливаемой непосредственно

1971	9эт т блок-секция 1б.2б.2б.3б/левая/ на 36 квартир	Пояснительная записка	Типовой проект 125-04	Часть I	Лист ПЗ-3

КБ по железобетону Госстроя РСФСР АКО-1

Гл инженер КБ	В Болтинский	Гл архит пр-та	Г. Паченцева	Исполнитель	В Мишина
Гл конструк КБ	Я Фельман	Нач сект конст	А Смирнова		
Гл архитект	В Сергеев	Нач сект архит	Р Гурьева		
Нач отдела	Ю Красновидов	Вед конструк	И Пух		
Гл констр пр-та	П Афанасьев	Ст архитек	О Скобелева	Проверил	

на пол мусоросборной камеры.

Опорная рама рассчитана на восприятие всей нагрузки от ствола мусоропровода

3. Ствола мусоропровода, собираемого из асбестоцементных водопроводных труб марки ВТ-6 с внутренним диаметром 368 мм и надвижных асбестоцементных муфт для соединения труб ствола мусоропровода по ГОСТ 539-65. Зазоры между муфтами и стволом заделываются пеньковой просмоленной паклей и зачеканиваются цементным раствором.

Отверстия в асбестоцементных трубах для установки приемных клапанов вырубаются или вырезаются точно по шаблону с предварительным рассверливанием контура вырубки

Размер отверстий установлен 300х600 мм по высоте. Низ отверстия располагается на расстоянии 160 мм от отметки чистого пола помещения.

Ствол мусоропровода опирается непосредственно на металлическую опорную раму без передачи нагрузки на плиты перекрытия. Монтаж асбестоцементных труб желательно выполнять по ходу монтажа здания. Места примыкания ствола к перекрытию замоноличиваются.

4. Металлического приемного бункера, емкостью 0,5 м³. В конструкции приемного бункера предусмотрена дверка для выгрузки мусора в мусоросборники и шибер для перекрывания ствола во время выгрузки мусора. Об'ем бункера составляет 120% объема накапливающегося в сутки мусора. Принятая в проекте конструкция опорной рамы дает возможность производить установку и ремонт приемного бункера при смонтированном стволе мусоропровода.

5. Приемных клапанов для загрузки мусора. Приемный клапан состоит из короба, укрепляемого на стволе с помощью 2 хомутов на болтах; на коробе шарнирно расположен опрокидной ковш с резиновыми уплотнителями.

Прочистка мусоропроводов осуществляется через отверстия в стволе при снятых клапанах.

6. Вентиляционной трубы с внутренним диаметром 291 мм по ГОСТ 1839-48 „Трубы асбестоцементные для безнапорных трубопроводов.

7. Фланца переходного, металлического – для соединения ствола мусоропровода с вентиляционной трубой.

8. Фланца для насадки стандартного дефлектора на вентиляционную трубу.

9. Дефлектора марки Т 27 по типовым чертежам альбома „4904-12" ЦИТП.

Стальные элементы мусоропровода окрашиваются антикоррозийной краской.

Альбом типового проекта мусоропровода НМ-41 является приложением к данному альбому.

VII Лифт

В здании предусмотрены 6 пассажирских лифтов грузоподъемностью 350 кг каждый с противовесом сзади и верхним машинным отделением. Входы в лифт размещаются на уровне каждого этажа, причем, месторасположение лифтовой шахты назначено из условия максимально возможного ее удаления от квартир.

Машинные отделения расположены в пределах 9-го этажа и не выступают над крышей.

Размеры лифтовой шахты 1700х1550 приняты в соответствии с заданием на проектирование строительной части лифтов.

Стены лифтовой шахты приняты из объемного железобетонного блока.

Стены машинного отделения лифта приняты из кирпичной стенки толщиной 120 мм с устройством звукоизолирующего слоя (см. часть 10)

Заливка чистого пола на 50 мм в машинном отделении и приямке производится при монтаже лифта после установки оборудования и прокладки труб электропроводки.

VIII Мероприятия по обеспечению звукоизоляции

Соблюдение нормативных величин показателей звукоизоляции согласно СНиП II-В-6-62 обеспечивают в проекте следующие мероприятия.

1. Раздельная конструкция перекрытий и применяемые в соответствии с таблицей №3 звукоизолирующие прокладки между плитой перекрытия и конструкций пола.

2. Заделка мест прохода сантехнических трубопроводов через перекрытие выполняется в соответствии с деталью на листе 32 части 9 раздела 9-2.

3. Тщательная заделка швов между перекрытиями.

4. Принятая в проекте толщина внутренних стен-160 мм (может быть -150 мм)

5. Выполнение сопряжений внутренних стеновых панелей в соответствии с деталью на листе 13-16 части 9 раздела 9-2.

6. Тщательная заделка звукоизолирующими материалами сквозных отверстий во внутренних межквартирных стенах под ответвительные коробки электросети (см. часть 5 лист Э-10) и исполнение примыканий полов к внутренним стенам в соответствие с деталями, данными в части 9 раздела 9-2 (лист 32)

Характеристика материалов для упругих прокладок

N N п/п	Материал	Минимальная толщина прокладок в необжатом состоян. в мм	Объемный вес кг/м³
1	Маты минераловатные на синтетической связке ГОСТ	30	100-150
2	Плиты минераловатные и стекловатные на синтетической связке ГОСТ	40	100-150
3	Древесно-волокнистые изоляционно-отделочные плиты ГОСТ	25	200-250

IX Указания по производству работ в зимнее время

Производство работ в зимних условиях должно отвечать следующим требованиям:

1. Разработка котлованов и траншей должна осуществляться с применением мероприятий в промерзания грунта в основании фундаментов (при варианте с ленточными фундаментами).

2. Разработка грунта при кратковременных перерывах между окончанием земляных работ и монтажом фундаментных блоков должна производиться непосредственно перед закладкой фундаментов.

3. Кладка фундаментов на замерзшее основание допускается только для непучинистых грунтов. При пучинистых грунтах монтаж фундаментных блоков разрешается производить только на талое основание с защитой его от промерзания, как во время, так и после окончания работ.

4. Раствор, применяемый в качестве выравнивающего слоя по верху фундаментов должен иметь марку не ниже „100".

5. Для предупреждения образования наледей на гранях панелей целесообразно накрывать панели на складе брезентом. Перед укладкой бетона рекомендуется стыкуемые поверхности панелей прогреть пламенем горелки или горячим воздухом, используя для этого передвижные газовые агрегаты.

1971	9эт. т. блок-секция 15.25.25.3½ левая/ на 36 квартир	Пояснительная записка	Типовой проект 125-04	Часть I	Лист А.З.-4

КБ по железобетону Госстроя РСФСР АКО-1

11734-03 7

6. Растворы и бетоны, идущие для заполнения стыков и швов, приготовлять на портландцементах марки не ниже „400" температура раствора и бетона в момент их укладки в конструкции должна быть не ниже:

+20°С при температуре воздуха до -10°С

+25°С при температуре воздуха от -10°С до -20°С

+30°С при температуре воздуха ниже -20°С

7. Бетон для замоноличивания стыков в раствор должны вводиться противоморозные добавки поташа и нитрита натрия. Величина добавок принимается по следующей таблице в зависимости от температуры наружного воздуха.

Средняя температура наружного воздуха	Величина добавки в % от веса цемента в расчете на твердую соль
до -5° добавка	поташа 5
от -5° до -15°	10
от -15° до -30°	15
до -5° добавка нитрита натрия	5
от -5° до -10°	10

8. Марки бетонов и растворов, применяемые для заполнения стыков, повысить на одну ступень против применяемых для летних условий производства работ.

9. Антикоррозийное покрытие закладных и монтажных металлических соединений производить в зимних условиях по аналогии с летними в соответствии со СН-206-62.

X Указания по привязке проекта.

1. Рабочие чертежи должны быть откорректированы применительно к выбранному варианту толщины наружных стен, цокольных панелей, варианта панелей перекрытий и внутренних стеновых панелей.

2. При привязке необходимо использовать указания, приведенные в соответствующих разделах пояснительной записки.

Условные обозначения:

⊖ Номер детали на листе

Раздел 9.6 или номер листа раздела 9-1 „Типовые секции, архит. решения деталей".

⊖ Номер детали на листе

Номер листа раздела 9-2 „Монтажные узлы и детали".

Авторский коллектив (по алфавиту)

Архитекторы: Р. Гурьева, Г. Пачинцева

Инженеры: П. Афанасьев, И. Пух, А. Смирнова. Я. Фельман, А. Якушев.

Инженеры-сантехники: В. Кучеровский, Э. Безыменская, Г. Сошникова, Р. Сараева, И. Федькович, А. Панфилов, Е. Павлов

Инженеры-электрики: Ф. Звездин, М. Скрынченко.

При участии: А. Есин, О. Скобелева, И. Кольцова, И. Шашурина, И. Панков.

1971	9 эт. т. блок-секция 1 б. 2 б. 2 б. 3 б/левая/ на 36 квартир	Пояснительная записка	Типовой проект 125-04	Часть I	Лист П.3.-5

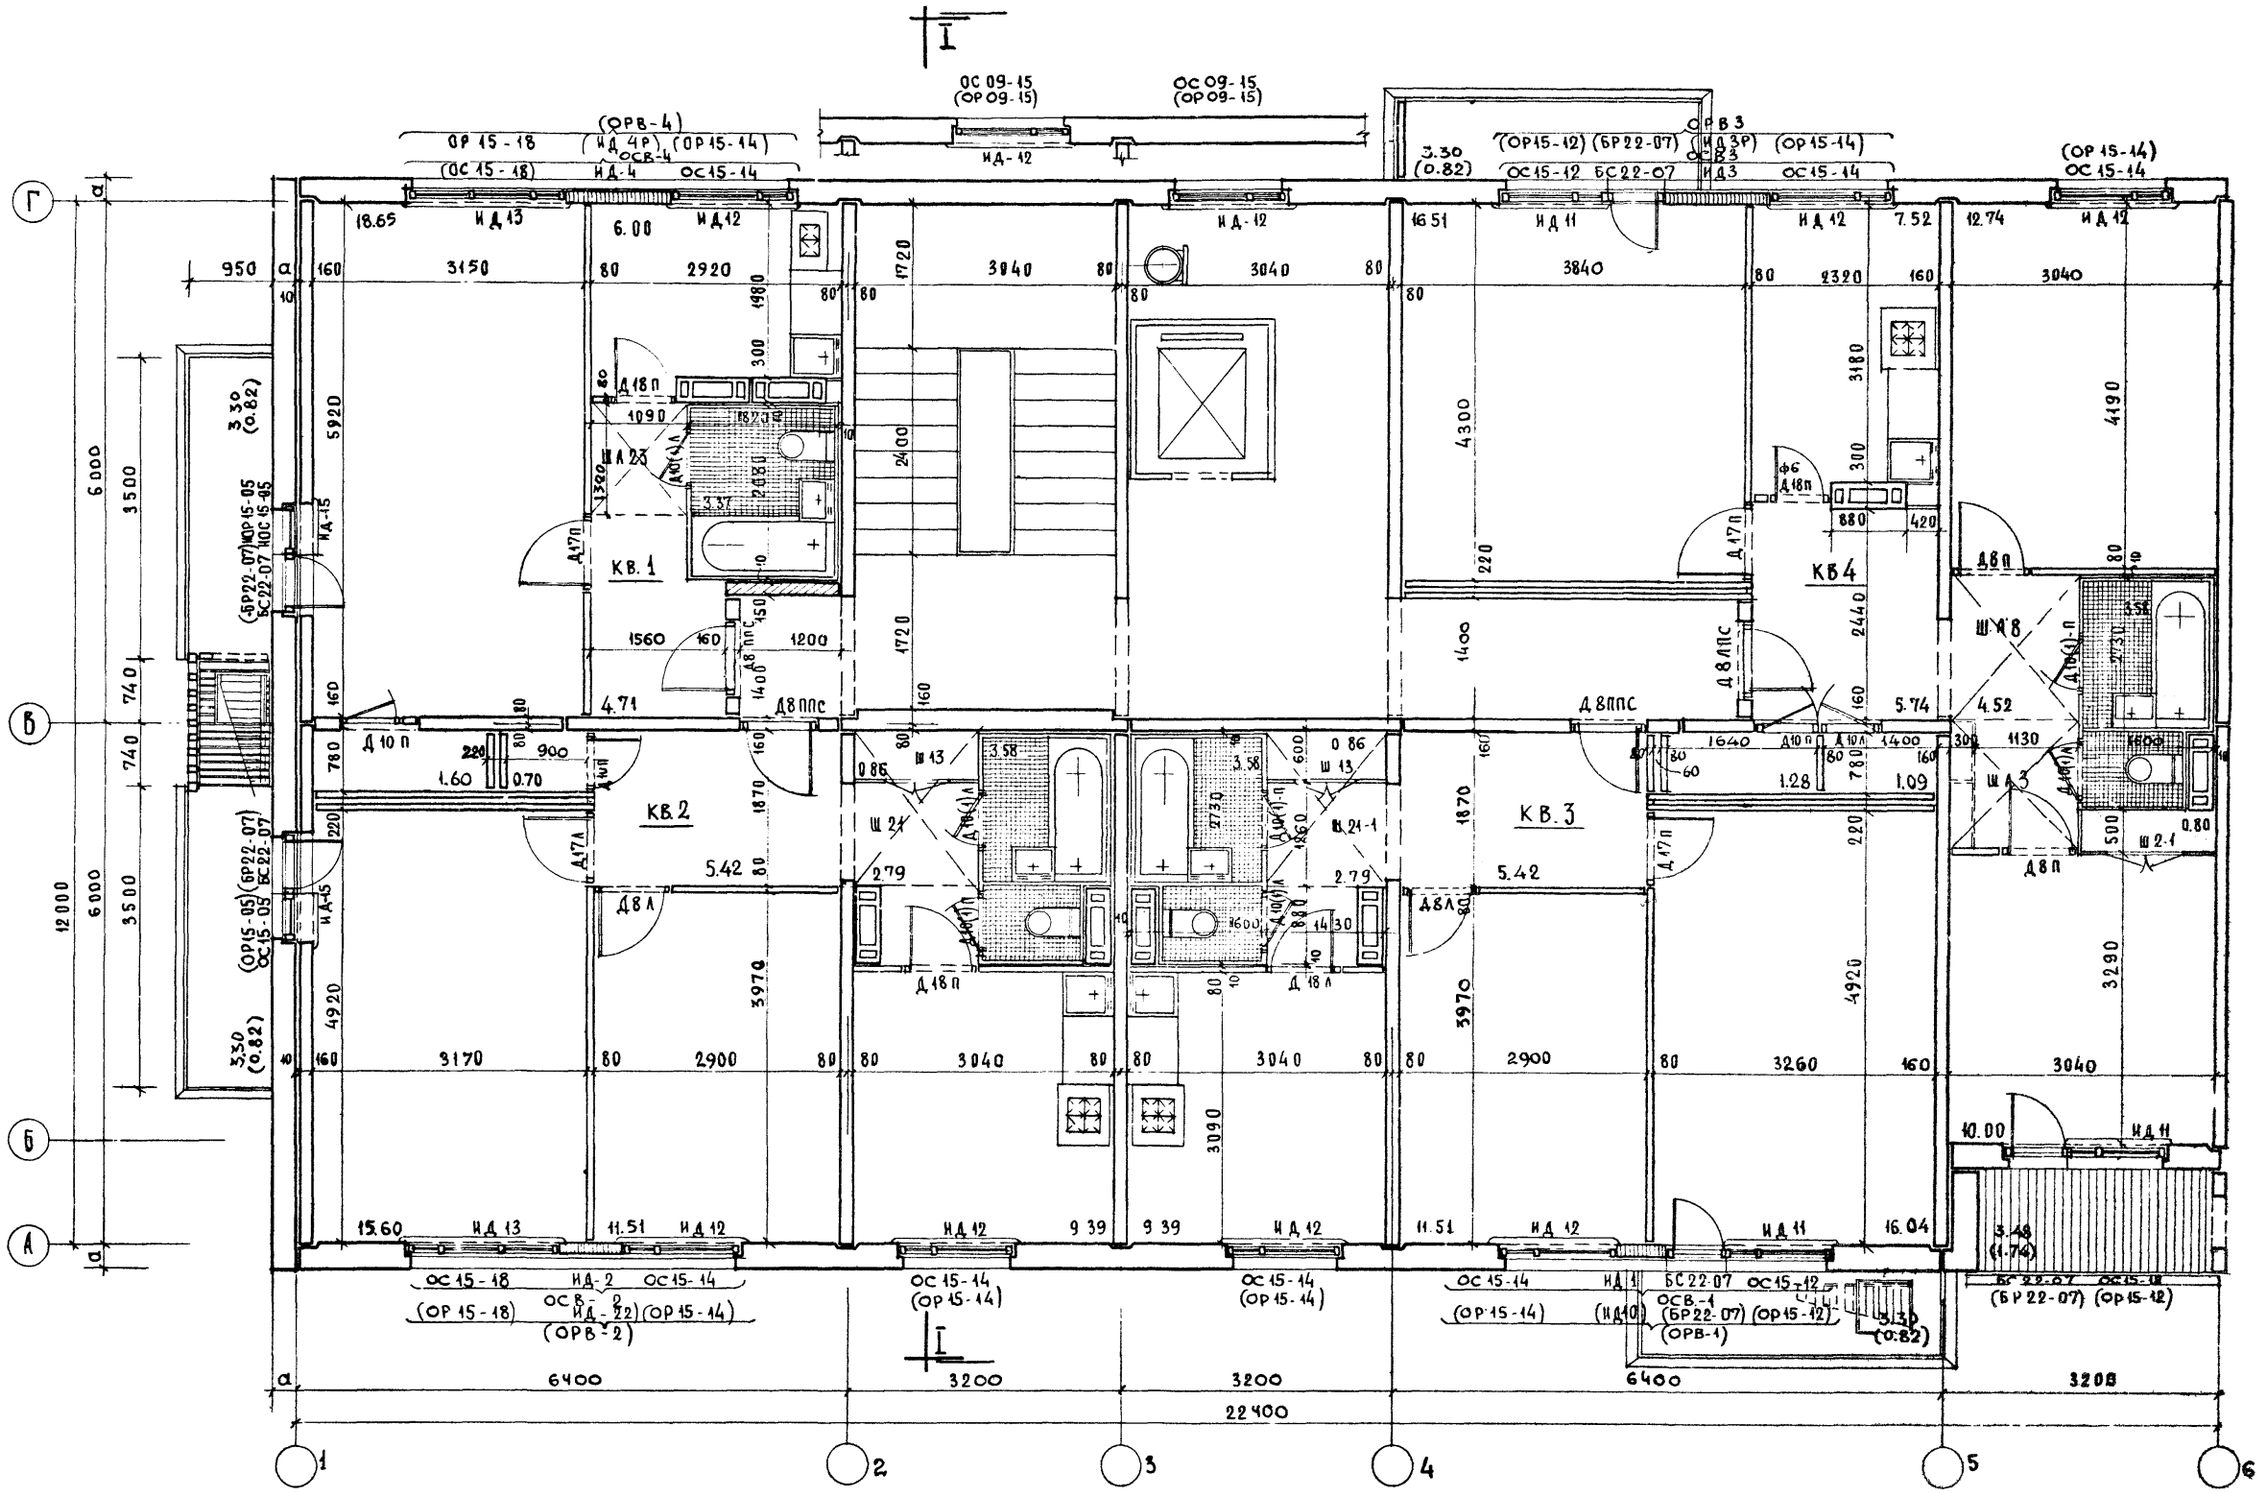

ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ Госстроя РСФСР

АКО-1

ГИП	Г. ПАЧЕНЦЕВА	
ГА. ИНЖЕН. КБ	А. БОЛТИНСКИЙ	ГА. АРХИ- ПР-ТА
ГА. КОНСТР. КБ	А. СМИРНОВА	НАЧ. СЕКТ. КОНСТР.
ГА. АРХИТ.	Р. ГУРЬЕВА	НАЧ. СЕКТ. АРХИТ.
НАЧ. ОТДЕЛА	И. ПУХ	ВЕД. КОНСТРУКТ.
ГА. КОНСТР. ПРТА	О. СКОБЕЛЕВА	ПРОВЕРИЛ
	А. ФЕЛЬМАН	НАЧ. СЕКТ. АРХИТ.
	В. СЕРГЕЕВ	ВЕД. КОНСТРУКТ.
	Ю. КРАСНОВИДОВ	СТ. АРХИТЕКТ.
	П. АФАНАСЬЕВ	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЛОК-СЕКЦИИ

NN п/п.	Характеристика	Количество				
		КВ. 1	КВ. 2	КВ. 3	КВ. 4	НА СЕКЦИИ
1	ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ	18.65	27.11	27.55	39.25	112.56
2	ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ	34.33	49.88	49.59	63.78	197.58

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СМ. ЛИСТ АС-2

1971	9 ЭТ. Т. БЛОК-СЕКЦИЯ 1Б. 2Б. 2Б. 3Б/ЛЕВАЯ/ НА 36 КВАРТИР.	ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-04	ЧАСТЬ-1 / ЛИСТ АС-1

11.34.03 9

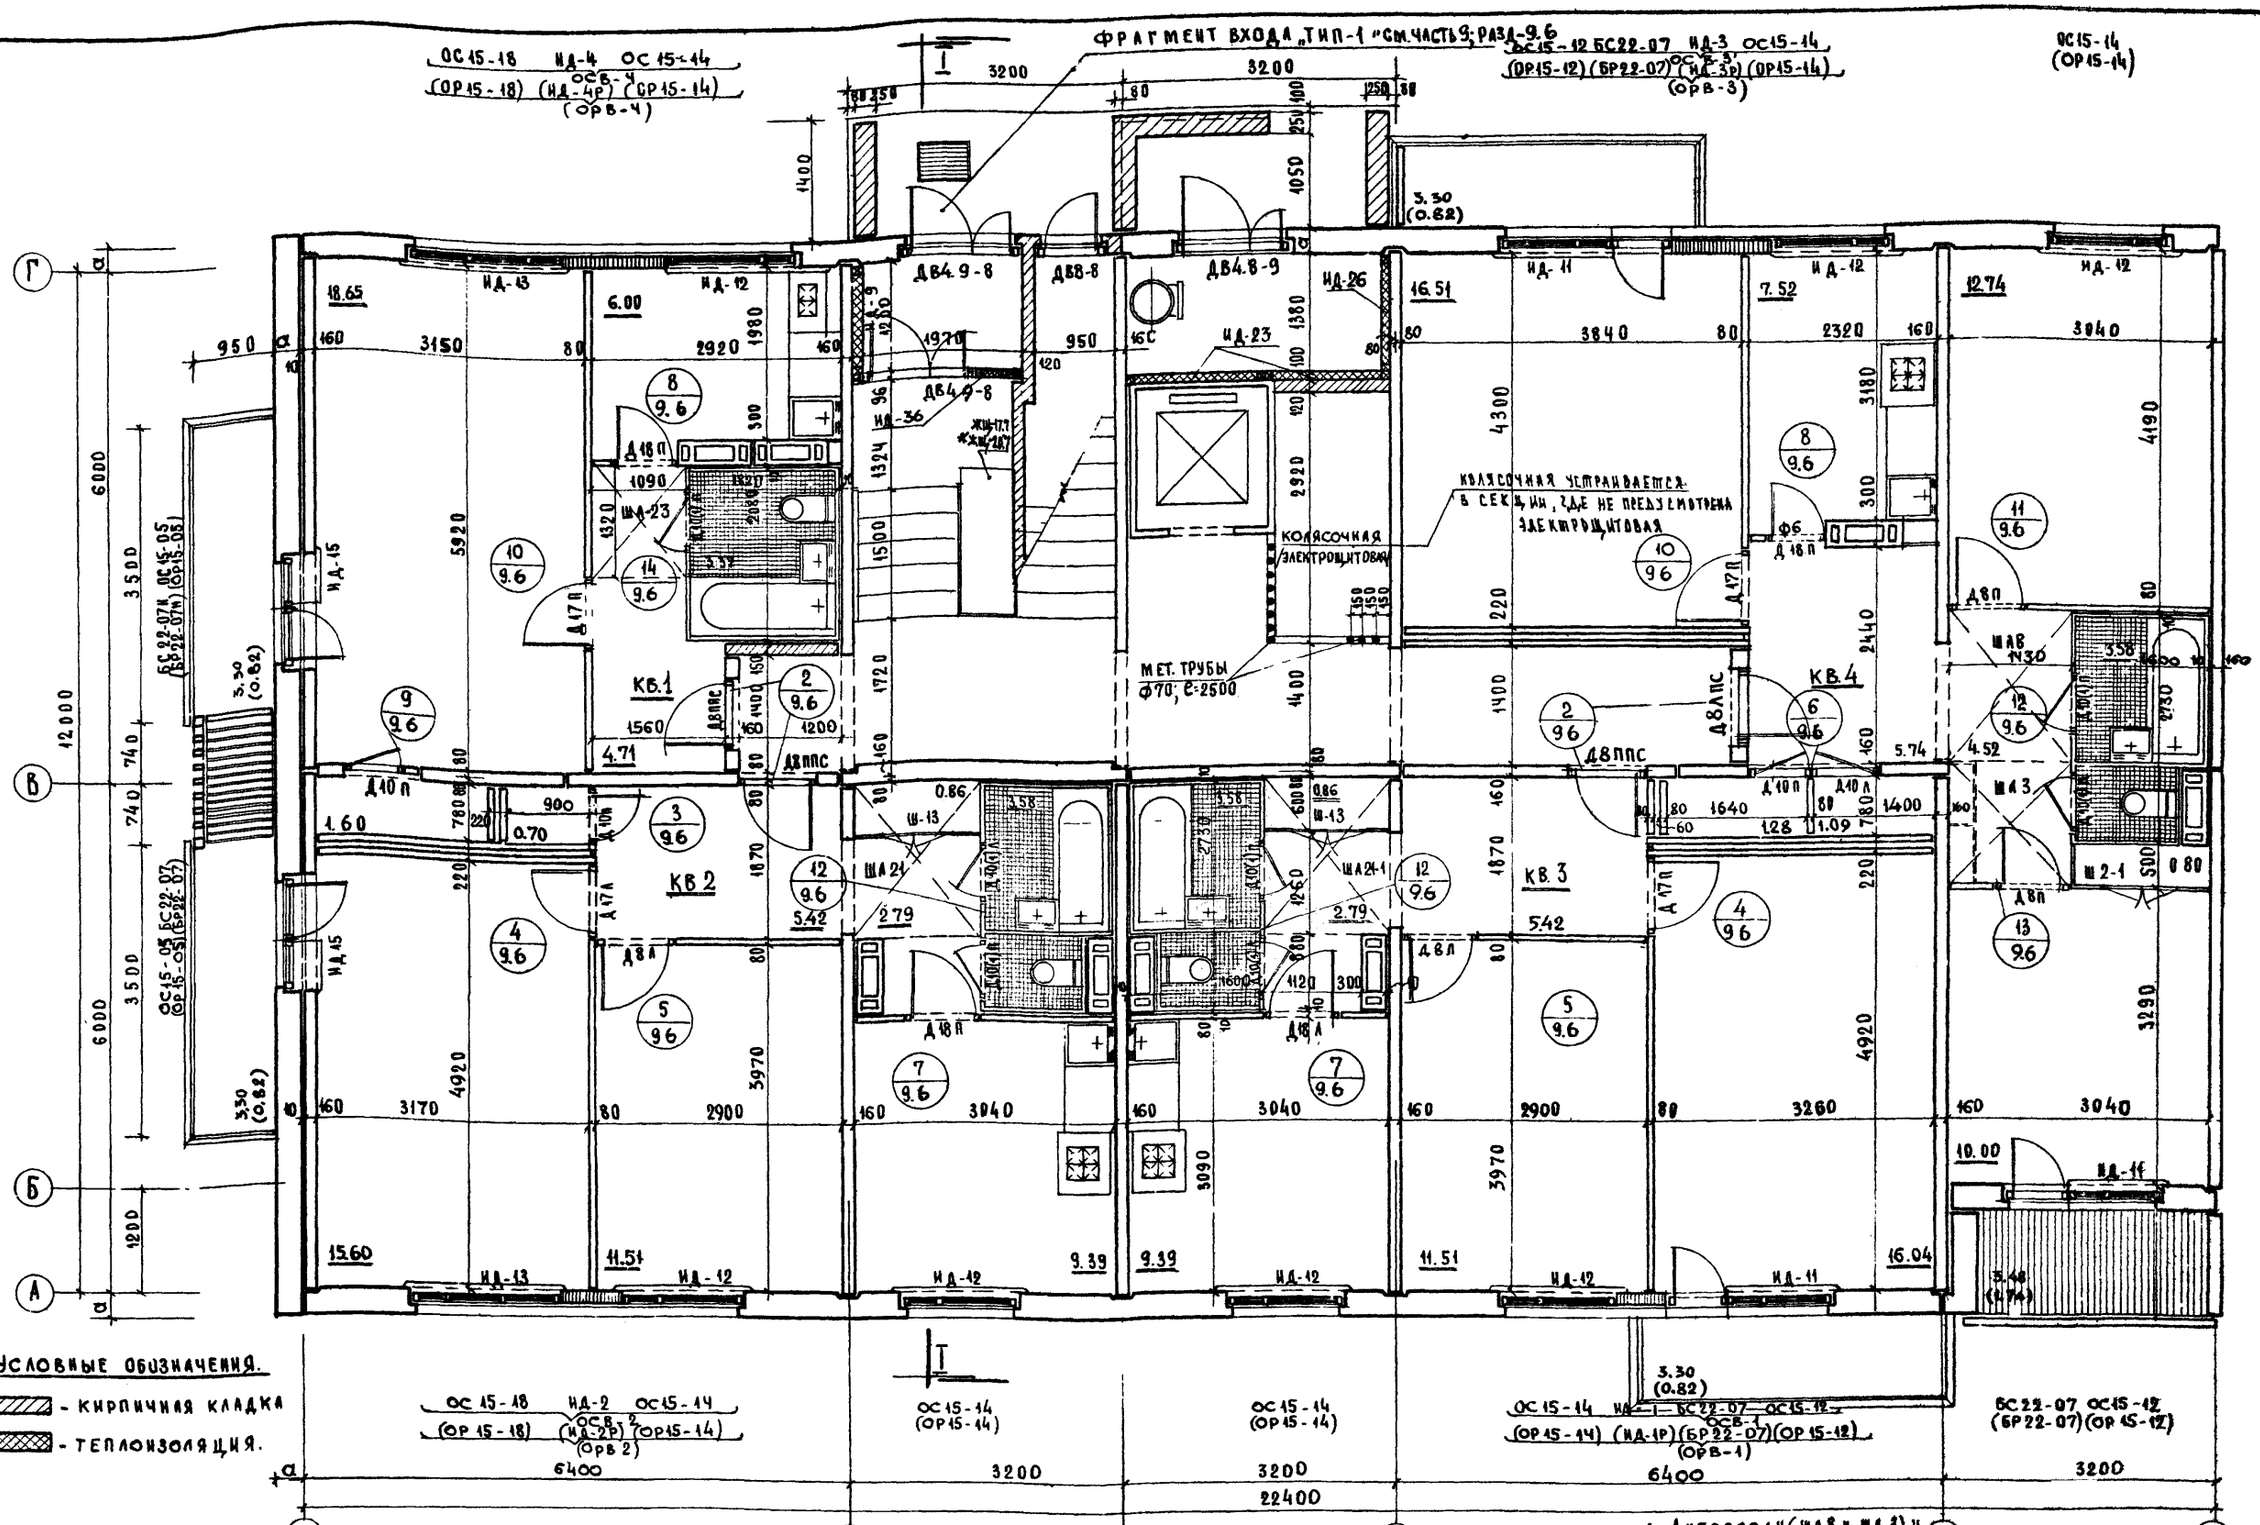

Условные обозначения.

- кирпичная кладка
- теплоизоляция.

Примечания:

1. По балконам и лоджиям в скобках показана площадь летних помещений с соответствующим понижающим коэф.
2. „α" - толщина наружной стены.
3. Пунктиром показаны шкафы установка которых по заказу квартиросъемщика при привязке.
4. Антресоли (ША-8 и ША-3) и шкаф Ш-2-1 см. часть 9; РАЗД. 9.6
5. Узлы установки столярных блоков см. часть 9; РАЗД. 9.6
6. Щиты наружн. входа ИД9÷ИД-40; оконные блоки со вставками и подоконные доски см. ч. 10.6-1
7. Антресоли (ША-20-1÷ША-23) и шкафы (Ш-12-4; Ш-13) см. часть 9; РАЗД. 9.6
8. Спецификацию деревянных изделий см. листы 17.16 17

Показатели по блок-секции

№ п/п	Характеристика	Количество				На 9 этажей.		
		КВ.1	КВ.2	КВ.3	КВ.4	На сек.	На бл-сек.	На бл-сек. с коэф.
1	Жилая площадь	18.65	27.11	27.55	39.25	112.56	1013.04	7048.09
2	Полезная площадь	34.33	49.88	49.59	63.78	197.58	1778.22	1823.40

Столбцов

1971

9 эт. Т. блок-секция 1Б.2Б-2Б.3Б/левая/ на 36 квартир.

План первого этажа.

Типовой проект 125-04 | Часть-1 | Лист АС-2

11734-03 10

АКО-1

Госстрой СССР | ГИ Железобетонный каркас | ГИ Конструкции | ГИ Архит. | Нач. отдела | ГИ Констр. пр.

Печенев | Семенова | Гурьева | Пух | Скобелева

Главный инженер проекта | Гл. архитектор | Гл. конструктор | Нач. сект. арх. | Нач. сект. констр. | Ведущий констр. | Ст. архитектор

Фельман | Сергеев | Красновидов | Афанасьев



1971	9 эт. т. блок-секция 1б.2б.2б.3б/левая/ на 36 квартир	фасады в осях „1-6" и „6-1" фрагмент фасада при варианте стен из ячеистого бетона.	Типовой проект 125-04	часть 1	лист АС-3

Г. Паченцева, Исполнитель
А. Смирнова
Н. Гурьева
И. Пух
О. Скобелева
Проверил

Гл. архит. пр.
Нач. сект. конс.
Нач. сект. архит.
Вед. конструк.
Ст. архитект.

В. Болтинский
Я. Фельман
В. Сергеев
Ю. Красновидов
П. Афанасьев

Гл. инжен. КБ
Гл. констр. КБ
Гл. архитект
Нач. отдела
Гл. констр. пр.

КБ по железобетону Госстроя РСФСР

АКО-1

11734-03 11

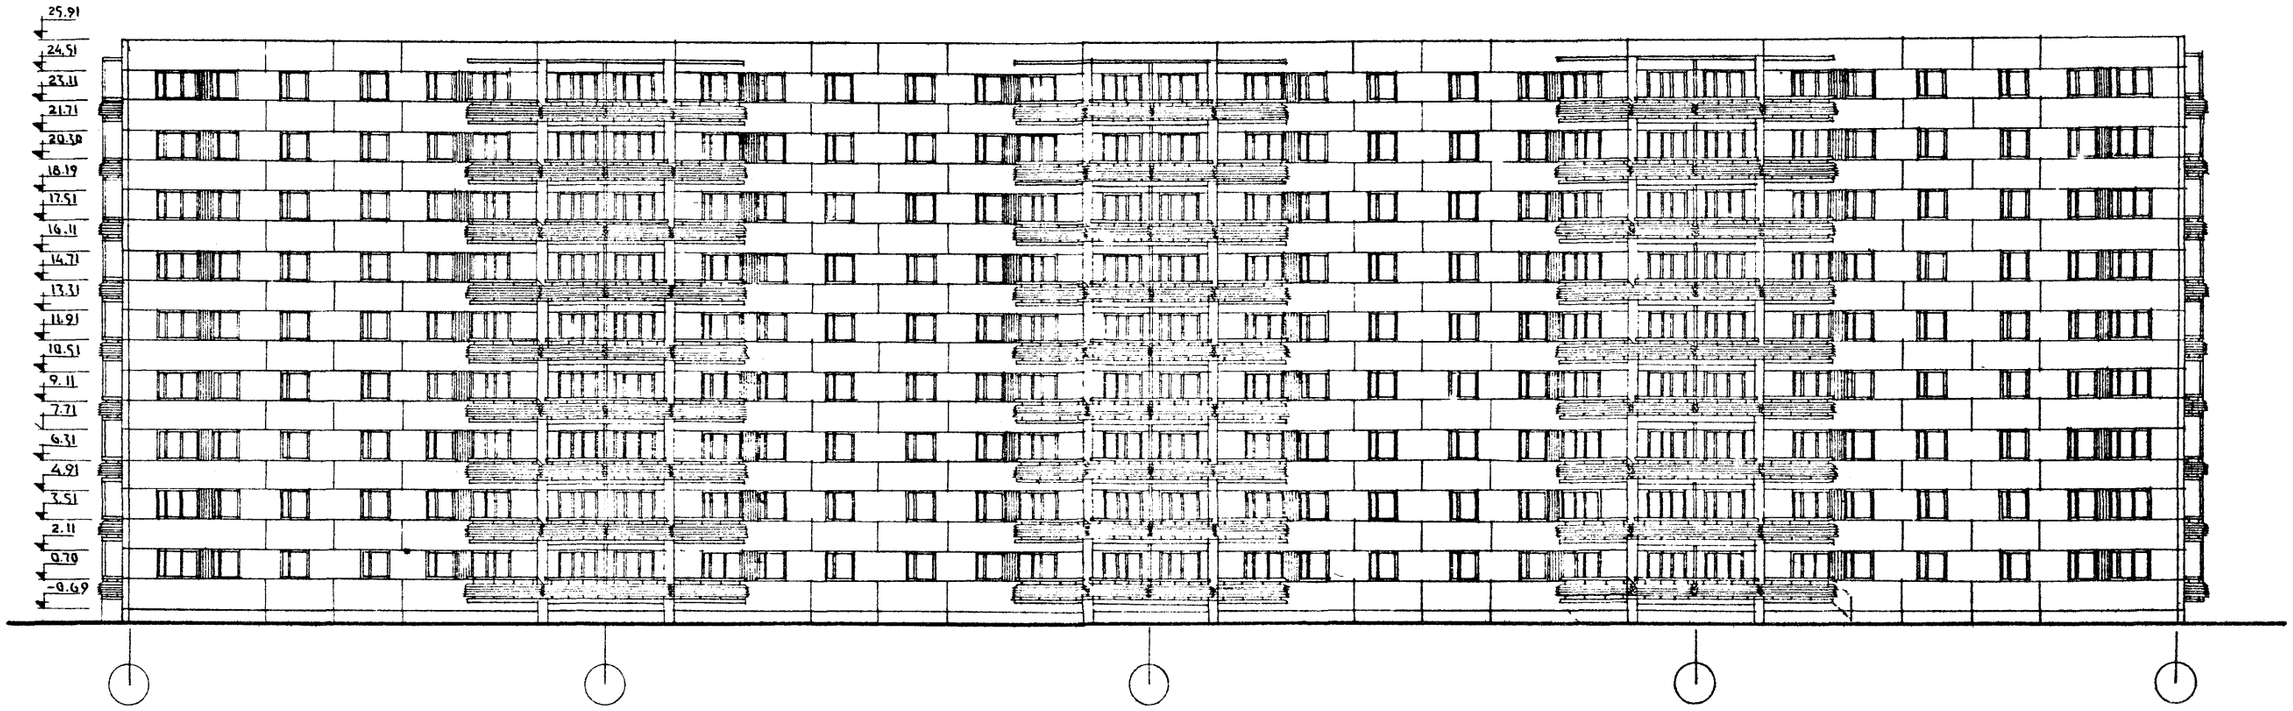

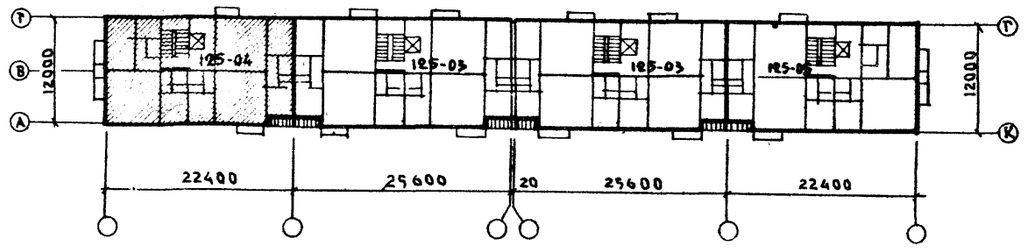

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Пример компоновки жилого дома, составленного из блок-секций: $1^{б}\cdot2^{б}\cdot2^{б}\cdot3^{б}$-Т (№125-04) левая $2^{б}\cdot2^{б}\cdot3^{б}\cdot3^{б}$-Р (№125-03) и $1^{б}\cdot2^{б}\cdot2^{б}\cdot3^{б}$-Т (№125-05) правая
2. Заштрихована блок-секция, на которую составлен настоящий альбом
3. Вариант установки лифта с остановкой в уровне 8-го этажа.

1971	9 эт. т. блок-секция $1^{б}\cdot2^{б}\cdot2^{б}\cdot3^{б}$-левая на 36 квартир	Пример компоновки блок-секций Главный фасад и схема плана типового этажа	Типовой проект 125-04	Часть-1	Лист АС-4

КБ по железобетону Госстроя РСФСР

АКО-1

Гл. инжен. КБ; Гл. констр. КБ; Гл. архитек.; Нач. отдела; Гл. конст. п-та

В. Волтинский; Я. Фельман; В. Сергеев; Ю. Красновидов; П. Афанасьев

Гл. архит. пр-та; Нач. сек. констр.; Нач. сект. архит.; Ст. архитектор; Исполнитель

Т. Паченцева; А. Смирнова; Р. Гурьева; П. Скобелева; В. Мищина

Проверил

11734-03 12



1971	9 эт. тор. блок-секция 1б-2б-2б-3б левая на 36 квартир	Пример компоновки блок-секций фасад со стороны входов	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-5

Госстроя РСФСР

АКО-1

Гл. архитект. пр.	Нач. сект. конст.	Нач. сект. архит.	Ст. архитектор
Ф. Фельман	В. Сергеев	Ю. Красновидов	П. Афанасьев
Гл. конструкт. КБ	Гл. архитект.	Нач. отдела	Гл. констр. пр.
Л. Ваченцева	Р. Гурьева	О. Скобелева	В. Мишина

11134-03 13

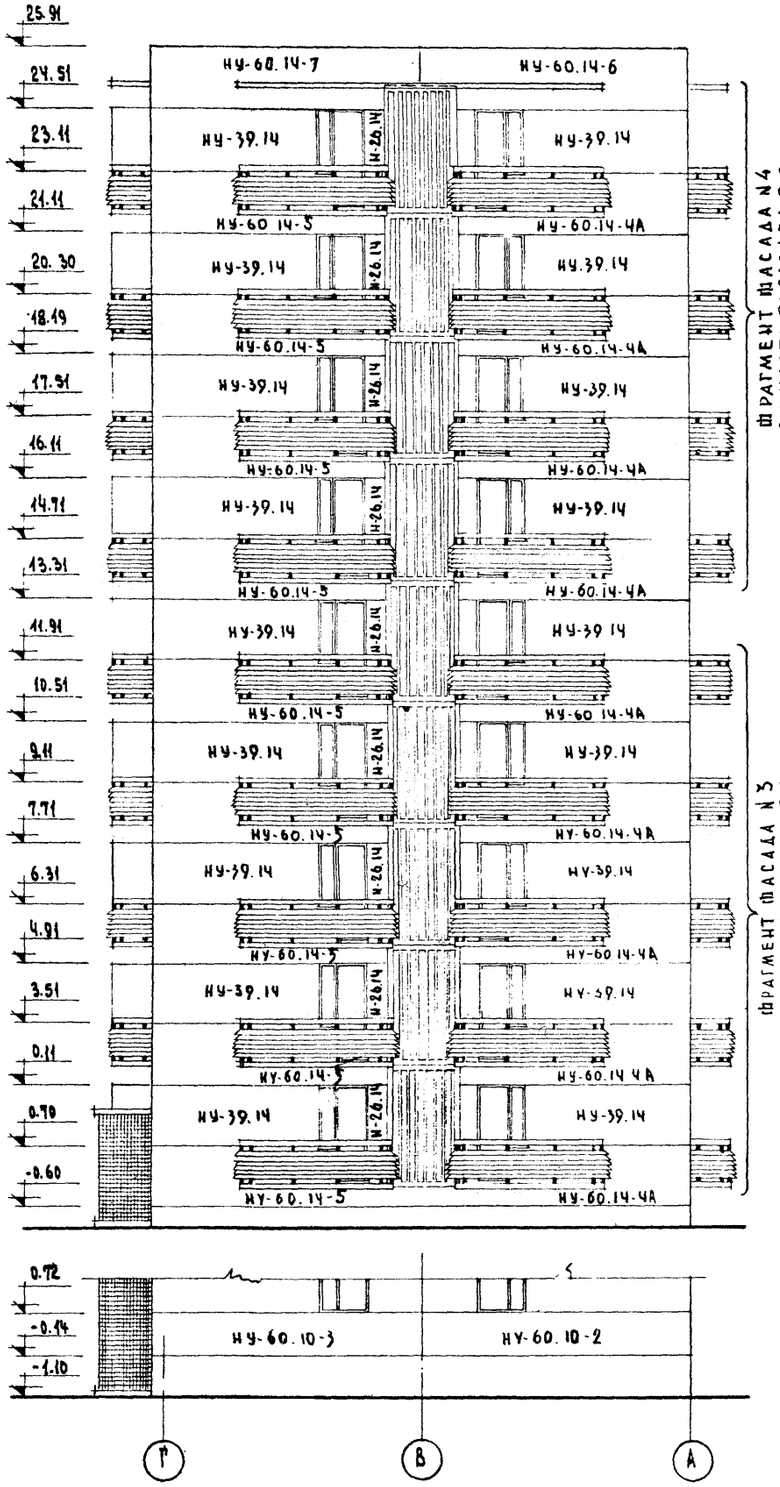

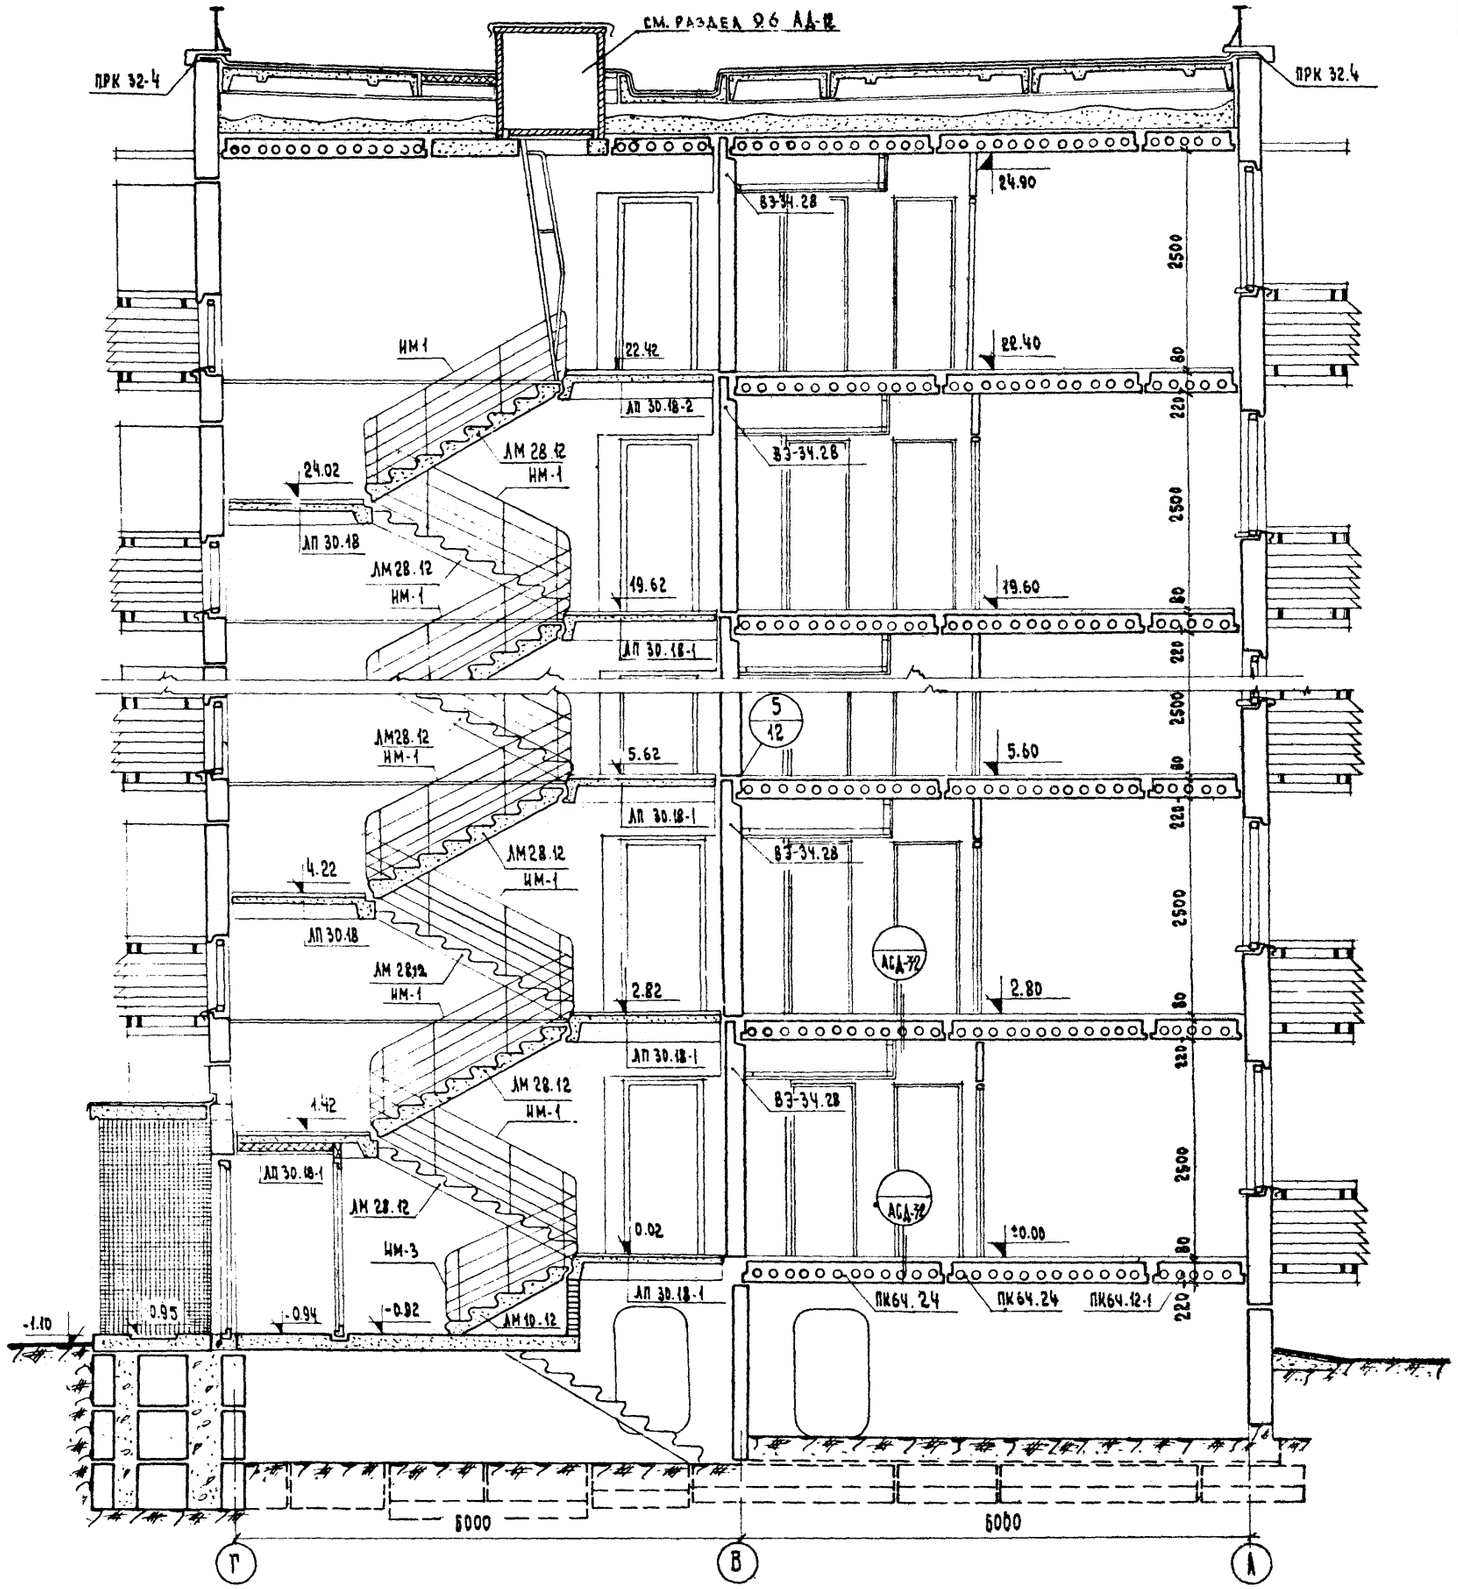

Примечания:
1. Общие примечания см. лист АС2
2. Узлы и детали полов см. часть 9; раздел 9-2

1971	9 эт. т. блок-секция 1б.2б.2б.3б /левая/ на 36 квартир	Фасад в осях „Г-А" и разрез I-I	Типовой проект 125-04	Часть-1	Лист АС-6

Кб по железобетону Госстроя РСФСР
АКО-1

Гл. инженер КБ	В. Болтинский	Гл. архит. пр-та	Г. Пачинцева
Гл. констр. КБ	Я. Фельман	Нач. сект. констр.	А. Смирнова
Гл. архитект	В. Сергеев	Нач. сект. архит.	Р. Гурьева
Нач. отдела	Ю. Красновидов	Вед. констр.	И. Пух
Гл. констр. пр-та	П. Афанасьев	Ст. архитект.	О. Скобелева

Проверил

11734-03 14

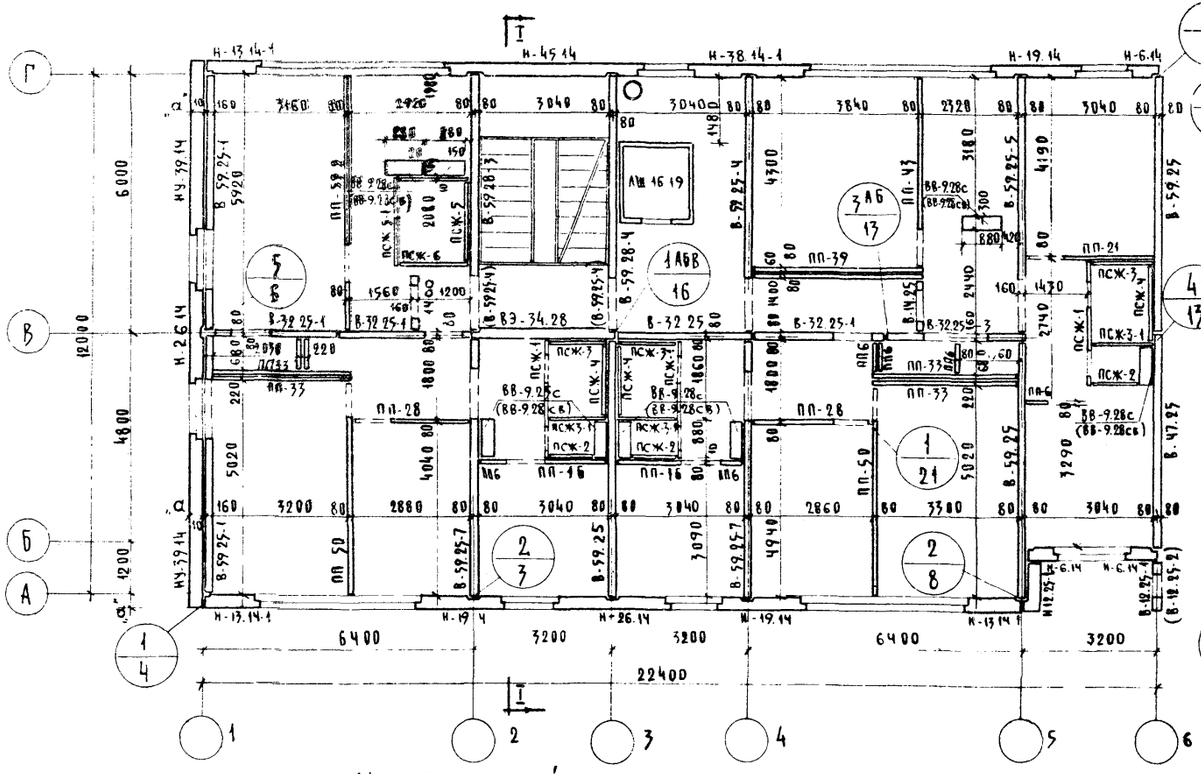

Монтажный план типового этажа

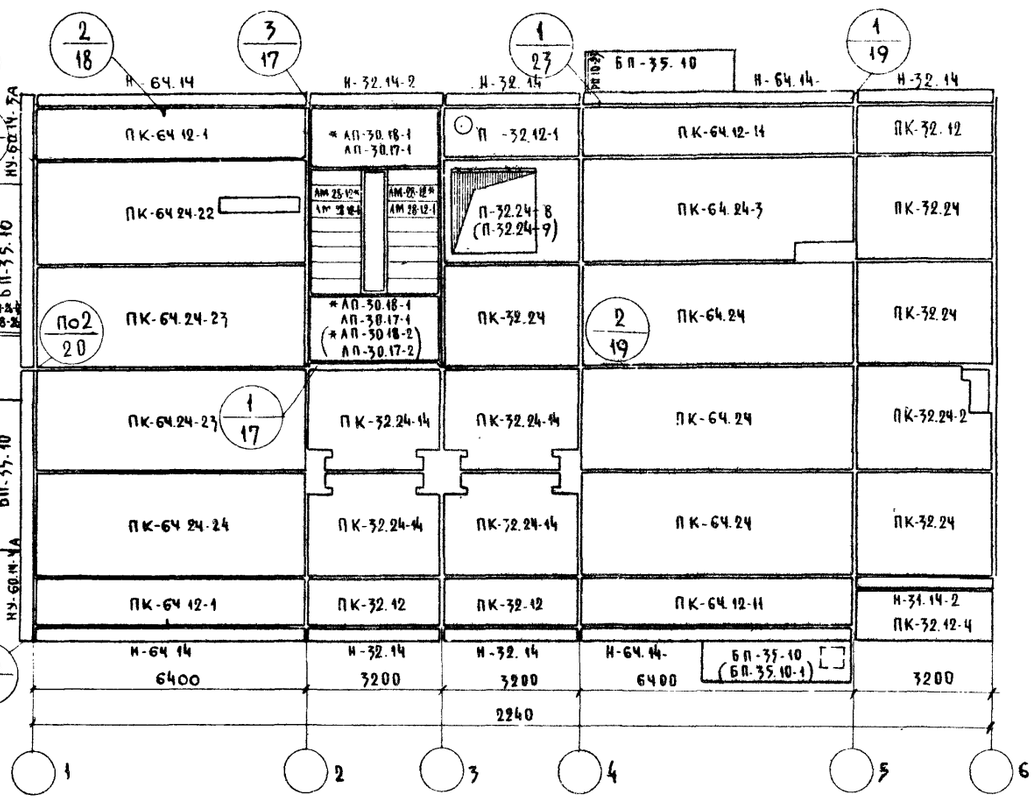

План междуэтажного перекрытия.

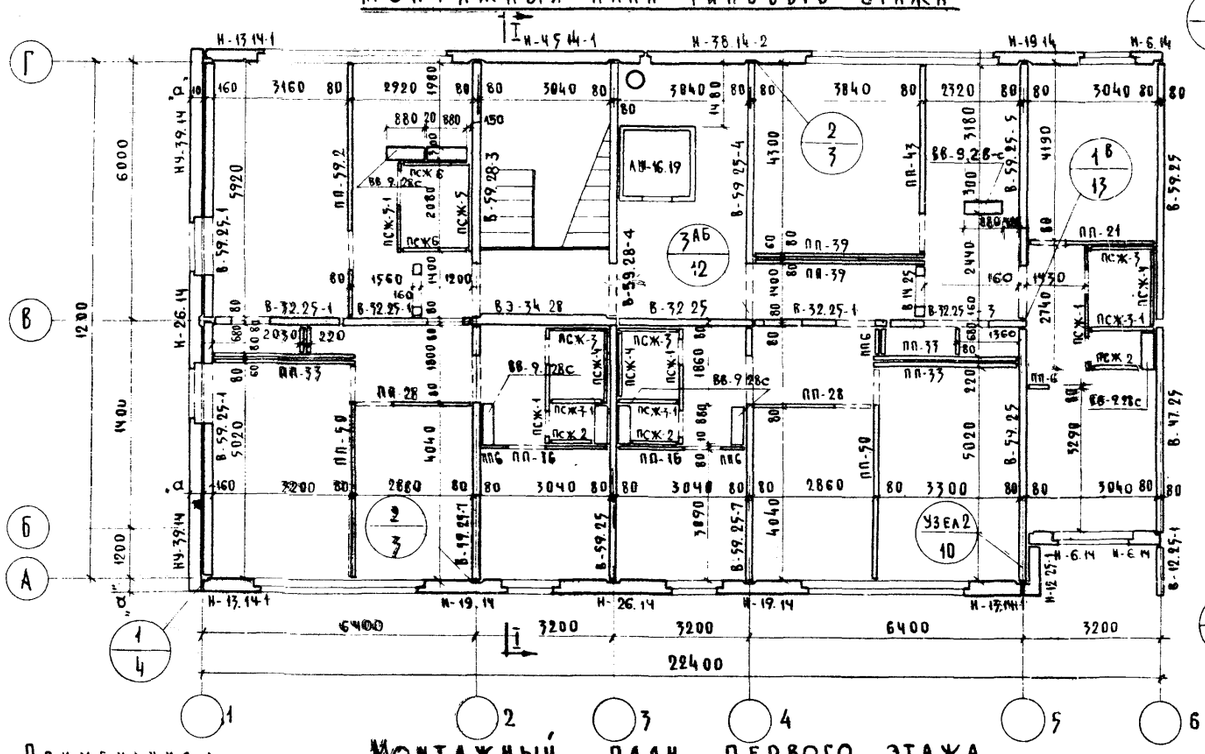

Монтажный план первого этажа.

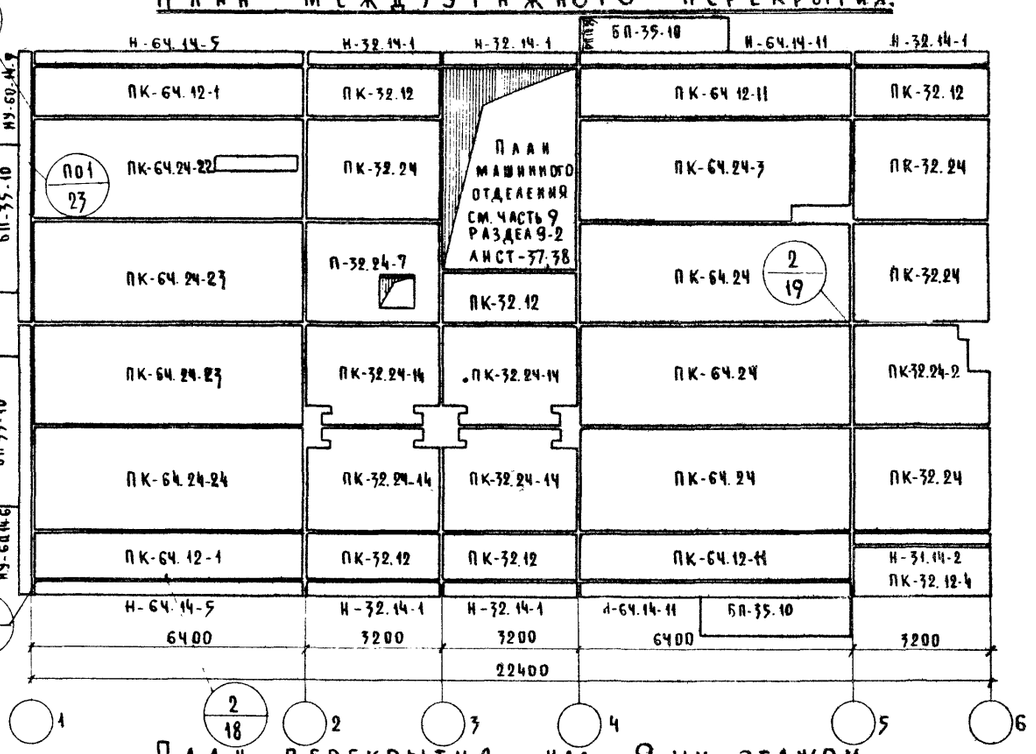

План перекрытия над 9-ым этажом.

Примечания:

1. Балконы БП-35.10-1, указанные в скобках, устанавливаются на 6,7,8 и 9 этажах (то же самое относится и к панелям В-12.25-2)
2. Лестничные марши и площадки со звездочкой (*) применяются как основной вариант серии 125. Лестн. площ. АП-30.18-2 (АП-30.17-2), панель перекр. П-32.24-8 и вентблок ВВ-9.28св устанавливаются только на 9-ом этаже.

1971	9 эт. т. блок-секция 1б-2б-2б-3б (левая) на 36 квартир.	Монтажные планы типового и первого этажей. План междуэтажного перекрытия и перекрытия над 9-ым эт.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-7

КБ по железобетону Госстроя РСФСР

АКО-1

Гл. инжен. КБ — Гл. конструктор — Нач. отдела — Гл. констр. пр. — Гл. архит. пр.

В. Болтинский — Я. Фельман — Ю. Красновидов — П. Афанасьев — Г. Паченцева

Вед. констр. — Ст. техник — Проверил

И. Пух — А. Есин

11734-03 15

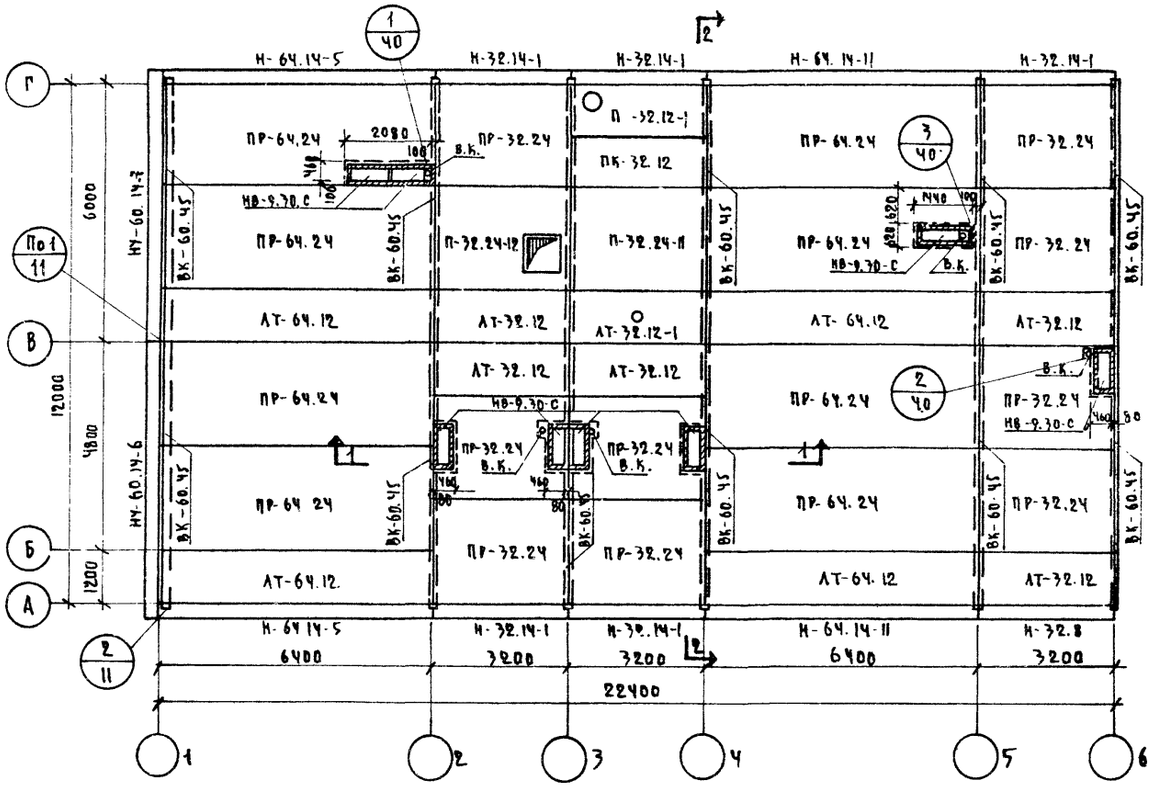

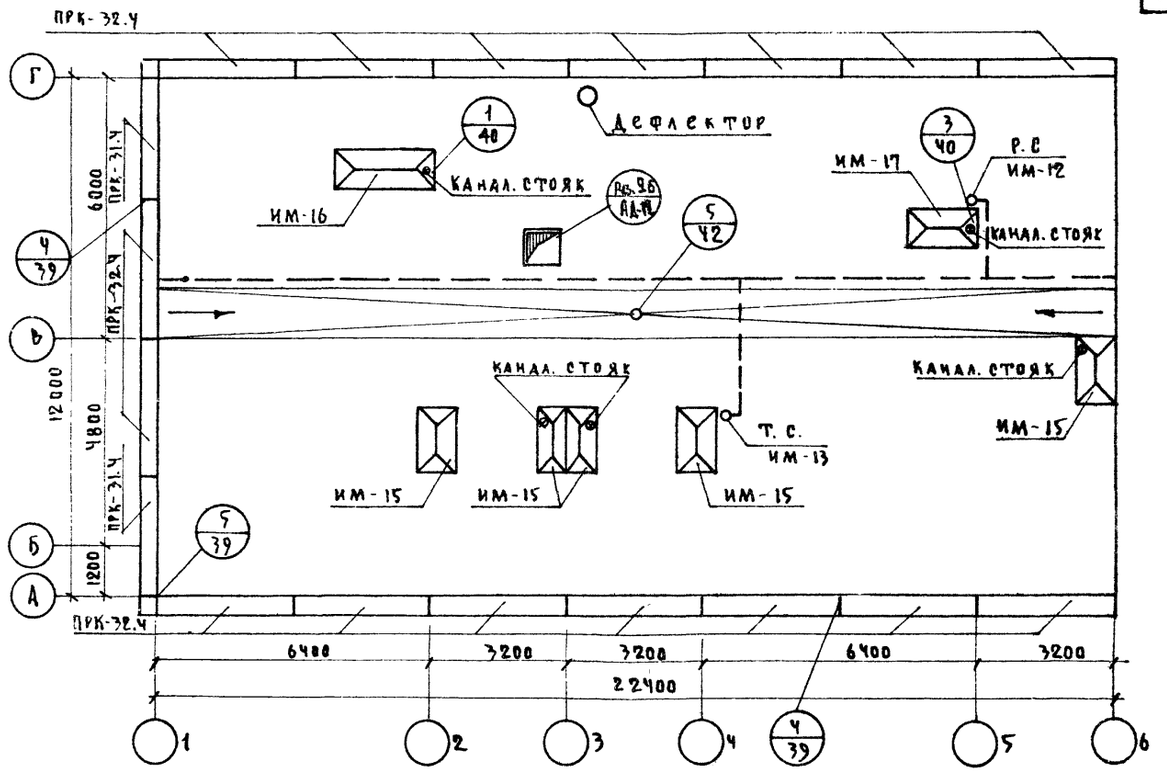

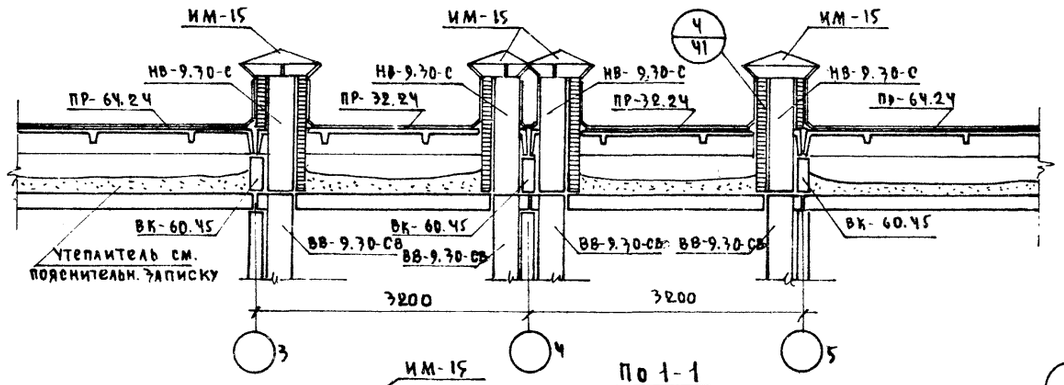

По 1-1

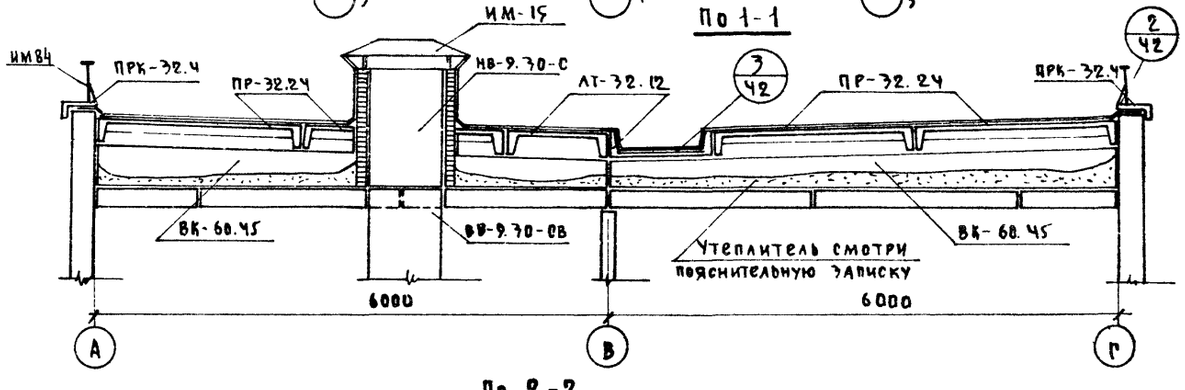

По 2-2

Условные обозначения:

- Шина заземления (арматурная сталь ⌀ 10 мм.)

⊙ Т.С. – Телестойка

○ Р.С – Радиостойка

⊗ – Канализационный стояк

○ – Воронка внутреннего водостока.

1971	9 эт.т. блок-секция 1Б-2Б-2Б-3Б (левая) на 36 квартир	План раскладки панелей крыши. План крыши. Разрезы по крыше.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-8

КБ по железобетону Госстроя РСФСР

АКО-1

Гл. инженер КБ; Гл. констр. КБ; Нач. отдела; Гл. констр. пр.; Гл. архит. пр.

В. Болтинский; Я. Фельман; Ю. Красновидов; П. Афанасьев; Г. Паченцева

Вед. констр.; Ст. техник; Проверил

И. Пух; А. Есин

11734-03 16

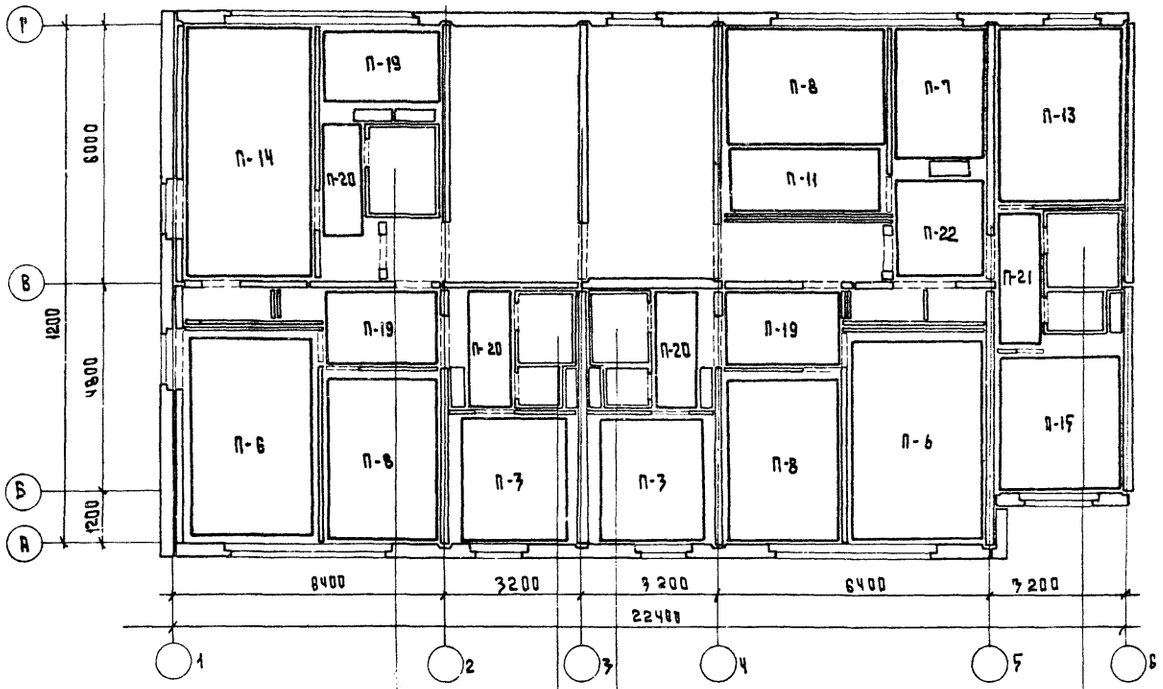

1 этаж - СК-20.28Л-2Р
2 этаж - СК-20 28Л-2
3 этаж - СК-20.28Л-2Р
4 этаж - СК-28.28Л-2
5 этаж - СК-20.28Л-2Р
6 этаж - СК-20.28Л-3
7 этаж - СК-20.28Л-3
8 этаж - СК-20.28Л-3
9 этаж - СК-20.28Л-3В

1 этаж - СК-28.28П-2Р
2 этаж - СК-28-28П-2
3 этаж - СК-28.28П-2Р
4 этаж - СК 28-28П-2
5 этаж - СК-28.28П-2Р
6 этаж - СК-28.28П-3
7 этаж - СК-28.28П-3
8 этаж - СК-28.28П-3
9 этаж - СК-28.28П-3В

1 этаж - СК-28.28Л-2Р
2 этаж - СК-28.28Л-2
3 этаж - СК-28.28Л-2Р
4 этаж - СК-28.28Л-2
5 этаж - СК-28.28Л-2Р
6 этаж - СК-28.28Л-3
7 этаж - СК-28.28Л-3
8 этаж - СК-28.28Л-3
9 этаж - СК-28.28Л-3В

1 этаж - СК-28.28Л-2Р
2 этаж - СК-28.28Л-2
3 этаж - СК-28.28Л-2Р
4 этаж - СК-28.28Л-2
5 этаж - СК-28.28Л-2Р
6 этаж - СК-28.28Л-3
7 этаж - СК-28.28Л-3
8 этаж - СК-28.28Л-3
9 этаж - СК-28.28Л-3В

Примечания:

До монтажа панелей пола необходимо произвести следующие работы:

1. Заделать бетоном отверстия в панелях перекрытия на участке пропуска сантехнических труб
2. Панели пола 1го этажа укладывать по сплошному упругому основанию из биостойких мягких древесноволокнистых плит или мотов из минерального войлока; панели пола 2го-9го этажей - по ленточным прокладкам из тех же материалов, укладываемым через 50 см.
3. Детали полов см. часть 9 раздел 9-1л, АСД-32.
4. Зазоры между панелями пола и наружными стенами (100 мм) заделываются после монтажа отопительных стояков гипсопилочным раствором по месту.

1971	9 эт. т. блок-секция 1б.2б.2б 3б/левая/ на 36 квартир	Монтаный план панелей пола и маркировка об'емных санкабин	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-9

Наименование	NN п/п	Типо-размер	Марка	Марка бетон	Габариты мм ℓ	в	h	Показ. на изделие бетон м³	сталь кг	вес кг	К-во штук 1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7 эт	8 эт	9 эт	Всего на бл.-сек.	Показ. на бл.-сек. бетон м³	сталь кг	вес т	NN рабоч. черт. часть
Внутренние стеновые панели	1	В-59.28	В-59.28-3	250	5930	160	2780	2.06	61.28	5150	1	1	1	1	1	1	1	1	–	8	16.48	490.2	41.2	Раздел 10.2-1
	2		В-59.28-4	"	5930	160	2780	2.06	61.28	5150	1	1	1	1	1	1	1	1	–	8	16.48	490.2	41.2	"
	3	В-59.25	В-59.25	"	5930	160	2540	2.40	41.21	6080	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	64.8	1112.9	160.0	"
	4		В-59.25-1	"	5930	160	2540	2.04	62.15	5100	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	36.7	1118.7	91.8	"
	5		В-59.25-4	"	5930	160	2540	1.94	44.42	4850	1	1	1	1	1	1	1	1	3	11	21.34	488.6	53.4	"
	6		В-59.25-5	"	5930	160	2540	2.84	45.08	5100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18.36	405.7	45.9	"
	7		В-59.25-7	"	5930	160	2540	2.03	30.39	5075	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	36.54	1261.0	91.4	Раздел 10.4-4
	8	В-47.25	В-47.25	"	4730	160	2540	1.91	34.48	4775	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	17.2	318.3	43.0	Раздел 10.2-1
	9		В-32.25	"	3180	160	2540	1.27	28.04	5175	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	11.42	252.4	28.6	"
	10	В-32.25	В-32.25-1	"	3180	160	2540	0.97	52.93	2429	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	26.2	1429.1	65.5	"
	11		В-32.25-3	"	3180	160	2540	0.86	39.46	2156	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7.74	355.3	19.4	Раздел 10.4-4
	12	ВЗ-34.28	ВЗ-34.28	"	3350	240	2780	1.91	357	4775	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	17.19	318.1	43.0	Раздел 10.2-1
	13	В-12.25	В-12.25-1	"	1180	160	2540	0.41	10.60	1025	1	1	1	1	1	–	–	–	–	5	2.05	53.0	51.9	"
	14		В-12.25-2	"	1180	160	2540	0.33	12.96	825	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	1.32	51.84	3.30	"
	15	В-14.25	В-14.25	"	1360	160	2540	0.22	42.78	550	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	3.96	762.84	9.90	Раздел 10.4-4
Итого	9	15																		189	297.19	8906.0	744.13	
Вент. блоки	16	68-9.28	ВВ-9.28-1		880	300	2780	0.32	21.02	800	8	8	8	8	8	8	8	8	–	64	20.48	1345.3	51.2	Раздел 10.4-1
	17		ВВ-9.28-2		880	300	2780	0.38	21.02	750	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	2.40	168.2	6.0	"
Итого	1	2																		72	22.88	1513.5	57.2	
Панели перекрытия	18	ВК-64.24	ВК-64.24		6380	2390	220	1.83	72.46	4575	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	49.41	1956.4	123.5	P.10.3-1
	19	ПК-64.24	ПК-64.24-2*		6380	2390	220	1.83	78.34	4575	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	32.94	1410.1	82.4	P.10.4-4
	20		ПК-64.24-3*	"	6380	2390	220	1.83	84.94	4575	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	16.47	764.5	41.2	"
	21		ПК-64.24-3	*	6380	2390	220	1.75	75.20	4375	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	15.75	676.8	39.4	P.10.3-1
	22		ПК-64.24-2.2	"	6380	2390	220	1.66	100.71	4150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	14.94	906.4	37.4	P.10.3-4
	23	ПК-64.12	ПК-64.12-1	"	6380	1190	220	1.03	40.47	2575	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18.57	728.5	46.4	P.10.3-1
	24		ПК-64.12-4	"	6380	1190	220	1.03	53.20	2575	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	18.54	957.6	46.4	P.10.4-4
	25		ПК-32.24	"	3180	2390	220	0.93	27.11	2326	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	33.48	976.8	83.7	P.10.3-1
	26	ПК-32.24	ПК-32.24-2	"	3180	2390	220	0.86	30.76	2150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7.74	276.8	19.4	"
	27		ПК-32.24-4	"	3180	2390	220	0.88	25.85	2230	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	31.68	93.06	80.3	P.10.4-4
	28		П-32.24-7	"	3180	2390	220	1.42	44.79	3650	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1.42	44.79	3.70	P.10.3-1
	29	П-32.24	П-32.24-8	"	3180	2390	220	0.92	38.35	2300	1	1	1	1	1	1	1	–	–	7	6.44	268.45	16.1	"
	30		П-32.24-9	"	3180	2390	220	0.77	49.39	1925	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	0.77	49.39	1.9	"
	31		ПК-32.12	"	3180	2390	220	0.52	18.61	1300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29	15.08	539.7	37.7	"
	32	ПК-32.12	П 32.12-1	"	3180	2390	220	0.80	32.73	2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7.20	294.6	18.0	"
	33		ПК-32.12-4	"	3180	2390	220	0.52	24.19	1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4.68	186.1	11.7	P.10.4-4
Итого	5	16																		245	215.1	8896.1	689.2	–
Прочие изделия	34	АМ-28.12	АМ-28.12* АМ-28.12-1	300	3261	1200	289	0.68	39.40	1700	2	2	2	2	2	2	2	2	–	16	10.88	63.04	27.2	P.10.4-1
	35	АП-30.17	АП-30.18-1* АП-30.17-1	"	3020	1705	300	0.60 / 0.096	31.75	1750	1	2	2	2	2	2	2	2	–	15	9.0 / 1.44	557.3	26.3	"
	36		АП-36.18-2* АП-36.18-2	"	3020	1705	300	0.61 / 0.10	40.8	1775	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0.61 / 0.10	40.8	1.78	"
	37	ПСЖ-1	ПСЖ-1	200	2670	50	2450	0.20	9.32	600	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	5.40	251.6	13.5	"
	38	ПСЖ-2	ПСЖ-2	"	1280	50	2450	0.16	4.46	400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4.32	120.4	10.8	"
	39	ПСЖ-3	ПСЖ-3	"	1540	50	2450	0.19	6.83	475	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	5.13	162.8	12.8	"
	40		ПСЖ-3-1	"	1540	50	2450	0.19	5.66	475	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	5.13	153.4	12.8	"
	41	ПСЖ-4	ПСЖ-4	"	1710	50	2450	0.21	6.09	525	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	5.67	164.4	14.2	"
	42	ПСЖ-5	ПСЖ-5	"	2020	50	2450	0.25	6.89	625	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.25	62.0	5.6	"
	43		ПСЖ-5-1	"	2080	50	2450	0.19	8.05	470	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1.71	72.45	4.2	"
	44	ПСЖ-6	ПСЖ-6	"	1760	50	2450	0.21	5.79	525	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	3.78	104.22	9.4	"
	45	АШ-16.19	АШ-16.19	"	1860	1710	2380	4.38	88.12	34.50	1	1	1	1	1	1	1	1	–	8	11.07	904.96	27.6	"
	46	ПД-20.18	ПД-20.18-1	200	1820	2080	80	0.19	20.16	475	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1.71	181.4	4.3	P.10.4-4
	47	ПД-27.16	ПД-27.16	"	1500	2730	80	0.21	26.37	525	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	3.78	474.7	9.5	"
	48		ПД-27.16-1	"	1600	2730	80	0.21	26.37	525	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1.89	237.3	4.7	"
	49	БП-35.10	БП-35.10	"	3500	950	100	0.424	41.47	1060	4	4	4	4	4	3	3	3	7	36	15.27	1492.9	38.16	P.10.4-4
	50		БП-35.10-1	"	3500	950	100	0.40	49.09	940	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	1.60	196.4	3.8	"
	51	КР-62.14	КР-62.14	"	6200	1380	160	1.39	113.49	3470	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.39	113.5	3.5	P.10.4-1
	52			"																				
	53	РП-8.26	РП-8.26	"	810	50	2640	0.106	18.11	260	1	1	1	1	1	–	–	–	–	5	0.53	90.6	1.30	P.10.4-4
	54		РП-8.26-1	"	810	50	2640	0.103	24.05	250	–	–	–	–	–	1	1	1	1	4	0.41	96.2	1.0	"
	55	РП-10.23	РП-10.23	"	950	50	2360	0.112	17.67	300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1.01	159.0	2.70	"
Итого	16	22																		306	92.85	6070.0	248.04	–
Элементы крыши	56	НВ-9.30	НВ-9.30*	200	880	300	1360	0.19	20.24	465	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8	1.52	161.9	3.7	P.10.4-1
	57	ВК-60.45	ВК-60.45	"	5980	450	160	0.35	14.48	875	–	–	–	–	–	–	–	–	12	12	4.20	173.8	10.5	"
	58	ПР-64.24	ПР-64.24*	"	6380	2380	300	1.12	38.75	2800	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8	8.96	248.0	22.4	"
	59	ПР-32.24	ПР-32.24	"	3180	2380	300	0.56	36.16	1400	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	5.04	325.4	32.6	"
	60	АТ-64.12	АТ-64.12	"	6380	1180	300	1.07	73.15	2600	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	4.28	292.6	10.4	"
	61	АТ-32.12	АТ-32.12	"	3180	1180	300	0.52	43.06	1300	–	–	–	–	–	–	–	–	5	5	2.60	215.3	6.5	"
	62		АТ-32.12-1	"	3180	1180	300	0.52	43.06	1300	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0.52	43.06	1.30	"
	63	П-32.24	П-32.24-11	"	3180	2390	160	1.67	30.03	4175	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1.67	30.03	4.2	P.10.3-1
	64		П-32.24-12	"	3180	2390	160	1.32	58.92	2300	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1.32	58.92	2.3	"
	65	ПК-32.12	ПК-32.12	"	3180	1190	220	0.52	18.61	1300	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0.52	18.61	1.30	"
	66		П 32.12-1	"	3180	1190	220	0.80	32.73	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	0.80	32.73	2.0	"
	67	ПРК-32.4	ПРК-32.4	"	3190	1100	160	0.11	2.81	275	–	–	–	–	–	–	–	–	16	16	1.76	44.96	4.40	P.10.4-1
	68	ПРК-31.4	ПРК-31.4	"	3095	400	160	0.09	2.77	225	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	0.18	5.54	0.45	"
Итого	10	13																		69	33.4	1649.9	82.0	
Всего	39	68																		881	722.0	29142.9	1841.2	

Примечания

1. Марки лестничных маршей и площадок, отмеченные звездочкой (*) приняты как основной вариант серии 125.
2. При применении об'емных санкабин поз. 37 ÷ 44, 46 ÷ 47 исключить. Маркировка и спецификация об'емных санкабин см. листы АС-9 АС-14

Гл. инженер КБ	И. Пучк	КЖ	Железобетонные конструкции	1971	9 эт. т. блок-секция 1Б-2Б-2Б-3Б (левая) на 36 квартир	Спецификация сборных железобетонных элементов	Типовой проект 125-04	Часть	Альбом АС-10
Гл. конструктор КБ	А. Есин								
Нач. отдела	В. Балтинский								
Гл. констр.	Я. Фрейзман								
Гл. архит.	Ю. Краснодубов								
Гл. констр.	Л. Афанасьев								
Гл. архит.	Л. Дяченцева								
Гл. инженер КБ по железобетону Госстроя РСФСР		АКО-1							

14734-03 18

НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА γ=700 КГ/М³.

МАРКА НАР. СТЕНЫ	NN П.П	ТИПО РАЗМЕР	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	МАРКА БЕТОНА	ГАБАРИТЫ ММ ℓ	в	h	ПОКАЗАТЕЛИ НА БЛОК-СЕКЦИИ ЯЧЕИСТ. БЕТ. М³	СТАЛЬ КГ	ВЕС Т	КОЛИЧ-ВО ШТУК 1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7 эт	8 эт	9 эт	ВСЕГО НА БЛОК-СЕКЦ.	ПОКАЗАТЕЛИ НА БЛОК-СЕКЦИИ ЯЧЕИСТ. БЕТОН	СТАЛЬ КГ	ВЕС Т	NN РАБОЧИХ ЧЕРТ. ЧАСТЬ 10
	1		Н-64.14	35	6390	250	1380	2.12	39.91	18.05	—	2	2	2	2	2	2	2	16	33.92	638.0	28.88	РАЗДЕЛ 10-1.1
	2		Н-64.14-5	"	6390	250	1380	2.10	40.4	1780	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.20	80.8	3.56	"
	3	Н-64.14	Н-64.14-15	"	6390	250	1380	2.0	55.7	1400	—	2	2	2	2	2	2	2	16	32.0	891.2	22.4	РАЗДЕЛ 10-4.4
	4		Н-64.14-11	"	6390	250	1380	2.10	37.96	1790	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.2	75.9	3.58	"
	5		Н-45.14	"	4500	250	1380	1.48	21.94	1260	—	1	1	1	1	1	1	1	8	11.84	175.1	10.08	РАЗДЕЛ 10.1-1
	6	Н-45-14	Н-45.14-1	"	4500	250	1380	0.98	17.84	835	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.98	17.8	0.84	"
	7		Н-38.14-1	"	3830	250	1380	1.0	19.42	850	—	1	1	1	1	1	1	1	8	8.0	155.4	6.8	"
	8	Н-38 14	Н-38.14-2	"	3830	250	1380	0.92	26.54	780	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.92	26.54	0.78	"
	9		Н-32.14	"	3190	250	1380	1.05	17.94	884	—	4	4	4	4	4	4	4	32	33.6	574.1	28.28	"
	10	Н-32.14	Н-32.14-1	"	3190	250	1380	1.03	18.65	877	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5.15	93.3	4.37	"
	11		Н-32.14-2	"	3190	250	1380	0.87	50.18	740	—	1	1	1	1	1	1	1	8	6.96	40.14	5.92	"
	12		Н-31.14-1	"	3100	250	1380	0.92	28.03	780	—	1	1	1	1	1	1	1	8	7.36	224.3	6.24	"
	13	Н-31.14	Н-31.14-3	"	3100	250	1380	0.92	28.03	780	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.92	28.03	0.78	"
	14	Н-19.14	Н-19.14	"	1940	250	1380	0.62	14.38	527	3	3	3	3	3	3	3	3	27	16.74	388.3	14.23	"
	15	Н-13.14	Н-13.14-1	"	1300	250	1380	0.42	9.95	357	3	3	3	3	3	3	3	3	27	11.60	268.6	9.65	"
	16	Н-12.25	Н-12.25-1	"	1180	250	2530	0.69	25.81	587	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6.21	232.25	5.283	"
	17	Н-32.8	Н-32.8	"	3190	250	770	0.59	16.78	520	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.59	16.78	0.52	РАЗДЕЛ 10-4.4
	18	Н-32.5	Н-32.5	"	3100	250	540	0.44	16.39	343	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.44	16.59	0.34	РАЗДЕЛ 10-1.1
	19	Н-6.14	Н-6.14	"	645	250	1380	0.18	7.05	153	5	3	3	3	3	3	3	3	29	5.22	203.1	4.44	"
	20	НУ-39.14	НУ-39.14	"	3870	250	1380	1.21	19.30	1030	2	2	2	2	2	2	2	2	18	21.78	347.4	18.54	"
	21		НУ-60.14-5А	"	6245	250	1380	2.00	54.29	1590	—	1	1	1	1	1	1	1	8	16.0	434.3	14.72	РАЗДЕЛ 10-4.4
	22		НУ-60.14-4А	"	6245	250	1380	2.00	54.29	1590	—	1	1	1	1	1	1	1	8	16.0	434.31	14.72	"
	23	НУ-60.14	НУ-60.14-7	"	6245	250	1380	2.10	36.68	1785	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.1	36.7	1.79	"
	24		НУ-60.14-6	"	6245	250	1380	2.10	42.42	1785	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.1	42.4	1.79	
	25	Н-13-10	Н-13.10	"	1300	250	1010	0.31	9.73	263	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.31	9.73	0.26	РАЗДЕЛ 10-1.1
	26	Н-64.10	Н-64.10	"	6390	250	1010	1.59	25.25	1350	4	—	—	—	—	—	—	—	4	6.36	10.10	5.4	"
	27	Н-32.10	Н-32.10	"	3190	250	1010	0.78	16.78	663	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2.34	50.3	1.99	"
	28	НУ-60.10	НУ-60.10-2	"	6245	250	1010	1.42	34.98	1210	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.42	34.98	1.21	РАЗДЕЛ 10-4.4
	29	НУ-60.10	НУ-60.10-3	"	6245	250	1010	1.42	34.98	1210	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.42	34.98	1.21	"
	30	Н-26.14	Н-26.14	"	2580	250	1380	0.80	15.79	680	2	2	2	2	2	2	2	2	18	14.4	284.22	12.24	РАЗДЕЛ 10-1.1
Итого:		18	29																266	275.0	6227.0	227.4	

НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА γ= 700 КГ/М³

МАРКА НА СТЕНЫ	NN П.П	ТИПО-РАЗМЕР	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	МАРКА БЕТОН	ГАБАРИТЫ ММ ℓ	в	h	ПОКАЗАТЕЛИ НА БЛОК-СЕКЦИИ ЯЧЕИСТ. БЕТ. М³	СТАЛЬ КГ	ВЕС КГ	КОЛИЧЕСТВО ШТУК 1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7 эт	8 эт	9 эт	ВСЕГО НА БЛОК-СЕКЦИИ	ПОКАЗАТЕЛИ НА БЛОК-СЕКЦИИ ЯЧЕИСТ. БЕТ. М³	СТАЛЬ КГ	ВЕС Т	NN РАБОЧ. ЧЕРТЕЖ. ЧАСТЬ 10
	1		Н-64 14	35	6390	300	1380	2.51	40.79	2135	—	2	2	2	2	2	2	2	16	40.16	653.0	34.16	РАЗДЕЛ 10-1.1
	2		Н-64 14-5	"	6390	300	1380	2.49	41 21	2120	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.98	82.42	4.24	"
	3	Н-64.14	Н-64.14-15	"	6390	300	1380	2 45	56 69	1720	—	2	2	2	2	2	2	2	16	39.2	907.1	27.52	РАЗДЕЛ 10-4.4
	4		Н-64.14-11	"	6380	300	1380	2.52	38.78	2140	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.04	77.56	4.28	"
	5		Н-45-14	"	4500	300	1380	1 79	22.24	1525	—	1	1	1	1	1	1	1	8	14.32	177.91	12.2	РАЗДЕЛ 10-1.1
	6	Н-45 14	Н-45.14-1	"	4500	300	1380	1 21	18.68	1030	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.21	18.7	1.03	"
	7		Н-38.14-1	"	3830	300	1380	1.31	19.72	1100	—	1	1	1	1	1	1	1	8	10.48	157.76	9.28	"
	8	Н-38 14	Н-38 14-2	"	3830	300	1380	1.08	27.19	1050	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.08	27.15	1.05	"
	9		Н-32.14	"	3190	300	1380	1.26	18.60	1070	—	4	4	4	4	4	4	4	32	40.3	595.2	34.2	"
	10	Н-32.14	Н-32.14-1	"	3190	300	1380	1.24	19.33	1434	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6.40	96.6	7.17	"
	11		Н-32 14-2	"	3190	300	1380	1.04	50.88	885	—	1	1	1	1	1	1	1	8	8.32	407.1	7.08	"
	12	Н-31.14	Н-31 14-1	"	3100	300	1380	1.09	28 72	980	—	1	1	1	1	1	1	1	8	8.72	229.7	7.84	"
	13		Н-31.14-3	"	3100	300	1380	1.09	28.72	980	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.09	28.7	0.98	"
	14	Н-19.14	Н-19 14	"	1940	300	1380	0.76	14.53	645	3	3	3	3	3	3	3	3	27	20.52	392.3	17.42	"
	15	Н-13 14	Н-13 14-1	"	1300	300	1380	0.51	10.31	435	3	3	3	3	3	3	3	3	27	13.77	278.37	11.7	"
	16	Н-12 25	Н-12 25-1	"	1180	300	2530	0.80	26.00	680	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7.2	234.0	6.1	"
	17	Н-32 8	Н-32 8	"	3190	300	770	0.71	17.44	620	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.71	17.44	0.62	РАЗДЕЛ 10-4.4
	18	Н-32 5	Н-32.5	"	3100	300	540	0.52	16.89	442	—	—	—	—	—	—	—	1.	1	0 52	15.89	0.442	РАЗДЕЛ 10-1.1
	19	Н-6 14	Н-6.14	"	645	300	1380	0.71	7.31	179	5	3	3	3	3	3	3	3	29	6.09	211.9	5.191	"
	20	НУ-39.14	НУ-39 14	"	3870	300	1380	1.46	19.86	1241	2	2	2	2	2	2	2	2	18	26.28	357.48	22.34	"
	21		НУ-60 14-5А	"	6295	300	1380	2.41	55.35	1920	—	1	1	1	1	1	1	1	8	19.30	442.8	15.36	РАЗДЕЛ 10-4.4
	22	НУ-60 14	НУ-60.14-4А	"	6295	300	1380	2.41	55.35	1920	—	1	1	1	1	1	1	1	8	19.30	442.8	15.36	"
	23		НУ-60.14-7	"	6295	300	1380	2.54	31.49	2100	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.54	37.49	2.1	"
	24		НУ-60 14-6	"	6295	300	1380	2.54	37.49	2106	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.54	37.49	2.106	"
	25	Н-13 10	Н-13 10	"	1300	300	1010	0.38	10.11	323	1	—	—	—	—	—	—	—	1	0.38	10.11	0.323	РАЗДЕЛ 10-1.1
	26	Н-64 10	Н-64 10	"	6390	300	1010	1.91	26.13	1622	4	—	—	—	—	—	—	—	4	7.64	104.52	6.482	"
	27	Н-32.10	Н-32.10	"	3190	300	1010	0.94	17.44	798	3	—	—	—	—	—	—	—	3	2.82	52.32	2.994	"
	28	НУ-60.10	НУ-60.10-2	"	6395	300	1010	1.70	35.83	1450	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	35.83	1.45	РАЗДЕЛ 10-4.4
	29	НУ-60.10	НУ-60.10-3	"	6395	300	1010	1.70	35.83	1450	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1.7	35 83	1.45	"
	30	Н-26.14	Н-26.14	"	2580	300	1380	0.90	16.06	765	2	2	2	2	2	2	2	2	18	16.2	289.1	13.72	РАЗДЕЛ 10-1.1
Итого		18	29																266	390.5	6461	275.6	

ГИП ИНЖЕНЕР КБ	И. ПУХ	ВЕД. КОНСТРУКТОР	В. БОЛТИНСКИЙ	КБ по железобетону Госстроя РСФСР	
ГИ. КОНСТРУКТОР КБ	А. ЕСКИН	СОТР.	Я. ФЕЛЬДМАН		
НАЧ. ОТДЕЛА		ГИ. КОНСТРУКТ. ПР.	Н. КРАСНОВИДОВ		АКО-1
ГИ. АРХИТЕКТ. ПР.		ПРОВЕРИЛ	П. АФАНАСЬЕВ		
		ПРОВЕРИЛ	Г. ПАЧЕНЦЕВА		

1971	9эт т. БЛОК-СЕКЦИЯ 1Б-2Б-2Б-3Б/ЛЕВАЯ/ НА 36 КВАРТИР	Спецификация наружных стеновых панелей, из ячеистого бетона толщиной 250-300 мм.	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-04	ЧАСТЬ 1	АЛЬБОМ АС-11

Материал нар. стены	NN п/п	Типоразмер	Марка изделия	Марка бетона / Марка раствора	Габариты мм: l	b	h	Показатели на сек: Легкий бетон м3	Раствор кг	Сталь кг	Вес кг	Кол-во штук: 1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	Всего на секц.	Показатели на секц.: Легкий бетон м3	Раствор кг	Сталь кг	Вес кг	NN рабочих черт. часть 10
Наружные стеновые панели из легкого бетона γ=1000 кг/м³	1	Н-64.14	Н-64.14	50/75	6390	300	1380	2.26	0.25	40.71	2890	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	40.68	4.5	730.0	52.02	Раздел 10.1-1
	2		Н-64.14-5	—"—	6390	300	1380	2.24	0.25	41.24	2870	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.48	0.5	82.48	5.74	—"—
	3		Н-64.14-15	—"—	6390	300	1380	2.20	0.25	56.69	2200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	39.60	4.5	1020.4	39.6	Раздел 10.4-4
	4		Н-64.14-11	—"—	6390	300	1380	2.27	0.25	38.72	2900	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4.54	0.5	77.4	5.8	—"—
	5	Н-45.14	Н-45-14	—"—	4500	300	1380	1.62	0.17	22.24	2056	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12.96	1.36	177.9	16.448	Раздел 10.1-2
	6		Н-45.14-1	—"—	4500	300	1380	1.08	0.13	18.68	1390	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.08	0.13	18.68	1.39	—"—
	7	Н-38.14	Н-38.14-1	—"—	3830	300	1380	1.18	0.13	19.72	1500	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	9.44	1.04	157.7	12.0	Раздел 10.4-4
	8		Н-38.14-2	—"—	3830	300	1380	0.98	0.10	27.19	1230	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.98	0.10	27	1.23	—"—
	9	Н-32.14	Н-32.14	—"—	3190	300	1380	1.13	0.13	18.60	1454	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	39.55	4.55	651.0	50.89	Раздел 10.1-2
	10		Н-32.14-1	—"—	3190	300	1380	1.11	0.13	19.33	1434	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5.55	0.65	96.6	7.17	—"—
	11		Н-32.14-2	—"—	3190	300	1380	0.94	0.10	50.88	1195	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	7.52	0.8	404.4	9.56	Раздел 10.1-1
	12	Н-31.14	Н-31.14-1	—"—	3100	300	1380	0.98	0.11	28.72	1255	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	7.84	0.88	229.7	10.04	Раздел 10-1-2
	13		Н-31.14-3	—"—	3100	300	1380	0.98	0.11	28.72	1255	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.98	0.11	28.72	1.256	—"—
	14	Н-19.14	Н-19.14	—"—	1940	300	1380	0.68	0.08	14.53	877	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	18.36	2.16	392.3	23.679	—"—
	15	Н-13.14	Н-13.14-1	—"—	1300	300	1380	0.46	0.05	10.31	588	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	12.88	1.4	288.7	16.464	—"—
	16	Н-12.25	Н-12.25-1	—"—	1180	300	2530	0.72	0.08	26.00	920	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6.48	0.72	234.0	8.28	—"—
	17	Н-32.8	Н-32.8	—"—	3190	300	770	0.64	0.07	17.44	820	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.64	0.07	17.4	0.82	Раздел 10.4-4
	18	Н-32.5	Н-32.5	—"—	3100	300	540	0.47	0.05	16.89	590	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.47	0.05	16.9	0.59	Раздел 10.1-2
	19	Н-6.14	Н-6.14	—"—	645	300	1380	0.19	0.03	7.31	259	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29	5.51	0.87	211.9	7.511	—"—
	20	НУ-39.14	НУ-39.14	—"—	3920	300	1380	1.32	0.14	19.86	1680	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	23.76	2.52	357.5	30.24	Раздел 10.1-1
	21	НУ-60.14	НУ-60.14-5	—"—	6295	300	1380	2.06	0.20	55.35	2600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18.54	1.8	498.2	23.4	—"—
	22		НУ-60.14-4А	—"—	6295	300	1380	2.06	0.20	55.35	2600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18.54	1.8	498.2	23.4	—"—
	23		НУ-60.14-7	—"—	6295	300	1380	2.24	0.23	37.49	2750	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.24	0.23	37.5	2.7	—"—
	24		НУ-60.14.6	—"—	6295	300	1380	2.24	0.23	37.49	2750	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.24	0.23	37.5	2.7	—"—
	25	Н-26.14	Н-26.14	—"—	2580	300	1380	0.80	0.10	13.26	1045	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	14.4	1.8	238.7	18.81	Раздел 10.1-2
Итого:		14	25																		266	299.3	33.3	6531.4	372.0	

Материал нар. стены	NN п/п	Типоразмер	Марка изделия	Марка бетона / Марка раствора	Габариты мм: l	b	h	Показатели на сек: Легк. бет. м3	Раствор кг	Сталь кг	Вес кг	Кол-во штук: 1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	Всего на секц.	Показатели на секц.: Легк. бетон м3	Раствор кг	Сталь кг	Вес т.	NN рабочих чертеж. часть 10
Наружные стеновые панели из легкого бетона γ=1000 кг/м³	1	Н-64.14	Н-64.14	50/75	6390	350	1380	2.62	0.26	42.74	3280	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	47.16	4.5	770.0	59.04	Раздел 10.1-2
	2		Н-64.14-5	—"—	6390	350	1380	2.60	0.25	44.14	3258	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.2	0.5	88.28	6.516	—"—
	3		Н-64.14-15	—"—	6390	350	1380	2.41	0.25	56.41	3017	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	42.48	4.5	1015.4	54.306	Раздел 10.4-4
	4		Н-64.14-11	—"—	6390	350	1380	2.58	0.25	40.64	3240	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.16	0.5	81.3	6.48	—"—
	5	Н-45.14	Н-45-14	—"—	4500	350	1380	1.87	0.17	24.3	2326	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	14.96	1.36	194.4	18.608	Раздел 10.1-2
	6		Н-45.14-1	—"—	4500	350	1380	1.26	0.13	28.59	1595	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.26	0.13	28.6	1.595	—"—
	7	Н-38.14	Н-38.14-1	—"—	3830	350	1380	1.26	0.13	20.04	1570	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10.08	1.04	160.32	12.56	Раздел 10.4-4
	8		Н-38.14-2	—"—	3830	350	1380	1.14	0.10	27.17	1440	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.14	0.10	27.2	1.440	—"—
	9	Н-32.14	Н-32.14	—"—	3190	350	1380	1.34	0.13	19.92	1681	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	46.9	4.55	697.2	58.835	Раздел 10.1-2
	10		Н-32.14-1	—"—	3190	350	1380	1.26	0.13	20.68	1595	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6.3	0.65	103.4	7.975	—"—
	11		Н-32.14-2	—"—	3190	350	1380	1.12	0.10	52.24	1390		1	1	1	1	1	1	1	1	8	8.96	0.8	417.9	11.12	Раздел 10.4-2
	12	Н-31.14	Н-31.14-1	—"—	3100	350	1380	1.12	0.11	30.73	1410	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8.96	0.88	245.8	11.26	Раздел 10-1-2
			Н-31.14-3	—"—	3100	350	1380	1.12	0.11	30.73	1410	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.12	0.11	30.7	1.41	—"—
	13	Н-19.14	Н-19.14	—"—	1940	350	1380	0.79	0.08	14.71	997	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	21.33	2.16	397.2	26.919	—"—
	14	Н-13.14	Н-13.14-1	—"—	1300	350	1380	0.53	0.05	10.61	662	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	14.84	1.4	297.1	18.536	—"—
	15	Н-12.25	Н-12.25-1	—"—	1180	350	2530	0.82	0.08	26.95	1030	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	7.38	0.72	242.5	9.27	—"—
	16	Н-32.8	Н-32.8	—"—	3190	350	770	0.79	0.07	16.78	980	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.79	0.07	16.8	0.98	Раздел 10.4-4
	17	Н-32.5	Н-32.5	—"—	3100	350	540	0.62	0.05	17.21	760	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.62	0.05	17.2	0.76	Раздел 10.1-2
	18	Н-6.14	Н-6.14	—"—	645	350	1380	0.22	0.03	7.46	292	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29	6.38	0.87	216.34	8.468	—"—
	19	НУ-39.14	НУ-39.14	—"—	3920	350	1380	1.72	0.14	22.09	2130	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	30.96	2.52	397.62	38.34	Раздел 10.1-2
	20	НУ-60.14	НУ-60.14-5	—"—	6345	350	1380	2.41	0.20	56.46	3050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	21.69	1.8	508.2	27.47	—"—
	21		НУ-60.14-4А	—"—	6345	350	1380	2.41	0.20	56.46	3050	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	21.69	1.8	508.2	27.45	—"—
	22		НУ-60.14-7	—"—	6345	350	1380	2.54	0.23	38.45	3225	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.54	0.23	38.5	3.225	—"—
	23		НУ-60.14-6	—"—	6345	350	1380	2.54	0.23	38.45	3225	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.54	0.23	38.5	3.225	—"—
	24	Н-26.14	Н-26.14	"	2580	350	1380	0.93	0.10	13.49	1180	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	16.74	1.8	242.8	21.24	Раздел 10.1-2
Итого:		14	25																		266	34.72	33.3	6778.0	416.0	

1971	9 эт. т. блок-секция 1б-2б-2б-3б/левая/ на 36 квартир.	Спецификация наружных стеновых панелей из легкого бетона толщиной 300 и 350 мм.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-12

Гл. инж. КБ — Гл. констр. КБ — Нач. отдела — Гл. констр. пр. — Гл. архит. пр.

В. Болтинский — Я. Фельман — Ю. Красновидов — П. Афанасьев — Г. Паченцева

Вед. констр. — Ст. техник — Проверил

И. Пук — А. Есин

КБ по железобетону Госстроя РСФСР — АКО-1

11734-03 20

Спецификация наружных стеновых панелей из легкого бетона. Толщиной 400 мм.

Матер. нар. стены	NN п/п	Типоразмер	Марка изделия	Марк. бет./мар. р-ра	Габариты мм: l	b	h	Показатели на бл.-с: легк. бет. м³	раст-вор кг	сталь кг	вес кг	Кол-во штук: 1 эт.	2 эт.	3 эт.	4 эт.	5 эт.	6 эт.	7 эт.	8 эт.	9 эт.	Всего на бл.-сек.	Показатели на бл.-с: легк. бетон м³	раст-вор кг	сталь кг	вес т	NN рабочих чертеж часть 10
Наружные стеновые панели из легкого бетона γ: 1000 кг/м³	1	Н-64.14	Н-64.14	50/75	6390	400	1380	3.0	0.25	43.52	3690	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	54.00	4.50	785.0	66.42	Раздел 10.1-2
	2		Н-64.14-5	—"—	6390	400	1380	2.96	0.25	44.96	3647	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.92	0.5	89.92	7.294	—"—
	3		Н-64.14-15	—"—	6390	400	1380	2.75	0.23	51.14	3384	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	49.5	4.14	920.52	60.912	Раздел 10.4-4
	4		Н-64.14-11	—"—	6390	400	1380	2.92	0.25	28.98	3600	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5.84	0.5	57.96	7.2	—"—
	5	Н-45.14	Н-45.14	—"—	4500	400	1380	2.11	0.17	24.58	2585	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	16.88	1.36	196.64	20.68	Раздел 10.1-2
	6		Н-45.14-1	—"—	4500	400	1380	1.44	0.13	29.03	1790	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.44	0.13	29.03	1.79	—"—
	7	Н-38.14	Н-38.14-1	—"—	3830	400	1380	1.44	0.12	20.32	1770	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	11.52	0.96	162.56	14.16	Раздел 10.4-4
	8		Н-38.14-2	—"—	3830	400	1380	1.30	0.10	27.47	1580	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.3	0.1	27.47	1.58	—"—
	9	Н-32.14	Н-32.14	—"—	3190	400	1380	1.58	0.13	20.46	1940	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35	55.3	4.55	716.1	6.79	Раздел 10.1-2
	10		Н-32.14-1	—"—	3190	400	1380	1.44	0.13	21.24	1790	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	7.2	0.65	106.2	8.95	—"—
	11		Н-32.14-2	—"—	3190	400	1380	1.28	0.10	52.82	1562	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10.24	0.8	422.56	12.49	—"—
	12	Н-31.14	Н-31.14-2	—"—	3100	400	1380	1.28	0.11	31.36	1580	—	1	1	1	1	1	1	1	1	8	10.24	0.88	250.88	12.64	—"—
	13		Н-31.14-4	—"—	3100	400	1380	1.28	0.11	31.36	1580	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.28	0.11	31.36	1.58	—"—
	14	Н-19.14	Н-19.14	—"—	1940	400	1380	0.90	0.08	14.88	1120	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	2.43	2.16	401.76	30.24	—"—
	15	Н-13.14	Н-13.14-1	—"—	1300	400	1380	0.61	0.05	11.65	750	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28	17.08	1.4	326.2	21.0	—"—
	16	Н-12.25	Н-12.25-1	—"—	1180	400	2530	0.92	0.08	27.09	1140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8.28	0.72	243.81	10.26	—"—
	17	Н-32.8	Н-32.8	—"—	3190	400	770	0.91	0.07	17.44	1110	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.91	0.07	17.44	1.11	Раздел 10.4-4
	18	Н-32.5	Н-32.5	—"—	3100	400	540	0.62	0.05	17.21	760	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	0.62	0.05	17.24	0.76	Раздел 10.1-2
	19	Н-6.14	Н-6.14	—"—	645	400	1380	0.25	0.03	7.70	324	5	3	3	3	3	3	3	3	3	29	7.25	0.87	223.3	93.96	"
	20	НУ-39.14	НУ-39.14	—"—	4020	400	1380	1.98	0.15	22.57	2400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	35.64	2.7	406.3	43.2	"
	21	НУ-60.14	НУ-60.14-5А	—"—	6385	400	1380	2.10	0.23	58.14	2680	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18.9	2.07	523.26	24.12	Раздел 10.4-4
	22		НУ-60.14-4	—"—	6385	400	1380	2.10	0.23	58.14	2680	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	18.9	2.07	523.26	24.12	"
	23		НУ-60.14-7	—"—	6385	400	1380	2.10	0.23	23.63	2680	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.1	0.23	23.63	2.68	"
	24		НУ-60.14-6	—"—	6385	400	1380	2.10	0.23	23.63	2680	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2.1	0.23	23.63	2.68	"
	25	Н-26.14	Н-26.14	—"—	2580	400	1380	1.07	0.10	13.70	1336	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	19.26	1.8	246.6	24.04	Раздел 10.1-2
Итого:		14	25																		266	365.0	34.2	6769	561.8	

Спецификация металлических изделий

NN п/п	Назначение	Марка	Вес марки кг	Кол-во шт. на блок-секц.	Общий вес на бл.-сек.	NN раб. черт. часть 10
1	Огражд. лестн.: основной марш	ИМ-1	23.23	16	371.7	Раздел 10.7-1
2	Верхняя площадка	ИМ-5	9.33	2	18.66	"
3	Звено поворота	ИМ-3	4.20	16	67.20	"
4	Соедин. планка	ИМ-30	0.09	68	6.12	"
5	Ограждение пожарной лестницы	ИМ-79	9.90	4	39.60	Раздел 10.4-4
6	Пожарная лестница	ИМ-78	31.92	4	127.68	"
7	Стремянка на крышу	ИМ-7	33.69	1	33.69	Раздел 10.7-1
8	Стремянка в лифт. помещ.	ИМ-9	60.32	1	60.32	"
9	Площадка вход в лифт. помещ.	ИМ-10	49.58	1	49.58	"
10	Огражд. площ. входа в лифт. помещение	ИМ-11	4.85	1	4.85	"
11	Опорная труба радиостойки	ИМ-12	25.40	1	25.40	"
12	Трубостойка для крепл. мачты телеантенны	ИМ-13	34.05	1	34.05	"
13	Кронштейн для крепл. стойки телеантенны	ИМ-14	3.338	2	6.67	"
14	Металлическ. зонты.	ИМ-15	21.33	5	106.65	"
15		ИМ-16	32.99	1	32.99	"
16		ИМ-17	25.09	1	25.09	"
17	Кронштейн для крепл. радиаторов	ИМ-18	0.22	572	125.84	"
18	Крышка пожарного люка	ИМ-19	11.50	4	46.00	"
19	Крышка загруз. отверст. в плите маш. отделен.	ИМ-20	18.22	1	18.22	"
20	Огражден. балкона	ИМ-75	71.15	36	2561.4	Раздел 10.4-4
21		ИМ-76	26.93	36	969.48	"
22		ИМ-77	26.93	36	969.48	"
23	Огражден. лоджии	ИМ-74	61.05	9	549.45	"
24	Монорельс	ИМ-26	18.25	1	18.25	Раздел 10.7-1
25	Деталь крепления монорельса	ИМ-29	4.77	3	14.31	"
26	Переходные площадки	ИМ-80	45.4	6	272.4	Раздел 10.4-4
27		ИМ-81	47.4	3	142.2	"
28		ИМ-82	13.4	3	40.2	"
29	Декоратив. решетка	ИМ-85	52.0	9	468	"
30	Огражд. крыши	ИМ-84	16.63	18	300.0	"
	Итого				750.5	

NN п/п	Назначение	Марка	Вес марки кг	Кол-во шт. на блок-секц.	Общий вес на бл.-сек.	NN раб. черт. часть 10
1	Монтажные связи	ИМ-31	0.28	198	55.44	Раздел 10.7-1
2		ИМ-32	0.32	141	45.12	"
3		ИМ-36	0.35	27	9.45	"
4		ИМ-37	0.41	63	25.83	"
5		ИМ-38	0.32	9	2.88	"
6		ИМ-39	0.38	18	6.84	"
7		ИМ-40	0.55	9	4.95	"
8		ИМ-41	0.30	18	5.40	"
9		ИМ-46	0.49	9	4.41	"
10		ИМ-48	0.39	8	3.12	"
11		ИМ-50	0.28	180	50.40	"
12		ИМ-52	0.43	63	27.09	"
13		ИМ-55	0.56	18	10.08	"
14		ИМ-56	0.18	324	58.32	"
15		ИМ-57	0.22	162	35.64	"
16		ИМ-58	0.22	18	3.96	"
17		ИМ-61	0.42	95	39.90	"
18		ИМ-66	8.05	64	515.20	"
19		ИМ-68	0.09	4	0.36	"
	Итого				904.39	

Гл. инжен. К.Б.	Гл. конструкт. К.Б.	В. Болтинский	Вед. констр.	И. Пух.	
Гл. архит. пр-та	Гл. архит. пр-та	Я. Фельман	Ст. техник.	А. Есин.	
Нач. отдела	Нач. отдела	Г. Паченцева			
Гл. констр. пр-та	Гл. констр. пр-та	Ю. Красновидов			
		П. Афанасьев	Проверил		

Гл. ПО железобетону КБ Госстроя РСФСР

АКО-1

1971	9 эт. т. блок-секция 1б-2б-2б-3б /левая/ на 36 квартир.	Спецификация наружных стеновых панелей из легкого бетона толщиной 400 мм. Спецификация металлических изделий.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-13

11734-03 21

Наименование	N N п/п	Типоразмер	Марка	Марка гипсобетона	Марка керамзитобет.	Габариты мм: l мм	b мм	h мм	Показатели на изделие: При варианте из гипсобетона: Гипсобетон м³	Древесина м³	Сталь кг	Вес кг	При варианте из керамзитобет.: Керамзитобет м³	Сталь кг	Вес кг	Количество шт.: 1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7 эт	8 эт	9 эт	Всего на блок-секцию	Показатели на блок-секцию: При варианте из гипсобетона: Гипсобетона м³	Древесина м³	Сталь кг	Вес т	При варианте из керамзитобет.: Керамзитобет м³	Сталь кг	Вес т	N N рабочих чертежей часть 10
Перегородки	1	ПП-6	ПП6	35	75	620	80	2530	0,12	0,067	1,1	155	0,13	3,30	175	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5,40	0,315	49,5	7,0	5,85	148,5	7,9	Раздел 10.5-1
	2	ПП21	ПП21	"	"	2140	80	2530	0,46	0,031	2,2	540	0,43	5,66	580	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3,60	0,279	19,8	4,86	3,87	59,9	5,2	"
	3	ПП28	ПП28	"	"	2860	80	2530	0,40	0,030	2,2	540	0,43	6,52	580	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	7,20	0,54	39,6	9,72	7,74	117,4	10,4	"
	4	ПП16	ПП16	"	"	1600	80	2530	0,31	0,029	2,2	430	0,33	4,73	450	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	5,58	0,54	39,6	7,74	5,94	85,14	8,1	"
	5	ПП33	ПП33	"	"	3360	80	2530	0,64	0,044	3,3	870	0,68	7,33	920	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	21,76	1,58	118,8	31,3	24,5	263,9	33,1	"
	6	ПП39	ПП39	"	"	3900	80	2530	0,75	0,04	5,01	1010	0,79	8,38	1070	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	13,5	0,72	90,18	18,2	14,2	150,8	19,3	Раздел 10.4-4
	7	ПП43	ПП43	"	"	4300	80	2530	0,67	0,05	5,01	910	0,72	8,59	980	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6,03	0,45	45,09	8,2	6,48	77,3	8,8	"
	8	ПП50	ПП50	"	"	5000	80	2530	0,83	0,03	4,4	1110	0,86	9,54	1170	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	14,94	0,54	79,2	19,98	15,48	171,7	21,1	"
	9	ПП59-2	ПП59-2	"	"	5900	80	2530	0,98	0,067	5,5	1300	1,04	12,76	1410	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8,82	0,603	49,5	11,7	9,36	114,8	12,9	Раздел 10.5-1
Итого:		8	8																						162	86,47	6,01	481,8	118,26	93,6	1186,9	126,8	
Панели пола	1	П-3	П-3	75	100	3000	2400	60	0,39	0,035	3,53	530	0,43	15,34	600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	7,02	0,63	63,54	9,54	7,74	276,1	10,8	Раздел 10.5-1
	2	П-6	П-6	"	"	4000	2900	60	0,73	0,07	5,32	990	0,80	26,56	1120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	13,14	1,26	95,8	17,82	14,4	478,1	20,2	"
	3	П-7	П-7	"	"	3100	2100	60	0,34	0,05	2,94	470	0,39	13,27	550	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3,06	0,45	26,5	4,23	3,51	119,4	4,95	"
	4	П-8	П-8	"	"	3100	2600	60	0,52	0,05	3,60	710	0,58	19,08	810	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	14,04	1,35	97,2	19,2	15,7	515,2	21,9	"
	5	П-11	П-11	"	"	3450	1600	60	0,30	0,035	2,46	410	0,33	11,56	460	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,70	0,32	22,14	3,69	2,97	104,0	4,14	"
	6	П-13	П-13	"	"	4040	2900	60	0,64	0,065	4,00	870	0,70	22,59	990	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	5,76	0,59	36,0	7,83	6,30	203,3	8,91	"
	7	П-14	П-14	"	"	5760	2900	60	0,91	0,086	5,32	1240	1,00	30,80	1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8,19	0,774	47,9	11,2	9,0	277,2	12,6	"
	8	П-15	П-15	"	"	3140	2900	60	0,50	0,050	4,00	680	0,55	18,32	770	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4,50	0,45	36,0	6,12	4,95	164,9	6,93	"
	9	П-19	П-19	"	"	2700	1480	60	0,21	0,025	1,52	300	0,24	7,97	340	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	5,67	0,675	41,0	8,10	6,48	215,2	9,2	"
	10	П-20	П-20	"	"	2580	980	60	0,13	0,018	1,02	185	0,15	4,92	210	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3,51	0,486	27,5	5,0	4,05	132,8	5,7	"
	11	П-21	П-21	"	"	2960	1300	60	0,21	0,025	1,86	290	0,24	8,44	340	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1,89	0,23	16,74	2,61	2,16	76,0	3,1	"
	12	П-22	П-22	"	"	2240	2040	60	0,25	0,022	2,01	340	0,28	9,46	390	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2,25	0,20	18,1	3,06	2,52	85,14	3,5	"
Итого:																									180	71,75	7,42	528,42	98,4	79,78	2647,34	111,93	

Наименование	N N п/п	Типоразмер	Марка	Марка бетона	Габариты мм: l	b	h	Показатели на изделие: Бетон м³	Сталь кг	Вес кг	Количество шт.: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Всего на блок-секц.	Показатели на блок-секции: Бетон м³	Сталь кг	Вес т: Санкабины	Санкаб. с оборуд.	N N рабочих черт. часть 10
Объемные санкабины	1	СК-20.28А	СК-20.28А-2	200	2080	1820	2530	1,12	46,77	2800 (3120)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2,24	93,54	5,6	6,24	Раздел 10.8-1 (архитектурно-строит. часть)
	2		СК-20.28А-2Р								1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3,36	140,31	8,4	9,36	
	3		СК-20.28А-3								—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3,36	140,31	8,4	9,36	
	4		СК-20.28А-3В								—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1,12	46,77	2,8	3,12	
	5	СК-28.28А	СК-28.28А-2	200	2730	1600	2530	1,20	56,52	3000 (3300)	—	2	—	2	—	—	—	—	—	4	4,80	226,1	12,0	13,2	Раздел 10.8-2 (санитарно-строит. часть)
	6		СК-28.28А-2Р								2	—	2	—	2	—	—	—	—	6	7,20	339,1	18,0	19,8	
	7		СК-28.28А-3								—	—	—	—	—	2	2	2	—	6	7,20	339,1	18,0	19,8	
	8		СК-28.28А-3В								—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2,40	113,0	6,0	6,6	
	9	СК-28.28П	СК-28.28П-2	200	2730	1600	2530	1,20	56,52	3000 (3300)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2,40	113,0	6,0	6,6	
	10		СК-28.28П-2Р								1	—	1	—	1	—	—	—	—	3	3,60	169,5	9,0	9,9	
	11		СК-28.28П-3								—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	3,60	169,5	9,0	9,9	
	12		СК-28.28П-3В																1	1	1,20	56,5	3,0	3,3	
Итого:		3	12																	36	42,48	1946,73	106,2	117,2	

Примечание:

1. В скобках дан вес санкабин с оборудованием.

1971	9 эт. т. блок-секция 1б-2б-2б-3б (левая) на 36 квартир	Спецификации перегородок, панелей пола и объемных санкабин	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-14

КБ по железобетону Госстроя РСФСР

АКО-1

Гл. инжен. КБ | Гл. констр. КБ | Гл. архит. пр-та | Нач. отдела | Гл. констр. пр. | В. Болтинский | А. Фельман | Г. Паченцева | Ю. Красновидов | П. Афанасьев | Вед. конструк. | Ст. техник | Проверил | И. Пух | А. Есин

1173-03 22 лут

Спецификация столярных блоков в наружных стенах. Табл 1

№№ пп	переплеты	марка	наименование	ед. изм.	количество 1 этаж (типовой этаж) кв.1	кв.2	кв.3	кв.4	всего	№№ рабочих чертежей
1	спаренные	ОСВ 1	оконный блок со вставкой	шт.	—	—	1	—	1	Раздел 10.6-1 лист-2
2		ОСВ 2			—	1	—	—	1	лист-4
3		ОСВ 3			—	—	—	1	1	лист-6
4		ОСВ 4			1	—	—	—	1	лист-8
5		ОС 15-05	оконный блок	шт.	1	1	—	—	2	ГОСТ 11214-65
6		ОС 15-12			—	—	—	1	1	"
7		ОС 15-14			—	1	1	1	3	"
8		БР 22-07	балконный блок	шт.	—	1	—	1	2	"
9		БР 22-07н			1	—	—	—	1	"
		ИД 11	подоконная доска		—	—	1	2	3	часть 10 раздела 10.6-1
		ИД 12			1	2	2	2	7	лист 39
		ИД 13	"		1	1	—	—	2	
		ИД 15	"		1	1	—	—	2	
1	раздельные	ОРВ 1	оконный блок со вставкой	шт.	—	—	1	—	1	лист-11
2		ОРВ 2			—	1	—	—	1	лист-15
3		ОРВ 3			—	—	—	1	1	лист-13
4		ОРВ 4			1	—	—	—	1	лист-17
5		ОР 15-05	оконный блок	шт.	1	1	—	—	2	ГОСТ 11214-65
6		ОР 15-12			—	—	—	1	1	"
7		ОР 15-14			—	1	1	1	3	"
8		БР 22-07	балконный блок	шт.	—	1	—	1	2	"
9		БР 22-07н			1	—	—	—	1	"
10		ИД 11р	подоконная доска		—	—	1	2	3	часть 10 раздела 10.6-1 лист 39
11		ИД 12р	"		1	2	2	2	7	
12		ИД 13р	"		1	1	—	—	2	
13		ИД 15р	"		1	1	—	—	2	

Спецификация встроенного и кухонного оборудования. Табл 3

№№ пп	марка	наименование	ед. изм.	количество 1 этаж (типовой этаж) кв.1	кв.2	кв.3	кв.4	всего	№№ рабочих чертежей
1	Ш 9-1	шкаф	шт	—	—	—	1	1	Раздел 9-1 лист АСД-39
2	Ш 12-1			—	—	—	—	—	Раздел 9-6 лист АД-9
3	Ш 13			—	1	1	—	2	Раздел-9.6 лист АД-10
4	ША 3	шкаф антресольный	шт	—	—	—	1	1	Раздел 9-1 лист АСД-38
5	ША 8			—	—	—	1	1	Раздел 9.1 лист АСД-48
6	ША 20-1			—	—	—	—	—	Раздел-9.6 лист АД-9
7	ША 21			—	1	—	—	1	Раздел-9.6 лист АД-10

Спецификация дверных блоков и погонажных изделий Табл. 2

№№ п.п	марка	наименование	ед. изм.	количество 1 этаж (типовой этаж) кв.1	кв.2	кв.3	кв.4	всего	№№ рабочих чертежей
1	Д 8 А1 С	дверной блок	шт.	—	—	—	1	1	ГОСТ 6629-64
2	Д 8 ПС			1	1	1	—	3	
3	Д 8 А	дверной блок	шт.	—	1	1	—	2	"
4	Д 8 П			—	—	—	2	2	
5	Д 10(1) А	дверной блок	шт.	—	1	1	1	3	"
6	Д 10(1) П			1	1	1	1	4	
7	Д 10 А	дверной блок	шт.	—	—	—	1	1	"
8	Д 10 П			—	1	—	1	2	
9	Д 17 А	дверной блок	шт.	—	1	—	—	1	"
10	Д 17 П			1	—	1	1	3	
11	Д 18 А	дверной блок	шт.	—	—	1	—	1	"
12	Д 18 П			1	1	—	1	3	
13	Ф 6	фрамуга		—	—	—	1	1	ГОСТ 6629-88
14	тип 1	наличник	п.м	3.10	17.60	17.60	19.70	58.00	ГОСТ 8242-63
15	тип 2			36.40	34.50	30.00	42.50	143.50	
16	тип 3			6.20	10.50	8.50	12.60	37.80	
17	ИД 6			5.02	10.60	10.60	10.60	36.82	Раздел 10.6-1 лист-38
18		планшус		38.40	75.88	75.88	102.64	292.80	ГОСТ 8242-63
19	ИД-42	рейка ограждения балкона и лоджии		29.40	28.40	35.40	54.60	143.80	Раздел 10.9-4
20	ИД-43	поручень балкона и лоджии		9.90	9.90	5.90	9.10	24.80	лист

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ША 21-1	шкаф антресольный	шт.	—	—	1	—	1	Раздел-9.6 лист АД-11
9	ША-23			1	—	—	—	1	Раздел-9.6 лист АД-11
10	ОК-2	стол-шкаф	шт	1	1	1	1	4	Часть-8 раздела 8.1 лист АСД-35
11	ОК-3	шкаф под мойку		1	1	1	1	4	
12	ОК-1	шкаф настенный		1	1	1	1	4	

1971	9 эт. 1 подъезд 16-25-26-35/левая/ на 36 квартир	Спецификация столярных изделий на один этаж.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-15

КБ по железобетону Госстроя РСФСР
АК0-1
ГА. инженер. КБ Б. Болтянский
ГА. констр. КБ Э. Фельман
ГА. архитект. В. Сергеев
Нач. отдела Ю. Краснобаев
ГА. констр. пр. Г. Пахенькова
ГА. архитект. А. Смирнова
Нач. сект. констр. Р. Гурьева
Нач. сект. архит. Вед. констр. О. Скобелева
Гл. архитектор проекта Н. Афанасьев
Проверил

Спецификация столярных блоков в наружных стенах

ТАБЛ. 4.

№№ пп.	Толщина наружных стен	Марка		Наименование элементов заполнения проемов	Размеры мм.	Ед. изм.	Количество на 1-й этаж (типовой)		Количество на блок-секцию		Объем древесины в м³ на 1 элемент	Объем древесины в м³ на блок-секцию	№№ рабочих чертежей	
1		ОСВ1	ОС15-14	Оконный блок	1346×1464×94	шт.	1	1	9	9	0.100	0.900	Часть-10 раздел-10.6-1 лист-2	Гост 11214-65
2	250		ИД1	Вставка	690×1464×120			1		9	0.037	0.333		Разд-10.6-1 лист-21
3	300		ИД1		690×1464×170			1		9	0.048	0.432		
4	250-300		БС22-07	Балконный блок	700×2199×94			1		9	0.090	0.810		Гост 11214-65
5			ОС15-12	Оконный блок	1164×1464×94			1		9	0.100	0.900		
6		ОСВ2	ОС15-18		1749×1464×94	шт.	1	1	9	9	0.127	1.143	лист-4	
7	250		ИД2	Вставка	775×1464×120			1		9	0.040	0.360		Раздел 10.6-1 лист-22
8	300		ИД2		775×1464×170			1		9	0.051	0.459		
9	250-300		ОС15-14	Оконный блок.	1346×1464×94			1		9	0.100	0.900		Гост 11214-65
10		ОСВ3	ОС15-14			шт.	1	1	9	9			лист-6	
11	250		ИД3	Вставка	1330×1464×120			1		9	0.060	0.540		Раздел 10.6-1 лист-23
12	300		ИД3		1330×1464×170			1		9	0.076	0.684		
13	250-300		БС22-07	Балконный блок	700×2199×94			1		9	0.090	0.810		Гост 11214-65
14			ОС15-12	Оконный блок	1164×1464×94			1		9	0.100	0.900		
15		ОСВ4	ОС15-14		1346×1464×94	шт.	1	1	9	9		0.900	лист-8	
16	250		ИД4	Вставка	1415×1464×120			1		9	0.094	0.846		Раздел 10.6-1 лист-24
17	300		ИД4		1415×1464×170			1		9	0.111	0.999		
18	250-300		ОС15-18	Оконный блок	1749×1464×94			1		9	0.127	1.143		Гост 11214-65
19		ОС09-15			1471×864×94	шт.	2		16		0.058	0.928	Гост 11214-65	
20		ОС15-05			455×1464×94		2		18		0.051	0.918		
21		ОС15-12			1164×1464×94		1		9		0.100	0.900		
22		ОС15-14			1346×1464×94		3		27			2.700		
23		БС22-07		Балконный блок	700×2199×94		2		18		0.09	1.620		
24		БС22-07Н					1		9			0.810		
25		ИД11		Подоконная доска.	86×34×1240 (136)		3		27		0.004 (0.006)	0.108 (0.162)	Часть-10 раздел 10.6-1 лист 39	
26		ИД12			86×34×1470 (136)		7		63		0.004 (0.007)	0.252 (0.441)		
27		ИД13			86×34×1870 (136)		2		18		0.005 (0.009)	0.090 (0.162)		
28		ИД15			256×34×530 (306)		2		18		0.005 (0.006)	0.090 (0.108)		

№№ пп.	Толщина наружных стен	Марка		Наименование элементов заполнения проемов	Размеры мм.	Ед. изм.	Количество на 1-й этаж (типовой)		Количество на блок-секцию		Объем древесины в м³ на 1 элемент	Объем древесины в м³ на блок-секцию	№№ рабочих чертежей	
1		ОРВ1	ОР15-14	Оконный блок	1353×1464×180	шт.	1	1	9	9	0.136	1.224	Часть-10 раздел-10.6-1 лист-11	Гост 11214-65
2	350		ИД1Р	Вставка	690×1464×220			1		9	0.062	0.558		Часть-10 раздел 10.6-1 лист-26
3	400		ИД1Р		690×1464×270			1		9	0.076	0.684		
4	350-400		БР22-07	Балконный блок	706×2199×180			1		9	0.117	1.053		Гост 11214-65
5			ОР15-12	Оконный блок.	1153×1464×180			1		9	0.132	1.188		
6		ОРВ2	ОР15-18		1747×1464×180	шт.	1	1	9	9	0.174	1.566	лист-15	
7	350		ИД2Р	Вставка	775×1464×220			1		9	0.073	0.657		Раздел 10.6-1 лист-27
8	400		ИД2Р		775×1464×270			1		9	0.087	0.783		
9	350-400		ОР15-14	Оконный блок	1353×1464×180			1		9	0.136	1.224		Гост 11214-65
10		ОРВ3	ОР15-14			шт.	1	1	9	9			лист-13	
11	350		ИД3Р	Вставка	1330×1464×220			1		9	0.103	0.927		Раздел 10.6-1 лист-28
12	400		ИД3Р		1330×1464×270			1		9	0.120	1.080		
13	350-400		БР22-07	Балконный блок	706×2199×180			1		9	0.117	1.053		Гост 11214-65
14			ОР15-12	Оконный блок	1153×1464×180			1		9	0.132	1.188		
15		ОРВ4	ОР15-14		1353×1464×180	шт.	1	1	9	9	0.136	1.224	лист-17	
16	350		ИД4Р	Вставка	1415×1464×220			1		9	0.107	0.963		Раздел 10.6-1 лист-29
17	400		ИД4Р		1415×1464×270			1		9	0.125	1.125		
18	350-400		ОР15-18	Оконный блок	1747×1464×180			1		9	0.174	1.566		Гост 11214-65
19		ОРО9-15			1478×864×180	шт.	2		16		0.081	1.296	Гост 11214-65	
20		ОР15-05			486×1464×180		2		18		0.070	1.260		
21		ОР15-12			1153×1464×180		1		9		0.132	1.188		
22		ОР15-14			1353×1464×180		3		27		0.136	3.672		
23		БР22-07		Балконный блок	706×2199×180		2		18		0.117	2.106		
24		БР22-07Н					1		9			1.053		
25		ИД11Р		Подоконная доска.	100×34×1240 (150)		3		27		0.0042 (0.0063)	0.1134 (0.1701)	Часть-10; раздел-10.6-1 лист 39	
26		ИД12Р			100×34×1470 (150)		7		63		0.0050 (0.0075)	0.3150 (0.4725)		
27		ИД13Р			100×34×1870 (150)		2		18		0.0064 (0.0095)	0.1152 (0.1710)		
28		ИД15Р			270×34×530 (320)		2		18		0.0040 (0.0058)	0.0882 (0.1044)		

1971	9 эт. т. блок-секция 1б. 2б. 2б. 3б/левая/ на 36 квартир.	Сводная спецификация столярных изделий.	Типовой проект 125-04	Часть 1	Лист АС-16

КБ по железобетону Госстроя РСФСР — АКО-1

Гл. инжен. КБ; Гл. констр. КБ; Гл. архит.; Нач. отдела; Гл. конст. пр-та; В. Болтинский; Я. Фельман; В. Сергеев; Ю. Красновидов; П. Афанасьев; Гл. архит. пр.; Нач. сект. конст.; Нач. сект. архит.; Вед. констр.; Ст. архитект.; Г. Паченцев; А. Смирнова; Р. Гурьева; О. Скобелева

Двери во внутренних и наружных стенах

Табл. 5

NN п.п.	Марка	Наименование	Размеры мм	Ед. изм.	Количество на (1 этаж, типовой)	Количество на блок-секцию	Объем древесины в м³ на 1 элемент	Объем древесины в м³ на блок-секцию	NN рабочих чертежей
1	Д8 ЛПС	Дверной блок	874 х 2075 х 74	шт.	1	9	0.091	0.819	ГОСТ 6629-88
2	Д8 ППС				3	27		2.457	"
3	Д8 А	Дверной блок	874 х 2075 х 74	шт.	2	18	0.072	1.296	"
4	Д8 П				2	18			"
5	Д 18(1) А	Дверной блок	600 х 2000 х 50	шт.	3	27	0.036	0.972	"
6	Д 18(1) П				4	36		1.296	"
7	Д 18 А	Дверной блок	674 х 2075 х 74	шт.	2	18	0.059	1.062	"
8	Д 18 П				—	—		—	"
9	Д 17 А	Дверной блок	874 х 2075 х 74	шт.	1	9	0.048	0.432	"
10	Д 17 П				3	27		1.296	"
11	Д 18 А	Дверной блок	774 х 2075 х 74		1	9	0.044	0.396	"
12	Д 18 П				3	27		1.188	"
13	Ф6	Фрамуга	800 х 500 х 40	шт.	1	9	0.004	0.036	ГОСТ 6629-53
14	ДВ 8-8	Дверной блок	886 х 2088 х 94		1эт. - 1	1	0.116	0.116	СЕРИЯ 1-15-7 АЛЬБОМ 3 АИСМ 115
15	ДВН.9-8		1476 х 2088 х 94		1эт. - 2	2	0.137	0.274	АИСМ 115
16	ДВН.8-9		1276 х 2088 х 94		1эт. - 1	1	0.168	0.168	АИСМ 115
17	ДСТ8	Дверной блок	886 х 1888 х 94	шт.	(1)	1	0.090	0.090	СЕРИЯ 1-15-7 АЛЬБОМ 3 АИСМ 114

Встроенное и кухонное оборудование

Табл.

NN п.п.	Марка	Наименование	Размеры мм	Ед. изм.	Количество на (1 этаж, типовой)	Количество на блок-секцию	Объем древесины в м³ на 1 элемент	Объем древесины в м³ на блок-секцию	NN рабочих чертежей
1	Ш2-1	Шкаф	500 х 2500 х 1610	шт.	1	9	0.11154	1.00386	РАЗДЕЛ 8.1 АИСМ АСВ-39
2	Ш12-1		470 х 1000 х 2045		—	—	0.13109	—	РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-9
3	Ш13		1430 х 600 х 2045		2	18	0.09688	1.74393	РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-10
4	ША3	Шкаф антресольный	1430 х 1480 х 455		1	9	0.05796	0.52164	РАЗДЕЛ 8.1 АИСМ АСВ-38
5	ША8		1430 х 1670 х 455		1	9	0.06672	0.60048	РАЗДЕЛ 8.1 АИСМ АСВ-41
6	ША20-1		1620 х 1000 х 455		—	—	—	—	РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-8
7	ША21		1430 х 1860 х 455		1	9	0.06929	0.62361	РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-11
8	ША21-1				1	9			РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-11
9	ША23		1400 х 1070 х 455		1	9	0.05160	0.464	РАЗДЕЛ 9.6 АИСМ АД-11
10	ОК-2	Стол-шкаф	600 х 800 х 850	шт.	4	36	0.05716	2.058	РАЗДЕЛ 9-1 АИСМ АСВ-35
11	ОК-3	Шкаф под мойку	500 х 500 х 845		4	36	0.02363	0.951	—"—
12	ОК-1	Шкаф настенный	1000 х 300 х 620		4	36	0.02737	0.985	—"—

Погонажные и прочие изделия

Табл. 6

NN п.п.	Марка	Наименование	Размеры мм	Ед. изм.	Количество на (1 этаж, типовой)	Количество на блок-секцию	Объем древесины в м³ на 1 элемент	Объем древесины в м³ на блок-секцию	NN рабочих чертежей
1	НД-9	Щит амбурный.	1180 х 2040 х 94	шт.	1эт. - 1	1	0.061	0.061	РАЗДЕЛ 10.6-1 АИСМ-36
2	НД-23		1500 х 1180 х 96		—"— - 4	4	0.003	0.012	—"— АИСМ-36
3	НД-26		1370 х 3420 х 96		—"— - 1	1	0.088	0.088	—"— АИСМ-36
4	НД-36		500 х 2040 х 94		—"— - 1	1	0.034	0.034	—"— АИСМ-36
5	НД-39		1300 х 1960 х 96		—"— - 1	1	0.062	0.062	—"— АИСМ-36
6	НД-40		1370 х 3020 х 96		—"— - 1	1	0.081	0.081	—"— АИСМ-36
7	-								
8	НД-42	Ренка балкон. ножж.	120 х 22 х 1000	п.м.	143.80	1294.20	0.00256	3.313	РАЗДЕЛ 10.4-4 АИСМ
	НД-43	Вертучень балк. ножж.	160 х 16 х 1000		24.80	223.20	0.00264	0.584	
9	НД-17	Крышка люка на крышу	950 х 1000 х 52	шт.	—	1	0.048	0.048	РАЗДЕЛ 10.6-1 АИСМ-40
10	НД-18		1130 х 1260 х 30		—	1	0.033	0.033	—"— АИСМ-41
11	НД-19	Люк лаза на крышу	1160 х 1260 х 1000		—	1	0.331	0.331	АИСМ-42
12	НД-10	Дверца ревизий	300 х 300 х 40		1, 3, 5, 9 эт. 3	12	0.003	0.036	АИСМ-38
13	НД 6	Наличник	18 х 50 х 1800	п.м.	36.82	331.38	0.0009	0.298	—"— АИСМ-38
14	НП1		13 х 74 х 1800		58.00	522.00	0.0010	0.522	ГОСТ 8242-65
15	НП2		13 х 54 х 1800		143.50	1291.50	0.0007	0.904	
16	НП3		13 х 34 х 1800		37.80	340.20	0.0004	0.136	
17		Планки уг.	16 х 54 х 1800		292.80	2635.20	0.0005	1.318	

1971	9 эт. т. блок-секция 1Б 2Б 2В 3Б/левая/ на 36 квартир	Сводная спецификация сборных изделий	Типовой проект 125-84	Часть 1	Альбом АС-17			

КБ по жилищному строительству Госстроя РСФСР
Гл. инженер КБ Гл. архитектор пр. Гл. архитектор Нач. сектора Нач. сектора Вед. конструктор Гл. архитектор
Гл. инженер КБ Гл. конструктор пр. Нач. отдела Гл. архитектор
А 0-1
Г. Панченцева А. Смирнова Р. Гурьева О. Скобелева
Проверил
А. Боймикин Э. Фельман Б. Сергеев Ю. Красновидов В. Афанасьев
gost.e-ecolog.ru
