ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-300

АЭРОТЕНКИ
С РАССРЕДОТОЧЕННЫМ ВПУСКОМ СТОЧНЫХ ВОД

АР-4-9.0-4.4

АЛЬБОМ I
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

15015-01
ЦЕНА 0-53

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978 г.

Заказ № 1171 Тираж 700 экз.

15015-01

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-300

АЭРОТЕНКИ С РАССРЕДОТОЧЕННЫМ ВПУСКОМ СТОЧНЫХ ВОД АР-4-9,0.-4.4

Состав проекта:

Альбом I	- Пояснительная записка
Альбом II	- Технологическая часть. Нестандартизированное оборудование
Альбом III	- Строительная часть. Секции I, II и III.
Альбом IУ	- Строительная часть. Узлы, детали, сборные железобетонные элементы
Альбом У	- Заказные спецификации
Альбом УI	- С м е т ы

АЛЬБОМ I

РАЗРАБОТАН
Проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Гл. инженер института Мясников

Гл. инженер проекта Свердлов

Технический проект УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем. Приказ № 164 от 22 июля 1974г. Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования. Приказ № _____ от _____ 197 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
I. Общая часть	4
2. Технологическая часть	6
3. Строительная часть	9
4. Указания по привязке	20
5. Приложения	22

Записка составлена:

Общая и технологическая части — Старицына
Строительная часть — Лоуцкер

Типовой проект разработан
в соответствии с действующими
нормами и правилами

Главный инженер
проекта И.Свердлов

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочие чертежи аэротенков с рассредоточенным впуском сточных вод АР-4-9.0-4.4 (секции I,II и III) разработаны по плану типового проектирования Госгражданстроя на основании технического проекта: "Здания и сооружения для биологической очистки сточных вод пропускной способностью 70-280 тыс.м^3/сутки", выполненного ЦНИИЭП инженерного оборудования и утвержденного Госгражданстроем 22 июля 1974 года, приказ № 164.

I.I. Назначение и область применения

Аэротенки применяются в составе очистных канализационных станций биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

В основу технологических расчетов аэротенков положены указания СНиП II-32-74. Концентрация загрязнений, поступающих на аэротенки осветленных сточных вод по $БПК_{полн}$ принята 140, 200 и 280 мг/л.

Аэротенки запроектированы четырехкоридорные с рассредоточенным впуском сточных вод и переменным объемом регенератора.

Разработаны 3 секции аэротенков, из которых следует набирать требуемый по расчету объем.

Размер секции аэротенка 36 м (ширина одного коридора - 9 м, длина - 90 м, рабочая глубина - 4,7 м). Изменение длин секций в пределах рекомендуемых размеров 90-114 м производится добавлением вставок длиной 6 м.

Пропускная способность аэротенков 200.000 ÷ 400.000 м^3/сутки в зависимости от расчетной концентрации $БПК_{полн}$ осветленных сточных вод, поступающих на аэротенки и принятого числа секций.

Основные технологические и технико-экономические показатели приведены в таблице № I.

Таблица I

I.2. Основные показатели проекта

Наименование	Единица измерения	Показатели по секциям		
		Секция I	Секция II	Секция III
Гидравлический объем секции	$м^3$	I4840-I8800	I4840-I8800	I4840-I8800
Расчетная пропускная способность секции	$м^3$/час	2I50-4I80	2I50-4I80	2I50-4I80
Строительный объем секции	$м^3$	2III4	I7640	I3935
Площадь застройки	$м^2$	4259	3524	2790
Сметная стоимость:				
общая	тыс.руб.	2I3,93	I78,78	I59,08
строительно-монтажных работ	"	2I0,64	I75,39	I55,74
оборудования	"	3,34	3,34	3,34
I $м^3$ сооружения	руб	9,45	9,3	I0,38

ПРИМЕЧАНИЕ: гидравлический объем секции принят между несущими стенками, строительный объем - между деформационными швами.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Система подачи воды и ила, отвода иловой смеси

Аэро... с распределительным каналом осветленной воды и иловым каналом. Осветленная вода от вторичных отстойников подводится по общим трубопроводам к распределительному каналу осветленной воды сечением I800xI800 мм. По продольным перегородкам аэротенка устраиваются подающие лотки сечением I200xI200 мм – один лоток на 2 коридора аэротенка. Впуск воды в аэротенк осуществляется через незатопленные регулируемые водосливы, расположенные вдоль подающих лотков через каждые I2 м. Циркулирующий активный ил подается в начале первого коридора каждой секции аэротенка от насосной станции активного ила через иловой канал сечением I800xI800 мм. Впуск циркулирующего ила осуществляется также через незатопленный регулируемый водослив, расположенный в иловой части подающего лотка. В зависимости от принятой схемы работы аэротенков, впуск сточных вод может осуществляться в одной точке или рассредоточенно; при этом расходы, подаваемые через каждый водослив, могут быть различными. Нелинейно-рассредоточенный впуск обеспечивает равномерные нагрузки на ил и возможность работы сооружений в форсированном режиме. Рассредоточенный впуск воды позволяет изменять объем регенератора в широких пределах с шагом 3-4%.

Иловая смесь из секций аэротенка через открытые водосливы с тонкой стенкой поступает в канал иловой смеси и затем по общим отводящим трубопроводам на вторичные отстойники.

Для отключения секций аэротенка в начале подающих лотков устанавливаются щитовые затворы. Щитовые затворы устанавливаются также на впуске циркулирующего активного ила из илового канала в иловую часть подающих лотков.

В распределительном канале осветленной воды после подающих трубопроводов и в канале иловой смеси перед отводящими трубопроводами устраиваются пазы для съемных щитовых затворов – шандор из антисептированных деревянных брусьев размерами 200x200 мм, устанавливаемых при отключении водоводов или ремонте каналов.

Опорожнение секций аэротенков предусмотрено трубопроводами Ду 300.

2.2. Подача воздуха

Сжатый воздух подается в аэротенк магистральным воздуховодом, распределяется по секциям разводящими воздуховодами, на каждом из которых устанавливается задвижка и измеритель расхода – труба Вентури.

Аэрация иловой смеси принята через фильтросные пластины, общее число которых назначено, исходя из удельного расхода воздуха 80–120 л/мин на одну пластину.

В первом и втором коридорах каждой секции аэротенка предусмотрено по 3 ряда фильтросных каналов, в третьем и четвертом – по 2 ряда. Каждый ряд разделен на три блока, к которым подведены воздушные стояки Ду 200. Отключение стояков предусмотрено путем удаления монтажной фланцевой вставки на отводе к стояку с установкой заглушки.

Скорости движения воздуха приняты: 10–25 м/с – для воздуховодов и 4–8 м/с для стояков.

Для аэрирования каналов от разводящих воздуховодов предусмотрена прокладка по стенам каналов самостоятельных трубопроводов с отключающими задвижками. Аэрируются каналы отдельными стояками Ду 25 мм с открытым концом.

Равномерно по длине разводящих воздуховодов устанавливаются стандартные подвижные опоры.

2.3. Расчетные параметры сооружений

Для предварительных расчетов при проектировании сооружений в таблице № 2 приведены основные параметры секции аэротенка.

Таблица № 2

Основные параметры аэротенков

Объем одной секции аэротенка в м³	Пропускная способность секции, м³/ч			Потребный расход воздуха м³/ч			Общее количество фильтросных пластин, шт.		
	$БПК_{полн}$ мг/л			$БПК_{полн}$ мг/л			$БПК_{полн}$ мг/л		
	I40	200	280	I40	200	280	I40	200	280
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
90	I4840	3300	2650	2150	I4500 / II300	I7500 / I3600	20250 / I6000	2250	2700	3100
96	I5830	3520	2830	2295	I5500 / I2I00	I8700 / I4500	2I600 / I7000	2400	2900	3350
I02	I6820	3740	3000	2440	I6500 / I2850	I9800 / I5350	23600 / I8000	2550	3000	3550
I08	I78I0	3960	3I80	2580	I7500 / I3600	2I000 / I6300	24300 / I9000	2700	3200	3750
II4	I8800	4I80	3360	2725	I8500 / I4350	22200 / I7350	25600 / 20000	2850	3400	3950

В числителе приведен потребный расход воздуха в нормальных условиях (P = 760 мм.рт.ст, T = 20°C), в знаменателе - расход сжатого воздуха.

2.4. Технологический контроль

В проекте предусмотрено для каждой секции измерение расходов осветленной воды - на подвижных водосливах в подающих лотках; циркулирующего активного ила - на подвижных водосливах в иловой части подающих лотков; воздуха - с помощью труб Вентури на разводящих воздуховодах.

В проекте также предусмотрен замер температуры осветленной воды, подаваемой в аэротенки и иловой смеси (приборы устанавливаются на канале осветленной воды и канале иловой смеси при привязке проекта).

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.I. Природные условия строительства и технические условия на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" СН-227-70, изменениями и дополнениями к ней, утвержденными приказом Госстроя СССР № 201 от 26 сентября 1974г., опубликованными в бюллетене строительной техники № 12 за 1974г., а также серией 3.900-2 "Унифицированные сборные железобетонные конструкции водопроводных и канализационных емкостных сооружений.

- расчетная зимняя температура наружного воздуха ..... - 30°С
- скоростной напор ветра - для I географического района ..... - 27 кг/м2
- вес снегового покрова - для II района ..... -100 кг/м2
- рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют
- грунты в основании непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:

$\gamma_0 = 1{,}8$ т/м^3 $\quad \varphi = 20^0$ $\quad C^н = 0{,}02$ кг/см2 $\quad E = 150$ кг/см2,

что соответствует нагрузочным схемам по серии 3.900-2.

- сейсмичность района строительства не выше 6 баллов
- территория без подработки горными выработками.

Также разработаны дополнительные варианты проекта применительно к следующим природно-климатическим условиям:

- расчетная зимняя температура воздуха ..... - 20°С;
- скоростной напор ветра для I географического района ..... - 27 кг/м2
- вес снегового покрова для II района ..... - 70 кг/м2
- расчетная зимняя температура воздуха ..... - 40°С
- скоростной напор ветра для I географического района ..... - 27 кг /м2
- вес снегового покрова для IУ района ..... -150 кг /м2

Проект предназначен для строительства в сухих легкофильтрующих грунтах. При строительстве в слабофильтрующих грунтах должны быть проведены технические мероприятия, исключающие возможность появления фильтруемой из сооружения воды в уровне подготовки днища и ниже его на 50 см.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макропористых и водонасыщенных грунтах, в условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т.п.

3.2. Объемно-планировочные решения

В составе проекта разработано 3 секции аэротенков:

Секция I - крайняя со средней разделительной стенкой;

Секция II - средняя;

Секция III - крайняя без средней разделительной стенки.

Из указанных секций следует набирать требуемый объем сооружения.

Размеры секций в плане соответственно 43,5 х 90; 86х90; 28,5 х 90 м. Глубина - 5,11 м

Для получения длины сооружения больше разработанной в каждой секции предусмотрены вставки длиной 6,0 м.

Переход от разработанной длины к требуемой производится путем добавления различного количества вставок, местоположение которых в плане сооружения см. на чертежах.

Максимальная длина сооружения 114 м.

3.3. Конструктивные решения

Днище - плоское, толщиной 140 мм, из монолитного железобетона, армируется сварными сетками и каркасами.

Стены - из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-2: заделываемых в паз днища.

Углы стен - монолитные железобетонные.

Подающие лотки аэротенков - из сборных железобетонных изделий индивидуального изготовления устанавливаются на перегородках по сборным железобетонным балкам.

Канал осветленной воды и иловой канал также из сборных железобетонных изделий индивидуального изготовления устанавливаются на опоры из колец по серии 3.900-2, выпуск 6.

Участки каналов в месте расположения щитовых затворов - монолитные.

Проходные мостики из сборных железобетонных плит по серии ИС-01-04, укладываются на подающем лотке.

Проходные мостики из сборных железобетонных плит по серии ИС-01-04, укладываются на подающие лотки.

Стыки стеновых панелей консольного типа (ПС-1; ПС-4) между собой и с угловыми панелями (ПС-2; ПС-5) - шпоночные, выполняются путем инъектирования зазора между стеновыми панелями цементно-песча-

ным раствором.

Стыки угловых панелей (ПС-2; ПС-5) и панелей, работающих по плитной схеме (ПС-8; ПС-6; ПС-7) жесткие, на сварке выпусков горизонтальной арматуры.

Лестницы и ограждения - металлические.

Материалы. Для железобетонных конструкций стен, днища и сборных железобетонных элементов в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в зимний период приняты следующие марки бетона.

Таблица № 8

Расчетная температура наружного воздуха	Наименование конструкции	Проектная марки бетона в возрасте 28 дней		
		По прочности на сжатие кг/см2	По морозостойкости: МРЗ	По водонепроницаемости ГОСТ 4800-59
- 20°С	стены	200	МРЗ I00	В4
	днище	200	МРЗ 50	В4
	лотки	200	МРЗ I50	В6
- 30°С	стены	200	МРЗ I50	В6
	днище	200	МРЗ I00	В4
	лотки	300	МРЗ 200	В6
- 40°С	стены	300	МРЗ 200	В6
	днище	200	МРЗ I50	В6
	лотки	400	МРЗ 300	В8

Требования к бетону по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и виду цемента для его приготовления уточняются при привязке проекта по серии 3.900-2, выпуск I, в зависимости от расчетной зимней температуры наружного воздуха.

Цементно-песчаный раствор для замоноличивания безарматурных стыков шпоночного типа изготовляется в соответствии с "Рекомендациями по замоноличиванию цементно-песчаным раствором стыков шпоночного типа в сборных железобетонных водосодержащих емкостях (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 1967г.).

Все арматурные стыки элементов замоноличиваются плотным бетоном марки "300" на щебне мелкой фракции. Бетонная смесь для замоноличивания стыков должна приготовляться на тех же материалах, что и основные конструкции и в соответствии с "Рекомендациями по замоноличиванию вертикальных и горизонтальных стыков емкостей бетоном (раствором) на напрягающем цементе (НИИЖБ, 1968г.).

Бетонная подготовка и технологическая набетонка выполняются из бетона М-100.

Для торкретштукатурки применяется цементно-песчаный раствор состава 1:3.

Рабочая арматура диаметром 10мм и более принята по ГОСТ 5781-75 класса АШ из стали марки 25Г2С периодического профиля с расчетным сопротивлением R_a = 3400 кг/см2; распределительная арматура - по ГОСТ 5781-75 класса АI из стали марки ВСТ 3 пс 2. Требования к арматуре уточняются при привязке проекта по серии 3.900-2 выпуск I табл. 3.

В качестве компенсаторов для деформационных швов приняты прокладки резиновые для гидроизоляционных шпонок ТУ 38-105831-75, выпускаемые Свердловским заводом РТИ Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

3.4. Отделка и мероприятия по защите от коррозии

Монолитные участки стен со стороны воды торкретируются на толщину 20 мм с последующей затиркой цементным раствором.

Торкретштукатурка наносится слоями по 10 мм.

Со стороны земли монолитные участки стен затираются цементным раствором, а выше планировоч-

ных отметок штукатурятся.

Монолитные участки стен и панели со стороны земли окрашиваются горячей битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке битумом, разведенном в бензине.

Торкретштукатурка на днище наносится поярусно, для создания технологического уклона.

Минимальная толщина торкретштукатурки на днище - 20 мм.

Все металлоконструкции, соприкасающиеся с водой, окрашиваются лаком ХСЛ или ХС-76 за 3 раза по огрунтовке ХС-010 или ХСГ-26 за 2 раза.

Закладные детали для сварки несущих конструкций оцинковываются.

Металлические конструкции лестниц, площадок и ограждений окрашиваются масляной краской за 2 раза по огрунтовке.

Металлические кронштейны, находящиеся в земле, обетонируются по сетке.

3. 5. Расчетные положения

Расчет железобетонных конструкций выполнен в соответствии с требованиями главы СНиП П-21-75 и других глав СНиПа.

Стеновые панели ПС-I; ПС-4, работающие в вертикальном направлении как консольные плиты, рассчитаны на нагрузки гидростатического давления воды и бокового давления грунта при различной их комбинации.

Угловые панели ПС-2; ПС-3; ПС-5; ПС-6; ПС-7 работают в двух направлениях, как составная часть пластинок, опертых по контуру и загруженных гидростатическим давлением воды и боковым давлением грунта при различной их комбинации.

Перегородочные панели ПГ-I; ПГ-2; ПГ-3 рассчитаны на ветровую нагрузку, а панели ПГ-I; ПГ-2 также на нагрузку от распределительных лотков.

Днище рассчитано как балка на упругом основании переменного сечения на счетно-вычислительной

машине Минск-I по программе "АРБУС-I" на сосредоточенные усилия, передающиеся через заделку стеновых панелей в пазы днища и равномерно-распределенную нагрузку от воды.

Расчет произведен при модуле деформации грунта E = 150 кг/см2.

3.6. Соображения по производству работ

Проект разработан для условий производства работ в летнее время.

При производстве работ в зимнее время в проект должны быть внесены коррективы, соответствующие требованиям производства работ в зимних условиях согласно действующим нормам и правилам.

Земляные работы должны выполняться с соблюдением требований СНиП Ш-8-76 и других глав СН и Па. Способы разработки котлована и планировка дна должны исключать нарушение естественной структуры грунта основания.

Обсыпка стенок сооружения должна производиться слоями по 25-30 см равномерно по периметру. Откосы и горизонтальные поверхности обсыпки планируются с покрытием насыпи слоем растительного грунта.

Арматурные и бетонные работы должны производиться с соблюдением требований СНиП Ш-В.I-70 и других глав СН и Па.

Перед бетонированием днища установленная опалубка и арматура должны быть приняты по акту, в котором подтверждается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты на арматурную сталь и сетки.

Днище бетонируется непрерывно параллельными полосами без образования швов.

Ширина полос принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь уложенного бетона с ранее уложенным до начала схватывания ранее уложенного бетона.

Уложенная в днище бетонная смесь уплотняется вибраторами, поверхность выравнивается вибробрусом для чего при бетонировании применяются переносные маячные рейки.

Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены:

Расчетные схемы

стеновых панелей

ПС-1; ПС-4

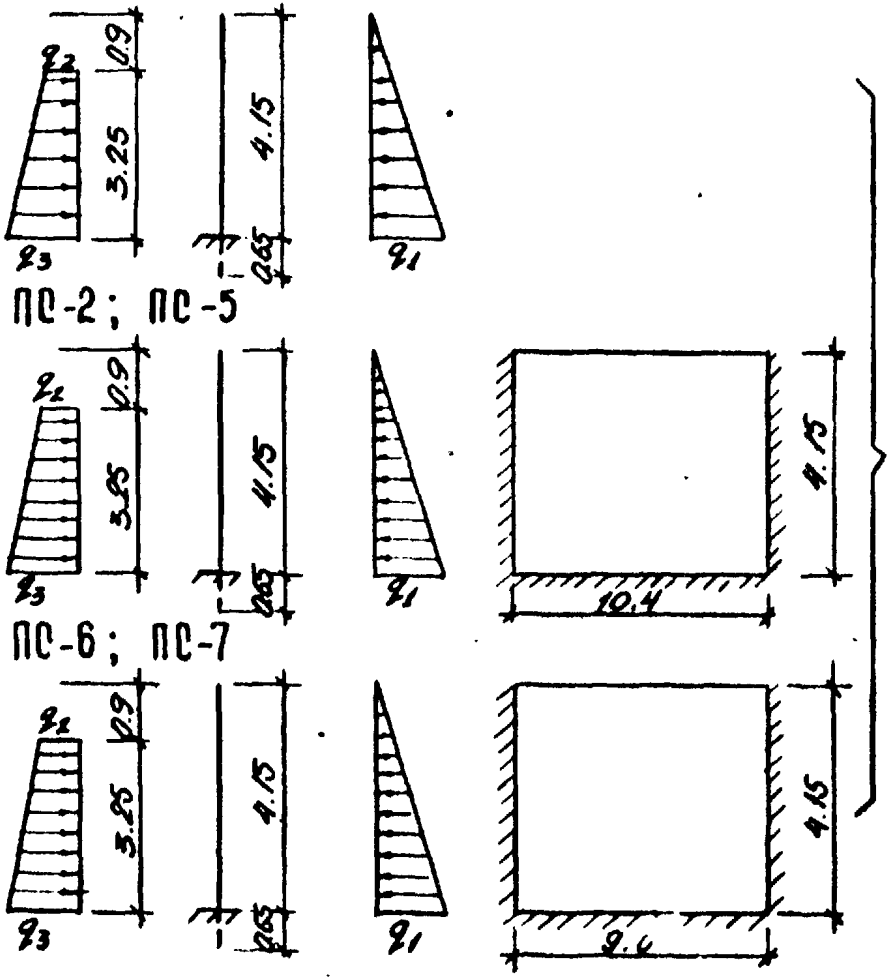

$q = 4.15$ т/пм

$q_2 = 64$ т/пм

$q_3 = 4.37$ т/пм

ПС-3

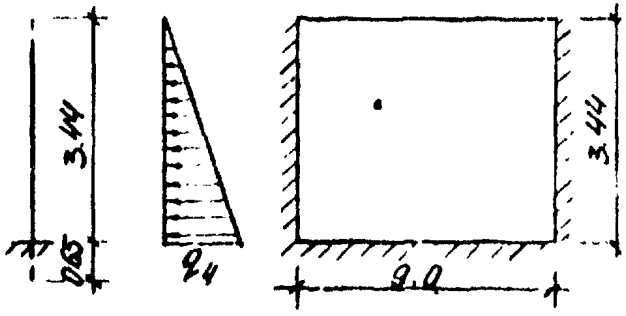

$q_4 = 3.44$ т/пм

перегородочных панелей

ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3



Нагрузки даны на ширину B=3.0 м

N = 23 т

R = 0.5 т

q = 0.177 т/пм

q = 0.177 т/пм

днища

от воды



$P_1 = 2.67$ т $P_4 = 3.66$ т $M_1 = -30.0$ тм

$P_2 = 3.66$ т $P_5 = 2.67$ т $M_2 = 8.1$ тм

$P_3 = 1.02$ т $q_1 = 5.11$ т/пм $M_3 = -8.1$ тм

$M_4 = 30.0$ тм

от земли



$P_1 = 2.67$ т $P_4 = 5.40$ т $M_3 = 1.11$ тм

$P_2 = 5.40$ т $P_5 = 2.67$ т $M_4 = 0.42$ тм

$P_3 = 1.80$ т $M_1 = -7.08$ тм $M_5 = 1.11$ тм

$M_2 = 25.8$ тм $q_1 = 10.9$ т/пм

- прочность и плотность бетона;
- соответствие размеров и отметок днища проектным данным;
- наличие и правильность установки закладных деталей;
- отсутствие в днище выбоин, обнажений арматуры, трещин и т.д.

Отклонение размеров днища от проектных не должно превышать:

- в отметках поверхностей на всю плоскость ± 20 мм.
- в отметках поверхностей на I м плоскости в любом направлении ± 5 мм
- в размерах поперечного сечения днища + 5 мм;
- в отметках поверхностей, служащих опорами для сборных железобетонных элементов и монолитных участков стен ± 4 мм.

Монтаж панелей и замоноличивание стыков

К монтажу сборных железобетонных панелей разрешается приступить при достижении бетоном днища 70% проектной прочности.

Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очищаются и обрабатываются пескоструйным аппаратом, промываются водой под напором и на дно паза наносится слой выравнивающего цементно-песчаного раствора до проектной отметки.

Монтаж панелей производится с геодезическим контролем.

Выпуски арматуры стеновых панелей свариваются между собой с помощью накладок с контролем качества сварного шва. Замоноличивание стыков между стеновыми панелями осуществляется цементно-песчаным раствором механизированным способом с подачей раствора снизу под давлением. До замоноличивания стыков, не реже,чем за двое суток, стыкуемые поверхности стеновых панелей очищаются, обрабатываются пескоструйным аппаратом и непосредственно перед бетонированием промываются струей воды под напором.

Подробно о замоноличивании стыков шпоночного типа см. "Рекомендации по замоноличиванию цементно-песчаным раствором стыков шпоночного типа в сборных железобетонных водосодержащих емкостях" (ЦНИИПромзданий, I967 г.).

Приемка законченных монтажных работ, а также промежуточные приемки производятся в соответствии со СН и П III-I6-73.

Допускаемые отклонения при монтаже устанавливаются в соответствии со СН и П III-I6-73 и СН и П I-А.4-62, таблица 5 и не должны превышать следующих величин:

- несовмещаемость установочных осей ± 2мм;
- отклонение от плоскости по длине ± 20 мм;
- зазор между опорной плоскостью элемента и плоскостью днища + I0 мм;
- отклонение от вертикальной плоскости плоскостей панелей стен в верхнем сечении ± 4 мм.

Бетонирование монолитных участков

После установки панелей, устройства стыковых соединений и заделки панелей в пазах днища производится бетонирование монолитных участков.

Инвентарная опалубка при бетонировании устанавливается с внутренней стороны стены на всю высоту, а с наружной стороны - на высоту яруса бетонирования с наращиванием по мере бетонирования.

Крепление опалубки производится к выпускам арматуры стеновых панелей. Стержни, крепящие опалубку, должны располагаться на разных отметках и не должны пересекать стык насквозь.

Бетонирование стен производится поярусно с тщательным вибрированием. Бетонная смесь должна приготовляться на тех же цементах и из тех же материалов, что и основные конструкции (стеновые панели, лотки).

Уложенный бетон должен твердеть в нормальных температурно-влажностных условиях.

Допустимые отклонения при сооружении монолитных участков стен устанавливаются такие же, как

и при монтаже панелей.

Гидравлическое испытание производится на прочность и водонепроницаемость до засыпки котлована при положительной температуре наружного воздуха, путем заполнения сооружения водой до расчетного горизонта и определения суточной утечки. Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной прочности и не ранее 5 суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытания, если убыль воды за сутки не превышает 3 л на I $м^2$ смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выхода струек воды, а также не установлено увлажнение грунта в основании.

Все работы по испытанию производятся в соответствии с СНиП III-30-74 п. 8.47-8.68.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

Технологическая часть

При привязке типового проекта аэротенков:

I) Определяется потребный объем аэротенков.
2) Выбирается тип аэротенка (по ширине и рабочей глубине), его длина с учетом применения шестиметровых вставок и количества секций.
3) Производится компановка блока аэротенков из секций.
4) При длинах секций, отличных от разработанной в проекте, и применении шестиметровых вставок уточняется местоположение щитовых затворов с подвижным водосливом в подающих лотках.
5) Производится гидравлический расчет аэротенков по расчетному расходу сточной воды (по аналогии с примером, приведенном в приложении), на основе которого определяются высотная посадка аэротенков в увязке с первичными и вторичными отстойниками и размеры канала осветленной воды.
6) Определяется потребный расход воздуха и проводится расчет магистрального и разводящих воздуховодов с определением их размеров (см.приложение № 6.2).

7) Определяется общее количество фильтросных пластин, исходя из удельного расхода воздуха 80-120 л/мин на одну пластину. Уточняется число рядов фильтросных каналов. При длинах секций, отличных от разработанной в проекте, уточняется местоположение воздушных стояков и подвижных опор.

8) Определяется расход циркулирующего активного ила, производится поверочный гидравлический расчет илового канала с определением его размеров.

9) Определяется местоположение и количество узлов присоединения к каналам систем подвода осветленной воды от первичных и отвода иловой смеси на вторичные отстойники в соответствии с количеством групп отстойников.

10) Уточняются трассировка, высотное расположение, конструкция подводящих и отводящих трубопроводов, а также всех обвязочных коммуникаций в увязке с общеплощадочными сетями.

11) Автоматизация работы аэротенков (регулирование расхода воздуха, ила и т.д.) решается в общем комплексе очистных сооружений.

Строительная часть

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям площадки необходимо:

- произвести контрольную проверку прочности ограждающих конструкций на измененные физико-механические свойства грунтов (высоту засыпки, объемный вес γ_0 , угол внутреннего трения φ) по расчетным схемам, приведенным в настоящей записке;

- произвести пересчет днища как балки на упругом основании с применением модуля деформации E, определенного для конкретных физико-механических свойств грунта основания;

- в зависимости от климатического района строительства установить марку бетона по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, а также арматуру и вид цемента, рекомендуемых для бе-

тона конструкций по табл.№I; №2 и №3 серии 3.900-2 выпуск I и таблицы № 3 настоящей записки;

- при строительстве в слабо фильтрующих грунтах для отвода верховодки и фильтруемой из сооружения воды, под днищем запроектировать пластовый дренаж, связываемый по периметру сооружения с дренажной сетью.

При разработке проекта дренажа особое внимание следует обратить на предотвращение возможности выноса частиц грунта подстилающих слоев, а так же на мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу дренажа в период строительства и эксплуатации сооружения.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

5.I. Пример гидравлического расчета

Аэротенки (4 секции) с рассредоточенным впуском сточных вод четырехкоридорные, с шириной коридора 9м.

Исходные данные:

Наименование	Расчетный максимальный секундный расход м3/сек	Расход для расчета лотков и трубопроводов (К =I,4) м3/сек.
Секция аэротенка (ℓ =90м)		
Осветленная вода	0,92	I,3
Циркулирующий активный ил	0,55	0,77
Иловая смесь после аэротенков	I,47	2,07
4 секции аэротенков		
Осветленная вода	3,7	5,2
Циркулирующий активный ил	2,2	3,08
Иловая смесь после аэротенков	5,9	8,28

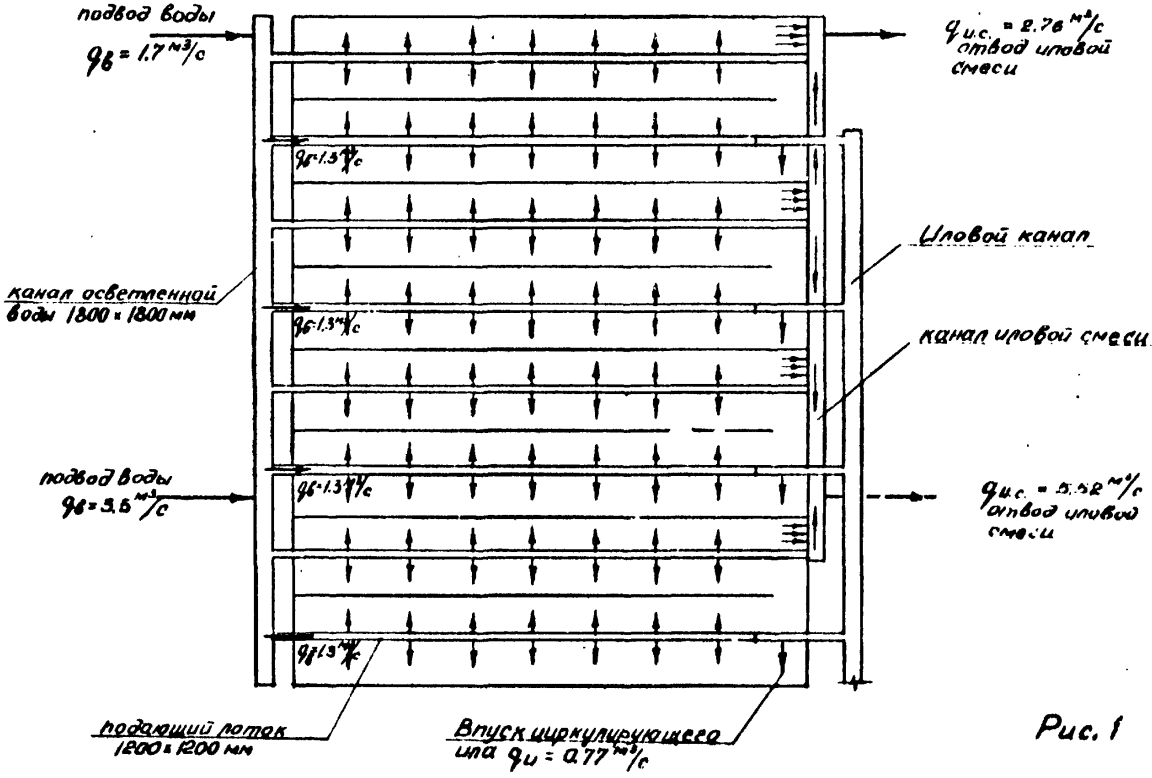
подвод воды
$q_в = 1.7\ м^3/с$
$q_{и.с.} = 2.78\ м^3/с$
отвод иловой смеси
$q_в = 1.3\ м^3/с$
Иловой канал
канал осветленной воды 1800 × 1800 мм
$q_в = 1.3\ м^3/с$
канал иловой смеси
подвод воды
$q_в = 3.6\ м^3/с$
$q_в = 1.3\ м^3/с$
$q_{и.с.} = 5.52\ м^3/с$
отвод иловой смеси
$q_в = 1.3\ м^3/с$
подающий лоток 1200 × 1200 мм
Впуск циркулирующего ила $q_и = 0.77\ м^3/с$

Рис. 1

Гидравлический расчет произведен в направлении, обратном движению воды

Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно конструкции
I. Подводящая система (участок от канала осветленной воды до впуска воды в аэротенк)		
Горизонт воды в аэротенке	4,70	

I.I. Напор на ребре впускного водослива

Впуск воды в каждую секцию аэротенка выполнен из 2-х подающих лотков через трапецеидальные регулируемые водосливы. Всего в секции аэротенка запроектировано 28 впускных водосливов со следующими размерами:



Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно конструкции

Расчет проведен при условии поступления оточной воды в секцию аэротенка по одному подающему лотку через четыре трапецидальных водосливных отверстия.

Расчетный расход на один водослив $q = 0,33$ м³/сек (при равномерном распределении)

Напор (Н) на ребро впускного водослива определяется по формуле $q = m(B + 0.8 b \operatorname{tg}\alpha H) H \sqrt{2gH}$ (I)

$H = 0,37$ м

где: m – коэффициент расхода – 0,42

B – длина порога – 0,8

Отметка порога водослива (с учетом запаса на неподтопление – 0,I) 4,80

Отметки в подводящем лотке 5,I7 4,40

Наполнение в лотке – 0,77 м

I.2. Потери напора в подающем лотке



Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно конструкции

I.2.I. Потери напора по длине лотка

$$h_e = J \cdot e \qquad (2)$$

где:
- e – длина расчетного участка лотка
- $J = \left(\frac{n \cdot v}{R^{2/3}}\right)^2$ – гидравлический уклон
- n – коэффициент шероховатости для к.б. лотков – 0,0I37
- v – скорость потока в лотке
- $R = \frac{\omega}{\mathcal{F}}$ – гидравлический радиус – 0,33

где:
- ω – площадь живого сечения лотка – 0,9I м^2
- b – ширина лотка – I,2 м
- h – наполнение в лотке – 0,76 м
- $\mathcal{F} = b + 2h$ – смоченный периметр – 2,72 м

h_1 = 0,076 м
h_2 = 0,0I2 м
h_3 = 0,005 м
h_4 = 0,00I м
J_1 = 0,00I69
J_2 = 0,00I
J_3 = 0,00044
J_4 = 0,000I07
v_1 = I,43 м/сек
v_2 = I,I м/сек
v_3 = 0,73 м/сек
v_4 = 0,36 м/сек

Суммарные потери по длине подающего лотка

$$\Sigma h_e = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \qquad \Sigma h_e = 0{,}09 \text{ м}$$

Наименование	Отметки горизонт воды	Отметки дно конструкции

I.2.2. Местные потери на разделение потока

$$h_м = \zeta \frac{V^2}{2g} \qquad (8)$$

Коэффициенты сопротивления определены по данным Френкеля (см.Справочник проектировщика "Канализация населенных мест и промышленных предприятий" Москва,1968г.).
Определение потерь произведено по средним скоростям в магистральном направлении.

Отношение расходов	Средняя скорость на участке м/сек.	Коэффициент местного сопротивления
$\frac{q_1}{q_3} = 0,5$	0,5	0,00
$\frac{q_3}{q_2} = 0,66$	0,9I	0,I
$\frac{q_2}{q_1} = 0,77$	I,25	0,2

Суммарные потери напора на разделение потока 0,02м
Потери напора в подающем лотке

$$\Sigma h_e + \Sigma h_м \quad h = 0,II \text{ м}$$

Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно конструкции
Отметки в начале подающего лотка	5,28	4,40

Наполнение в лотке h = 0,88 м

Расчет канала осветленной воды выполняется при привязке проекта.

2. Отводящая система аэротенков

В данном разделе произведен расчет только сборного канала иловой смеси на диктующем участке от т.А до т.Б (от водослива иловой смеси из аэротенка до отводящего трубопровода).

Гидравлический расчет отводящих трубопроводов выполняется при привязке проекта

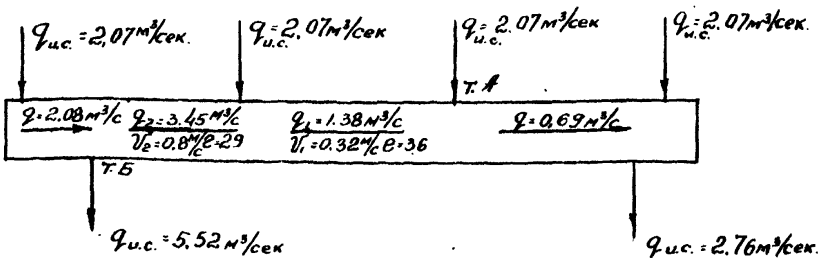

Наименование	Отметки горизонт воды	Отметки дно конструкции

2.I. Напор на водосливе с тонкой стенкой на выходе иловой смеси из аэротенка

Напор на водосливе:

$$H = \left(\frac{q_{u.c.}}{m \cdot b \cdot \sqrt{2g}}\right)^{2/3} \qquad (4)$$

где: $q_{u.c.}$ - расход иловой смеси при расчетном максимальном расходе - I,47м^3/с

при форсированном режиме - 2,07 м^3/с

m - коэффициент расхода - 0,42

b - ширина водослива - 7,5 м

Напор на ребре водослива при расчетном максимальном расходе - 0,22 м.

Напор на ребре водослива при форсированном режиме (К=I,4) - 0,28 м.

Отметка ребра водослива при максимальном расходе - 4,48

Отметка ребра водослива при форсированном режиме - 4,42

Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно, конструкции
2.2. Потери в канале иловой смеси		
Отметки в канале в конце расчетного участка у отводящего трубопровода.	4,I5	0,96
Наполнение в лотке - 3,I9		

2.2.I. Потери напора на слияние потоков в точке перед отводящим трубопроводом

По формуле 3 $h_{сл} = 0,I$ м

где:

ζ - коэффициент местного сопротивления - 3

V - максимальная скорость в канале перед слиянием потоков - 0,8 м/сек.

2.2.2. Потери на трение по длине канала

По формуле 2 $h_1 = 0,00695$ м

$h_2 = 0,0377$ м

Длина расчетного участка $\ell_1 = 36$

$\ell_2 = 29$

Наименование	Отметки: горизонт воды	Отметки: дно конструкции
$J = \left(\frac{n \cdot V}{R^{2/3}}\right)^2$ – гидравлический уклон	$J = 0{,}000193$ $J = 0{,}0013$	
	$V = 0{,}32$	
где: скорость потока	$V = 0{,}8$	
n – коэффициент шероховатости армируемого канала 0,03		
$R = \frac{6 \cdot h}{6 + 2h}$ – гидравлический радиус		
6 – ширина канала		
h – наполнение в канале		
Суммарные потери по длине канала иловой смеси $\Sigma he = h_1 + h_2 = 0{,}04$ м		
Сумма потерь напора в канале иловой смеси $\Sigma h = h\,c.n. + he = 0{,}14$ м		
Отметки в канале в начале расчетного участка	4,29	0,96
Запас на свободный излив струи составит 0,13 м		
Отметка воды в последующем сооружении должна быть ниже на величину потерь напора в отводящей системе, которая определяется при привязке проекта		

5.2. РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ

Общее гидравлическое сопротивление в воздуховоде h, м, складывается из потерь на трение по длине и местных сопротивлений:

$$h = h_{тр} + h_{м} = \frac{\lambda \ell}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \gamma + \frac{\varsigma v^2}{2g} \gamma$$

где: λ - коэффициент сопротивления может быть определен по формуле

$$\lambda = 0{,}0125 + \frac{0{,}011}{D}$$

ℓ и D - длина и диаметр воздуховода, м

v - скорость движения воздуха в воздуховоде, принимается 10 - 25 м/сек,

g - ускорение свободного падения, м/с^2

γ - удельный вес воздуха после сжатия в воздуходувках, кгс/м^3

ς - суммарный коэффициент местных сопротивлений

Удельный вес воздуха определяется по формуле:

$$\gamma = \frac{P \cdot T_0 \cdot \gamma_0}{P_0 \cdot T}$$

где: γ и γ_0 - соответственно, удельный вес воздуха после сжатия в воздуходувках и в нормальных условиях кгс/м^3

P и P_0 - соответственно, давление в воздуховоде по расчету и в нормальных условиях, кгс/см2.

T и T_0 – соответственно, температура воздуха в конце сжатия и в нормальных условиях, ^{0}К.

За нормальные условия всасывания принято давление P_0 = 760 мм.рт.ст, что соответствует I,033 кгс/см^2, температура 293^{0}К (273^0 + 20^0) и удельный вес воздуха γ_0 = I,2I кгс/нм^3.

Температура воздуха в конце сжатия:

$$T = T_0\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{K-1}{K}}$$

К – I,4 – показатель адиабаты для воздуха.

Скорость воздуха в воздуховоде определяется по фактическому количеству проходящего воздуха с учетом сжатия.

Фактическое количество проходящего воздуха определяется из общего уравнения состояния газа:

$$\frac{P \cdot V}{T} = \frac{P_0 V_0}{T_0}$$

где: V и V_0 – соответственно Q факт и Q норм

При установке воздуходувок ТВ-I75-I,6; ТВ-300-I,6 температура в конце сжатия, удельный вес воздуха и фактический расход будут равны:

T = 335^{0}К 62^{0}С; γ = I,6 кгс/м^3; Q факт = 0,78 . Q норм

При установке воздуходувок, имеющих другое конечное давление, температура воздуха в конце сжатия и удельный вес должны быть пересчитаны.

5.3. Работа аэротенков в режиме нелинейно-рассредоточенного впуска

При работе аэротенка с нелинейно рассредоточенным впуском сточной воды обеспечивается постоянная удельная нагрузка на активный ил при одновременном повышении средней дозы ила в аэротенке на 20-30%, что позволяет соответственно увеличить производительность аэротенка.

Рекомендуемый режим подачи сточной воды в аэротенках при различном числе рабочих выпусков приведен в таблице.

Порядковый начальный БПК полн в мг/л	Сосредоточенный расход сточных вод в данном впуске, в % от среднего расхода																				К-во рабочих выпусков
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	
I40-200	I4	I2	I0	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I2
	I2	I0	8	7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	I6
	I2	I0	8	7	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	I8
	II	9	7	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20
200-280	I0	9	8	8	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	I6
	I0	9	8	8	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	I8
	9	8	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20

gost.e-ecolog.ru
