МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Главное техническое управление по строительству

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА СООРУЖЕНИЕ ВЛ И ПС 35 ÷ 1500 КВ

Монтаж унифицированных стальных опор ВЛ 500 кВ

СБОРНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
К-3-47

Установка анкорно-угловых трехстоечных свободностоящих опор УСК 500-I, УСК 500-I+5, УСК 500-I+I3

Заместитель директора института — Г.Н.Элонбоген

Начальник отдела ЭМ-20 — Е.Н.Коган

Главный инженер проекта — И.Л.Войнилович

Москва 1989 г.

gost.e-ecolog.ru

СПДС-24

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

I. Общая часть 3

2. Технологическая карта К-3-47-I. Установка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I падающей стрелой 9

3. Технологическая карта К-3-47-2. Установка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I+5 падающей стрелой 19

4. Технологическая карта К-3-47-3. Установка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I+I3 падающей стрелой 26

5. Технологическая карта К-3-47-4. Установка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I краном и трактором 33

6. Технологическая карта К-3-47-5. Установка анкерно-угловой трехстоечной свободностоящей опоры УСК 500-I+5 краном и трактором 41

				ВЛ-Т (К-3-47)			
ГИП	Войнилович	[signature]	15.06.87	Установка анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор УСК 500-1 УСК 500-1+5, УСК 500-1+13	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Зубрицкая	[signature]	12.07.87		Р	2	47
Нач.отд.	Козон	[signature]	10.07.87		Всесоюзный институт „Сэнэргострой" Отдел ЭМ-20 г Москва		
Ст.инж.	Смирнова	[signature]	15.05.87				

33945

М. Обс. 14/IV-81 Р1-366 т 2000

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящий сборник включены технологические карты на установку анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих опор.

2. Карты разработаны на установку анкерно-угловых опор УСК 500-I, УСК 500-I+5, УСК 500-I+I3.

Конструкции опор приняты по типовому проекту 3.407.2-I55 Отделения дальних передач института "Энергосетьпроект". Эскизы опор рис.0-I÷0-3 .

3. Технологические карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации (ПОС и ППР).

Карты выполнены в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве" Москва, I987г, Госстрой СССР.

4. Карты составлены для нормальных условий работы (равнинная местность, необводненные грунты, летний период, продолжительность рабочей смены 8,2 ч).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом ВЛ и условиями строительства.

При строительстве ВЛ в усложненных условиях на затраты труда и механизмов следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в "Вводной части" ЕНиР сборник Е23 выпуск 3 .

5. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звеньями при поточном строительстве. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков строительства на основании графика производства работ, составляемого для конкретной ВЛ с учетом технико-экономических показателей, приведенных в картах настоящего сборника.

6. Операционный контроль качества осуществляется согласно схеме, приведенной на рис. 0-4 .

Приемочный контроль установленной опоры имеет целью проверку готовности к эксплуатации и осуществляется ИТР мехколонны.

Результаты приемочного контроля фиксируются в журнале приемо-сдаточной документации установленной формы.

Полное закрепление установленной опоры производится только после выверки и приведения опоры в проектное положение в соттветствии с допусками (рис. 0-4).

7. До установки опоры должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые настоящими картами:

- закончена сборка опоры в исходном для подъема положении согласно технологическим картам сборника К-2-42 ;
- намечены пути движения тяговых и тормозных механизмов и очищены от деревьев, пней, кустарника и других предметов;
- скомплектован такелаж и монтажные приспособления и проверено их соответствие ГОСТам и проекту;
- в соответствии с гидрогеологическими условиями пикета устроены якоря.

8. При производстве работ должны строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:

- СНиП Ш-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве";
- "Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР" Москва, I984 г;
- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" Госгортехнадзор СССР, I976 г;
- "Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации механизмов, смонтированных на базе тракторов", Москва I987;
- "Типовая инструкция по охране труда для рабочих-электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи" Москва I987 г.

33945

М., ОДС 14/II-81 Р1-366 т 2000

Особое внимание следует обратить на соблюдение следующих требований:

- запрещается подъем опоры на фундамент, не засыпанный полностью грунтом и не раскрепленный от сдвига;
- опорные части монтажной стрелы должны быть установлены в приямки глубиной 0,3 м ;
- в начале установки опоры следует проверить правильность крепления такелажа, приподняв опору на 0,3 м. При обнаружении дефектов опору опустить для их устранения;
- влезать на опору для снятия такелажа до полного ее закрепления в проектном положении запрещается;
- не разрешается производить подъем опоры при ветре 6 баллов и выше.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия и т.п.) должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
33945

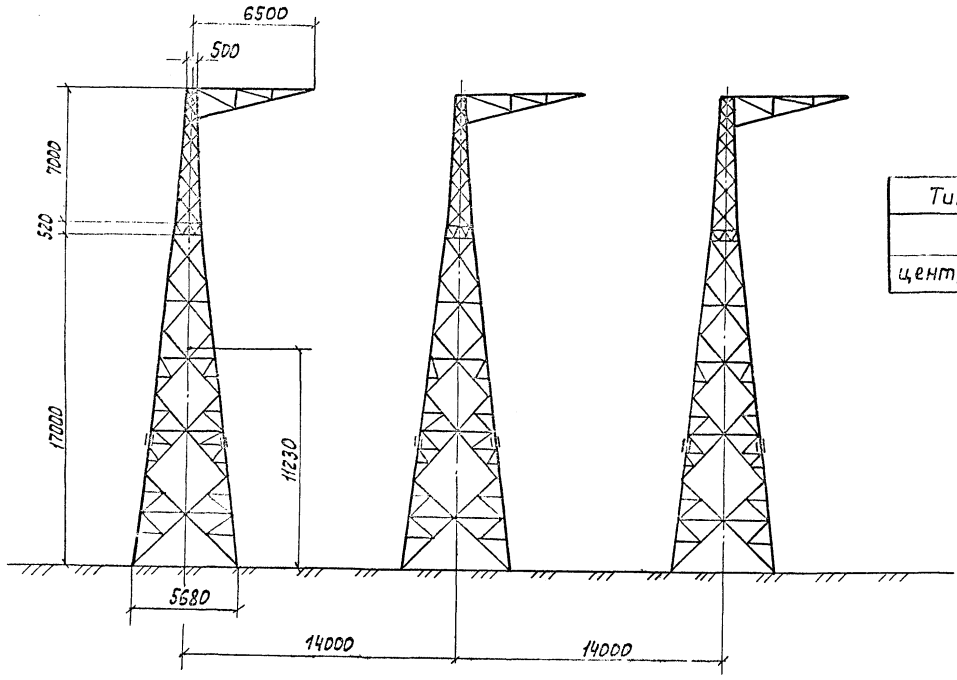

Тип опоры	УСК 500-1
масса, т	16,6
центр тяжести, м	11,23

Рис. 0-1 Анкерно-угловая опора УСК 500-1

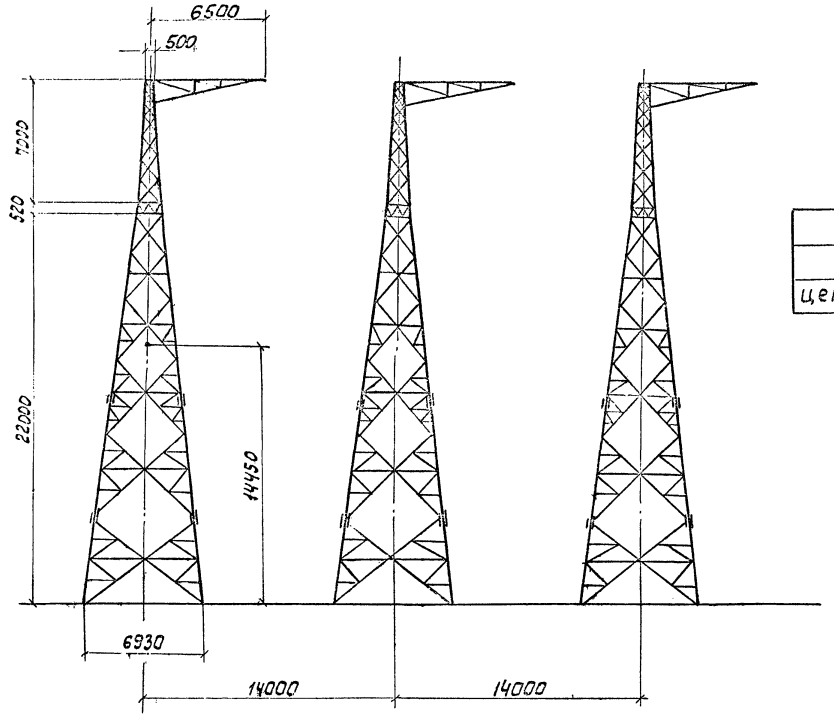

Тип опоры	УСК-500-1+5
масса, т	21.7
центр тяжести, м	14.45

Рис. 0-2. Анкерно-угловая опора УСК-500-1+5

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
5394.5		

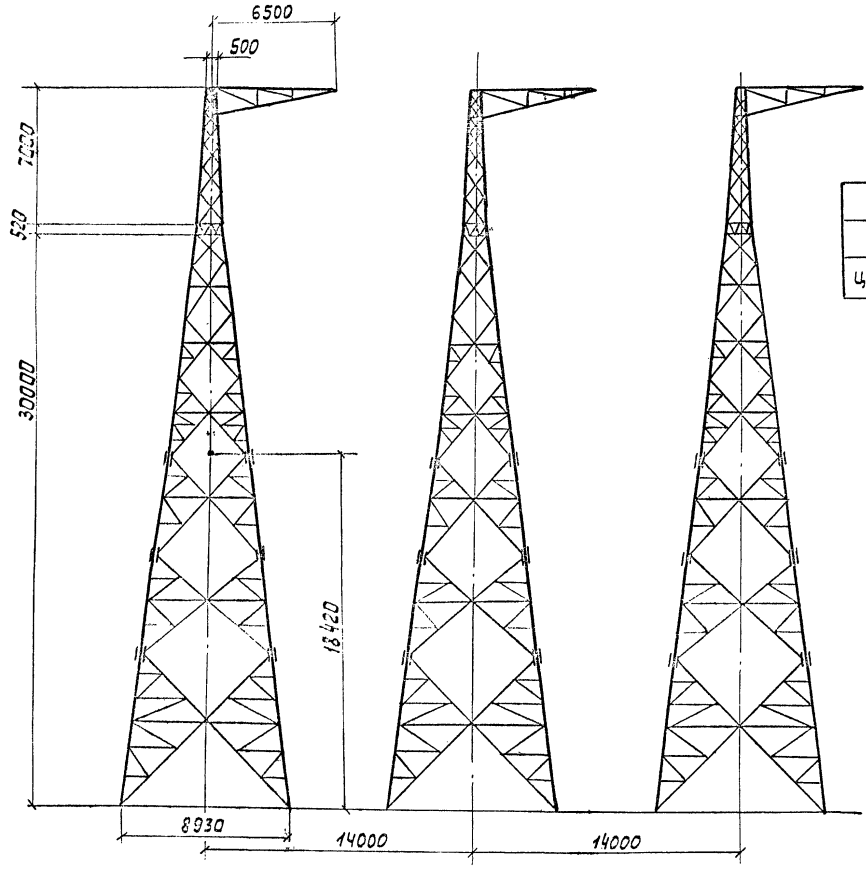

Тип опоры	УСК 500-1+13
масса, т	31.0
центр тяжести, м	18,42

Рис. 0-3 Анкерно-угловая опора УСК 500-1+13

ВЛ-Т(К-3-47)

Лист 7

Формат А3

Инв. № подл. | 33945 | Подп. и дата | Взам. инв. №

Δ	Контролируемые показатели	Критерии оценки качества		
		УСК 500-1	УСК 500-1÷5	УСК 500-1÷13
1	Отклонение вершины стойки от вертикальной оси вдоль и поперек оси ВЛ	125 мм	150 мм	190 мм
2	Смещение конца траверсы от линий, перпендикулярной к оси трассы	100 мм	100 мм	100 мм
3	Выход опоры из створа линии при длине пролета до 200 м	100 мм	100 мм	100 мм
	от 200 до 300м	200 мм	200 мм	200 мм
	свыше 300 м	300 мм	300 мм	300 мм
4	Отклонение оси траверсы от горизонтали.			

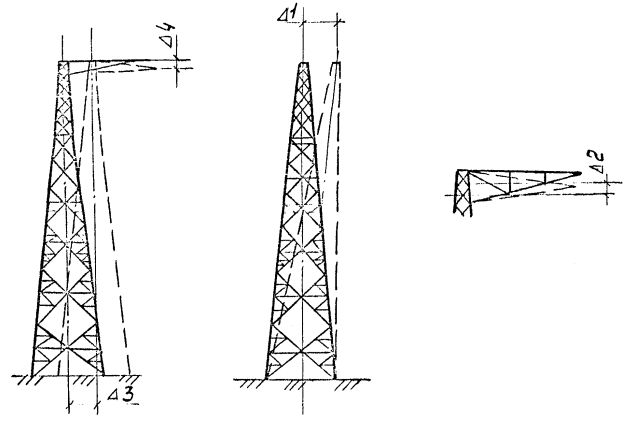

Основные процессы и операции, подлежащие контролю	Установка опоры			
Состав контроля (что проверяется)	Вертикальность стойки Δ1	Горизонтальность траверсы Δ4	Разворот конца траверсы Δ2	Створность Δ3
Техническое оснащение (чем проверяется)	Отвес, теодолит	Теодолит	Теодолит	Теодолит
Вид контроля (время, режим, периодичность)	После установки стойки			
Кто контролирует	Мастер			

Рис 0-4. Схема операционного контроля качества

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К-3-47-2

УСТАНОВКА АНКЕРНО-УГЛОВОЙ ТРЕХСТОЕЧНОЙ СВОБОДНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЫ УСК 500-I+5 ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛОЙ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.I. Технологическая карта разработана на установку анкерно-угловой трехстоечной опоры УСК 500-I+5 методом поворота падающей стрелой, а также применима для установки опоры УС 500-I+5 и других опор, аналогичных по массе и габаритам.

I.2. В состав работ, рассматриваемых картой: входят:

- установка монтажной стрелы и сборка такелажной схемы;
- подъем стоек опоры в проектное положение;
- временное закрепление стоек и снятие шарниров;
- выверка и окончательное закрепление опоры;
- опускание стрелы и демонтаж такелажа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.I. До начала подъема опоры должны быть закончены работы, перечисленные в п.7 "Общей части" настоящего сборника.

2.2. Последовательность производства работ по установке стойки опоры.

2.2.I. Раскрепить фундаменты от сдвига (рис.I-3)

2.2.2. Установить на фундамент монтажные шарниры.

2.2.3. Завести пяты стоек в монтажные шарниры и закрепить.

2.2.4. Выложить А-образную стрелу и закрепить на ее вершине такелажные канаты (рис.I-3).

2.2.5. Установить стрелу в исходное положение путем подъема ее краном на I0 м с последующим дотягиванием трактором (рис.I-I).

2.2.6. Присоединить к опоре такелажные канаты согласно рис.I-4.

2.2.7. Выполнить подъем стойки опоры, выбирая лебедкой тяговый трос (рис.2-I).

2.2.8. Временно закрепить две свободные ноги стойки постановкой гаек на анкерные болты.

2.2.9. Снять шарниры, наклонив стойку тяговым механизмом.

2.2.I0. При временном закреплении стойки опоры гайки не должны вплотную доходить до поверхности башмаков.

2.2.II. Произвести выверку установленной стойки опоры согласно допускам, приведенным на рис.0-4.

Отклонения от проектного положения устраняются установкой стальных подкладок между пятой опоры и фундаментом.

2.2.I2. Произвести окончательное закрепление стойки затяжкой гаек и контргаек на анкерных болтах фундаментов.

2.2.I3. Демонтировать такелаж, опустить стрелу на землю, используя один из механизмов.

2.3. Две другие стойки опоры устанавливаются аналогично.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Операционный контроль качества осуществляется согласно п.6 "Общей части" настоящего сборника.

33945

ТАС-24

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы на установку опоры УСК 500-I+5 методом поворота при помощи падающей стрелы приведена в таблице № 2-I.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ по установке опоры УСК 500-I+5 методом поворота при помощи падающей стрелы приведен в таблице № 2-2.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в механизмах, оборудовании, приспособлениях и такелаже на одно звено

Наименование	Техническая характеристика, марка, ГОСТ, № чертежа	Кол., шт.	Назначение
Трактор	Т-I30М с лебедкой	2	Подъем опоры
Кран тракторный	ТК-53М	I	Подъем стрелы
Стрела монтажная А-образная	КС-I 975.00.00.000 Н=22м	I	Подъем опоры
Шарнир		2	
Блок однороликовый	Q=5 тс	I	Для опускания стрелы
Трос Т-I	⌀ I7,0-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	2	Вожжи
Трос Т-2	⌀I5,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	Тормозной
Трос Т-3	⌀I5,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	От опоры к тормозному тросу
Трос Т-4	⌀2I,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	Тяговый
Трос Т-5	⌀I5,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	От стрелы к тяговому тросу
Трос Т-6	⌀I5,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	Для опускания стрелы
Трос Т-7	⌀I5,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	Крепление блока для опускания стрелы
Трос Т-8	⌀I9,5-Г-I-Н-I60 ГОСТ 3079-80	I	Для подъема стрели
Коуш	45 ГОСТ 2224-72	2	
Коуш	63 ГОСТ 2224-72	2	
Зажим	I6 ОСТ 24.090.5I-88	24	
Зажим	I9 ОСТ 24.090.5I-88	I6	
Зажим	22 ОСТ 24.090.5I-88	I2	
Скоба	СК-25-IA ТУ 34-13-11420-89	6	
Лес круглый	⌀200мм ГОСТ 9463-72	0,8 м3	
Ролик-коуш	6 ОМ-199832	2	

В перечень не включаются инструмент, средства измерения и контроля, средства индивидуальной защиты, предусмотренные технологическим нормокомплектом.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 33945

Типовой проект М. 06с 10/11-81 РГ-366 т.2000 Формат А3

7, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по установке опоры следует производить в строгом соответствии с указаниями по технике безопасности, изложенными в п.8 "Общей части" настоящего сборника.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нормативные затраты труда электролинейщиков, чел.-ч	I30,0
Нормативные затраты труда машинистов, чел.-ч	48,8
Заработная плата электролинейщиков, р.-к	I0I-I8
Заработная плата машинистов, р.-к	5I-76
Продолжительность выполнения работ, смена	I,9
Выработка на одно звено в смену, опор-смена	0,5

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

НА УСТАНОВКУ ОПОРЫ УСК 500-I+5 КРАНОМ И ТРАКТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ

ТАБЛИЦА N 2-I

Наименование процесса	Номер расчет для сверхсчета [illegible]	Единица измерения	Объем работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Норма времени		Расценка		Затраты труда		Заработная плата		Время пребывания машин на объекте	Заработная плата машинистов с учетом пребывания машин на объекте, р.-к
					Электролинейщиков, чел.-ч	Машинистов, чел.-ч (маш.-ч)	Электролинейщиков, р.-к	Машинистов, р.-к	Электролинейщиков, чел.-ч	Машинистов, чел.-ч (маш.-ч)	Электролинейщиков, р.-к	Машинистов, р.-к	маш.-ч	
Установка анкерно-угловой опоры		I опора	Ix3	ЕНиР §23-3-II Табл.2,с.I5,I6.	I04,0	39,0	8I-00	4I-34	I04,0	39,0	8I-00	4I-34		
		I т	2I,7	(ПР-2)	I,2	0,45	0-93	0-48	26,0	9,8	20-I8	I0-42		
									I30,0	48,8	I0I-I8	5I-76		

ВЛ-Т(К-3-47)

33945

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ОПОРЫ
УСК 500-I÷5 КРАНОМ И ТРАКТОРОМ ПРИ ПОМОЩИ ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ

Таблица N 2-2

Наименование процесса	Единица измерения	Объем работ	Затраты труда: электролинейщиков, чел.-ч	Затраты труда: машинистов, чел.-ч (маш.-ч)	Принятый состав звена	Продолжительность процесса ч/см	Часы: 2 4 6 8 I0 I2 I4 I6
Установка анкерно-угловой опоры	опора	I	I30,0	48,8	Эл.линейщики 6 р.-I, 5 р.-I, 4 р.-2, 3 р.-2, 2 р.-2; Машинист крана 6 р.-I; Тракторист 6 р.-2	I6,2 / I,9	I6,2 (II чел.)

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата
33945

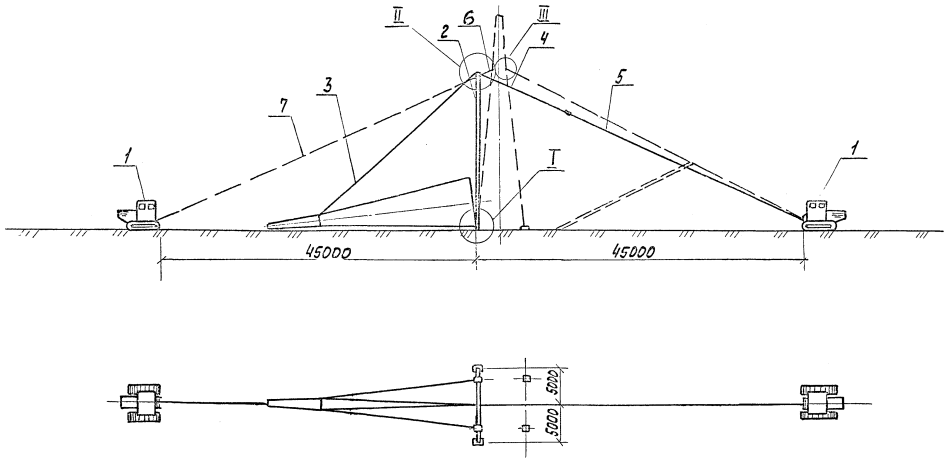

Рис. 2-1 Схема подъема опоры УСК 500-1+5 с помощью А-образной стрелы H=22м

1- Трактор Т-130 м; 2- Стрела КС-1; 3- Строп Т-1; 4-Строп Т-5; 5- Трос Т-4; 6-Строп Т-3
7- Трос Т-2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№
33945

Назначение	Эскиз марки	Марка	Канат, ГОСТ 3079-80			Зажим ОСТ 24.090.51-88			Коуш ГОСТ 2224-72	
			ф, мм.	L, м	Длина заготовки, м	E, мм	Обознач.	Кол., шт.	Обознач.	Кол., шт.
От стрелы к тяговому тросу		Т-5	15,5	8,0	9,5	100	16	6		
Тормозной		Т-2	15,5	55,0	56,0	100	16	6	45	1
Тяговый		Т-4	21,5	60,0	61,0	130	22	8	63	1
Для опускания стрелы		Т-6	15,5	100,0	101,0	100	16	6	45	1
Для подъема стрелы		Т-8	19,5	100,0	101,0	120	22	8	63	1
От опоры к тормозному тросу		Т-3	15,5	12,0	17,0	100	16	6		
Крепление блока для опускания стрелы		Т-7	15,5	8,0	9,0	100	16	6		
Вожжи		Т-1	17,0	31,0	34,0	110	19	8		

Рис. 2-2 Ведомость стропов

gost.e-ecolog.ru
